



"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

Trujillo, 31 de mayo del 2025

CARTA N°042-2025-CNRD/CD

SEÑORES: Gobierno Regional La Libertad

ATENCIÓN: Ing. MANUEL VERTIZ MALABRIGO
subgerente de obras – pech

Asunto: **INFORME MENSUAL DE LA SUPERVISION DE OBRA.**
Correspondiente del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2025.

Referencia: A S N° 0002-2025-GRLL-GOB/PECH – I CONVOCATORIA, PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DE ARTE: EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA
DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD -
CUI: 2593295 ITEM 1 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

a) INFORME N° 017-2025-JAJC-SO

De mi especial consideración:

El que suscribe, Cesar Nestor Rivera Diaz, Consultor de la Supervisión de Obra, presenta del INFORME N° 17-2025-JAJC-SO de : INFORME MENSUAL N° 02 – MAYO 2025, (correspondiente del 01/05/2025 AL 31/05/2025), presentado por el Ing. Juan Antonio Jiménez Carrasco con CIP N° 54850, Jefe de Supervisión de Obra de referencia, Para su trámite correspondiente, de acuerdo al Art. N° 194.- Valorizaciones y metrados Reglamento de la ley de contrataciones del estado

Atentamente.


CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

https://drive.google.com/drive/folders/1L_pNOsenPamtnBNr_ztdJpg-

[tolj\[QaE?usp=drive_link](#)

**CONSORCIO
EJECUTOR DE
OBRAS NO
PRESENTO
VALORIZACIÓN A
LA SUPERVISIÓN
DEL MES DE MAYO
2025**

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 34650



000304



CONSORCIO DIAMANTE



CHECK LIST DE CONTENIDO DE VALORIZACIÓN DEL CONTRATISTA CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jara
JEFE DE SUP.
CUI 54850

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. R.
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 01 COMPONENTE OBRAS CIVILES"



000303

CONTENIDO DE LA VALORIZACIÓN DEL CONTRATISTA – MES DE MAYO 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	FALTA	COMPLETO	N° FOLIO
1.00	DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA:			
1.01	Carta del representante legal presentando la valorización a la supervisión	X		
1.02	Factura emitida por el contratista	X		
1.03	Cta CCI y Cta. Detracciones	X		
1.04	Carta del residente presentando la valorización al representante legal de la contratista	X		
2.00	VALORIZACIÓN DE LA OBRA			
2.01	INFORME TÉCNICO DEL RESIDENTE DE OBRA QUE CONTENGA	X		
	Ficha Técnica de la obra	X		
	Ubicación	X		
	Objetivos del Informe y de la obra	X		
	Descripción de Metas y Características Físicas de la obra	X		
	Descripción de las Actividades Ejecutadas	X		
	a. Detallar una de las actividades ejecutadas, sustentadas con fotos debidamente fechadas y georreferenciadas.	X		
	b. Detallar los controles de Calidad Efectuados y Anexar los certificados de laboratorio	X		
	αEstado de Situación de la obra Contratada	X		
	a. Situación de Ejecución Física de Actividades (Actividades ejecutadas y los porcentajes de avance)	X		
	b. Situación de Ejecución Administrativa (Reclamos, Vigencia de Cartas Fianza, Vigencias de Seguros, Penalidades, etc.)	X		
	c. Ejecución Financiera	X		
	αSolicitud de Pago de la obra (% Avance Mensual)	X		
	αRelación de equipo mínimo Utilizado en el mes	X		
	αRelación del Personal del mes	X		

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Garcesco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54480

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 01 COMPONENTE OBRAS CIVILES"



CONSORCIO DIAMANTE



000302

	αConclusiones	X		
2.02	RESUMEN DE VALORIZACIÓN	X		
2.03	METRADOS EJECUTADOS (RESUMEN DE METRADO Y PLANILLA DE METRADOS)	X		
2.04	PLANOS DE SUSTENTO DE METRADOS	X		
2.05	CUADRO DE CONTROL DE PAGO DE VALORIZACIONES	X		
2.06	VALORIZACIÓN MENSUAL SEGÚN COMPONENTES Y PARTIDAS	X		
2.07	CUADRO COMPARATIVO Y GRÁFICO DE AVANCE DE SERVICIO PROGRAMADO VS EJECUTADO (CURVA S)	X		
2.08	CONTROL DE AMORTIZACIONES	X		
2.09	CÁLCULO DE REAJUSTES (DE SER EL CASO, O CARTA DE REAJUSTES AL FINAL DE OBRA)	X		
2.10	COPIA DE LAS FÓRMULAS POLINÓMICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	X		
2.11	COPIA DE LOS ÍNDICES UNIFICADOS DEL MES BASE Y DE LOS MESES PAGADOS DE VALORIZACIONES	X		
2.12	COEFICIENTE DE REAJUSTE DE FÓRMULA POLINÓMICA (DE SER EL CASO)	X		
2.13	CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE SERVICIO VIGENTE	X		
2.14	FOTOGRAFÍAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES Y COMENTARIO, FECHADAS Y GEORREFERENCIADAS	X		
2.15	COPIA DEL CUADERNO DE OBRA	X		
2.16	COPIA DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	X		
2.17	COPIA DE CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO Y COPIA DE FACTURA DE ADELANTO DIRECTO	X		
2.18	COPIA DE CARTA FIANZA DE ADELANTO DE MATERIALES Y COPIA DE FACTURA DE ADELANTO DE MATERIALES	X		
2.19	COPIA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y ADENDAS CORRESPONDIENTES	X		
2.20	COPIA DE BASES ADMINISTRATIVAS	X		
3.00	INFORMES DEL PERSONAL CLAVE			

CONSORCIO DIAMANTE

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓNIng. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 01 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

000301



3.01	Informe técnico detallado de las actividades ya ejecutadas durante el periodo valorizado por todo el equipo técnico, sustentadas con panel fotográfico fechado y georreferenciado.	X		
4.00	RESOLUCIONES Y ADENDAS			
4.01	Resolución de Aprobación de Expediente Técnico	X		
4.02	Resoluciones de Ampliaciones de Plazo (cuando se corresponda)	X		
4.03	Resoluciones de Presupuestos Reductivos y de Adicionales del Servicio (cuando se corresponda)	X		
5.00	ACTAS REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN			
5.01	Acta de Entrega de Terreno	X		
5.02	Acta de Inicio de obra	X		
5.03	Acta de Acuerdo de Suspensión de Plazo Contractual	X		
5.04	Acta de Acuerdo de Paralización de Obra	X		
5.05	Acta de Reinicio de obra	X		
5.06	Acta de Término o Recepción de la obra	X		
5.07	Actas de Acuerdo con población, juntas de usuarios, comités, etc.	X		
6.00	DOCUMENTOS DE CONDICIONES DE INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL			
6.01	Carta Dirigida al Contratista al entrega de Expediente Técnico	X		
6.02	Carta Dirigida al Contratista Designando al Supervisor	X		
6.03	Carta Dirigida al Contratista para entrega de Terreno	X		
6.04	Comprobante de Pago de Adelanto Directo u Otro Documento que acredite el pago (cuando corresponde)	X		
7.00	CERTIFICADOS DE ENSAYOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y FICHAS TÉCNICAS			
7.01	Certificados de Pruebas y Ensayos	X		
7.02	Certificados de Calidad	X		
7.03	Fichas Técnicas	X		
8.00	COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA			
8.01	CONAFOVICER	X		

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
 REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Hernández
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CP 34250

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 01 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

000300



8.02	ESSALUD	X		
8.03	SENCO	X		
8.04	PLANILLAS ELECTRÓNICAS	X		
8.05	SCTR DEL MES DE EJECUCIÓN OBLIGATORIO	X		
8.06	SOAT	X		
8.07	PÓLIZAS	X		

CONSORCIO DIAMANTE
 Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP 34680

CONSORCIO DIAMANTE
 Ing. Cesar N. P. [Signature]
 REPRESENTANTE CLIENTE

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ÍTEM 01 COMPONENTE OBRAS CIVILES"



000299



CONSORCIO DIAMANTE



PROYECTO
CHAVI
MOCHIC

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan D. Jiménez Cárpio
JEFE DE SUPERVISION
EXP. 54350

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 01 COMPONENTE OBRAS CIVILES"



"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Trujillo, 31 de mayo de 2025

INFORME N° 017-2025-JAIC-SO

AL : REPRESENTANTE COMÚN - CONSORCIO DIAMANTE
ING. CESAR NÉSTOR RIVERA DÍAZ.

DEL : ING. JUAN ANTONIO JIMÉNEZ CARRASCO.
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA.

ASUNTO : PRESENTACIÓN DE VALORIZACIÓN N°02 - MAYO PARA DE PAGO DE CONTRATISTA
- CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS (Correspondiente desde el 01 de mayo hasta el
31 de mayo del 2025)

REF. : Licitación pública N° 01-2024-GRLL-GOB/PECH -I Convocatoria, CONTRATACIÓN
DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE: EN EL (LA)
SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA
VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 1 COMPONENTE OBRAS
CIVILES"

CONTRATO DE CONTRATISTA DE OBRA SGO 06-2025-PECH de fecha 21/03/2025
CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA SGO 07-2025-PECH de fecha 02/04/2025

FECHA : Trujillo, 31 de Mayo de 2025.

Es grato dirigirme a Ud.; para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo informar que no habiendo recibido ninguna carta por parte del contratista sobre conciliación de metrados, alcanzo la valorización N° 02 mes de MAYO 2025 para su trámite correspondiente:

Se ha calculado la presente valorización del mes de mayo 2025 en base a los metrados ejecutados en el presente mes, constatados por la supervisión.

La Supervisión de obra remite a UD. La autorización de Pago de valorización N.º 02 - Mayo 2025 de la obra mencionada del Contratista CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS, para que se haga el trámite del pago correspondiente.

Por lo tanto, se informa lo siguiente:

En el mes de mayo 2025; el contratista presenta el siguiente avance de obra:
(Avance ejecutado del mes = 0.01 %), (Avance Ejecutado Acumulado = 0.69 %)
(Avance Programado del mes = 3.73 %), (Avance Programado acumulado = 6.49 %)

La valorización bruta asciende a S/ 530.77 (Quinientos treinta con 77/100 soles) sin IGV con un porcentaje de 0.01 % del presupuesto contractual.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION

SUPERVISIÓN DE OBRA "CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE: EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II
ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 1 COMPONENTE
OBRAS CIVILES"

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMÚN



00029

En mis facultades de Supervisor de la obra presento valorización N° 02 – MAYO 2025 (01/05/2025 AL 31/05/2025), según artículo 194.5 del Reglamento de La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del estado con el siguiente detalle:

Durante la ejecución de obra se verificó que el contratista presenta un atraso de avance en el mes de Abril respecto al programado tal como se indica en la Curva "S"

Avance del mes Programado - "Mayo"	Avance del mes Ejecutado - "Mayo"
5.81 %	0.01%

Siendo necesario la solicitud el calendario acelerado de Obra ($80\% \times 6.49\% = 5.19\%$), ya que se encuentra por debajo del 80% del programado acumulado en un 5.18%

Avance del ACUMULADO Programado - "Mayo"	Avance del ACUMULADO Ejecutado - "Mayo"
6.49 %	0.69%

VALORIZACIÓN DEL MES	: S/ 530.77
ADELANTO DIRECTO	: S/ 00.00 (-)
SUBTOTAL	: S/ 530.77
IGV: 18%	: S/ 95.54
TOTAL	: S/ 626.31

TOTAL, MONTO A FACTURAR	: S/ 626.31
--------------------------------	--------------------

SON: Seiscientos veinte seis con 31/100 soles.

El monto neto a facturar por el contratista CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS por la presente valorización de obra N.º 02, corresponde al importe de S/ 0.00 (Cero con 00/100 soles) con IGV, con una retención de S/125,040.48 con IGV.

Sin otro particular, me suscribo de usted no sin antes manifestarle mi mayor consideración.

Atentamente,

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 034850

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Carlos N. Rivera Díaz
PRESIDENTE COMITÉ



Contenido

I.	FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCION DE OBRA	4
II.	INFORME TECNICO.....	5
2.1.	DATOS GENERALES.....	5
2.2.	UBICACIÓN DEL PROYECTO	6
2.3.	OBJETIVOS DEL INFORME Y DEL PROYECTO	6
2.4.	ANTECEDENTES:	7
2.5.	METAS FISICAS DEL PROYECTO	9
2.6.	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES POR PARTIDA.....	18
2.7.	CUADRO DE RESUMEN DE AVANCES LOS FISICOS Y FINANCIEROS	19
	AVANCES FISICOS	19
2.8.	PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS.....	19
2.9.	CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA.....	20
2.1.	CONTROL DE RETENCIONES.....	21
2.10.	EVALUACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA	21
2.11.	MANEJO DE IMPACTOS AMBIENTALES	22
2.12.	INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO POR PARTIDA.....	22
2.13.	PANEL FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES.....	23
2.14.	CONCLUSIONES	33
2.15.	RECOMENDACIONES	34

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 054850

CONSORCIO DIAMANTE



I. FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCION DE OBRA

FICHA TECNICA DE LA OBRA				
1	OBRA	:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - ÍTEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"	
2	Ubicación : Departamento	:	LA LIBERTAD	
	Distrito	:	CHAO	
	Provincia	:	VIRU	
	Area Geografica según I.N.E.I.	:	1	
3	CONTRATISTA	:	CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS	
4	ENTIDAD	:	PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	
5	SUPERVISOR	:	ING. JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO	
6	RESIDENTE	:	ING. FREDY AUCAHUAQUE QUISPE	
4	Fuente de Financiamiento	:	Recursos Directamente Recaudados	
5	licitacion publica	:	LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024-GRLL-GOB/PECH - I CONVOCATORIA	
6	Sistema de Contratacion	:	PRECIOS UNITARIOS	
7	Presupuesto base, con IGV al 18% y Fecha	:	S/. 8,336,032.27	31-Ago-24
8	Presupuesto base, sin IGV y Fecha	:	S/. 7,064,434.13	31-Ago-24
9	Contrato de obra	:		
10	Fecha de Contrato de obra	:	21-Mar-25	
11	Fecha de Presupuesto	:	31-Ago-24	
12	Monto del contrato Inc/IGV	:	S/. 7,502,429.05	
13	Monto del contrato, Sin/IGV	:	S/. 6,357,990.72	
14	Monto del Presupuesto base	:	S/. 8,336,032.27	
15	Factor de Relación	:	0.90	
16	Adicionales de obra, Inc/IGV	:	S/.	
17	Deductivos de obra, Inc/IGV	:	S/.	
18	Intereses por mora, Inc/IGV	:	S/.	
19	Mayores Gast. Gral. prorr plazo, Inc/IGV	:	S/.	
24	Fecha de Entrega del terreno	:	09-Abr-25	
25	Adelanto en efectivo Inc/IGV y fecha pago	:	S/.	0.00%
26	Adelanto en efectivo Sin/IGV y fecha pago	:	S/.	
27	Adelanto P/Materiales Inc/IGV y fecha pago	:	S/.	
28	Adelanto P/Materiales Sin/IGV y fecha pago	:		
29	Inicio oficial del plazo	:	10-Abr-25	
30	Plazo de Ejecucion de Obra	:	150	
31	Término original programado de obra	:	06-Sep-25	
32	Término vigente programado de obra	:	06-Sep-25	
33	Acta recepción de obra	:		

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 054850

CONSORCIO DIAMANTE

SUPERVISIÓN DE OBRA "CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ÍTEM 1 COMPONENTE OBRAS CIVILES"



II. INFORME TECNICO

2.1. DATOS GENERALES

OBRA	:	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE: EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 1 COMPONENTE OBRAS CIVILES",
UBICACIÓN	:	Virú y Chao
a) DATOS GENERALES CONTRATISTA Y ENTIDAD		
Licitación Pública	:	LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2024-GRLL-GOB/PECH - I CONVOCATORIA
Modalidad	:	A PRECIOS UNITARIOS
Entidad Contratante	:	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD PROYECTO ESPECIAL DE CHAVIMOCHIC DE LA LIBERTAD
Contratista	:	CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS
Representante Legal	:	SR. DICK ROD LLARO HUERTA DNI:40133490
Residente de Obra	:	ING.AUCAHUAQUE QUISPE FREDY CIP N°71854
Coordinador de Obra	:	ING.KEVIN WILSON VALDERRAMA BRIONES CIP N° 165582
Expediente técnico	:	(Aprob.Act. Expediente Técnico con Res. SUB GERENCIAL N° 000003-2024-GRLL-PECH-SGO de Gobierno Regional La Libertad - 16.09.24)
Monto del contrato de Obra, con IGV	:	S/7'502,429.05
Contrato de Obra N°	:	CONTRATO -SGO 06-2025-PECH
Monto del contrato, sin IGV	:	S/. 6'357,990.72
Fecha de Firma de Contrato de obra	:	21 Mar-2025
Plazo de ejecución según Bases Lic.	:	150 d.c
Fecha de Firma de Contrato de obra	:	21-Mar,-25
Garantía de Fiel Cumplimiento	:	Retención 10% del monto contractual (S/. 750,242.90)
Entrega de terreno	:	09-Abr-25
Inicio oficial de plazo	:	10-Abr-25
Término vigente contractual	:	06-Sep-25

b) DATOS GENERALES CONSULTORIA DE OBRA

Adjudicación Simplificada	:	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0002-2025-GRLL- GOB/PECH - I CONVOCATORIA
Modalidad	:	TARIFAS DIARIA
Monto Contrato de Consultoría, C/IGV	:	S/408,415.00
Contrato de Consultoría N°	:	CONTRATO -SGO 07-2025-PECH
Monto Contrato de Consultoría, S/IGV	:	S/346,114.41
Garantía de Fiel Cumplimiento	:	Retención 10% del monto contractual (S/. 40,841.50)
Fecha de Firma de Contrato de obra	:	02-Abr,-25
Plazo de ejecución según Bases Lic.	:	150 D.C.
Inicio oficial de plazo	:	10-Abr,-25
Termino vigente contractual	:	06-Sep-25
Consultor de Obra	:	CONSORCIO DIAMANTE
Jefe de Supervisor de Obra	:	ING.JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO - CIP 54850

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54850

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar D. Rivera Diaz
PRESIDENTE COMITÉ



2.2.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Departamento : La Libertad

Provincia : VIRÚ

Distrito : VIRÚ Y CHAO

• Ubicación Geográfica

El proyecto se ubica geográficamente entre las coordenadas UTM con datum WGS84 delimitada, según las siguientes:

CUADRO N° 01: UBICACIÓN GEOGRAFICA

DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE QUEBRADA	COORDENADAS	
		ESTE	NORTE
ESTRUCTURA DE INGRESO	La Rinconada	731580.9130	9089065.7620
CANOA 01	Los Colorados	734041.4720	9087426.2830
CANOA 02	Río Seco – Toma Laredo	736668.1970	9084291.6570
CANOA 03	Yugoslavia	737316.7040	9074701.2880
CANOA 04		737391.7980	9079231.8490
CANOA 05	Las Lomas	738299.7530	9087139.5800
CANOA 06		738903.1490	9077300.7290
CANOA 07		738954.2700	9077038.5670

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54850

2.3.

OBJETIVOS DEL INFORME Y DEL PROYECTO

2.3.1. OBJETIVOS DEL INFORME

El objetivo del presente informe es informar a la Entidad sobre la ejecución de los trabajos realizados en el mes de la valorización, verificar el cumplimiento de lo estipulado en el expediente técnico y avance financiero.

2.3.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.3.2.1. Objetivo General

El Objetivo principal del proyecto es la construcción de Obras de Arte: en el (la) Sistema de Riego Chavimochic I y II Etapa.

2.3.2.2. Objetivos Específicos

- Asegurar que la escorrentía, flujo de lodos y sedimentos generados por la activación de las quebradas La Rinconada, Los Colorados, Toma Laredo – Río Seco, Yugoslavia y Las Lomas pasen por encima del Canal Madre sin ingresar a este y pueda ocasionar su colapso.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54850

CONSORCIO DIAMANTE



- Mediante **oficio múltiple N.º 000003-2025-GRLL-PECH-SGO** de 30 de abril de 2025, la Subgerencia de obras realizó la aprobación del Programa de Ejecución de obra (CPM), calendario de avance de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales e insumos, calendario de utilización de equipo de la obra.
- Con fecha **06/05/2025** el contratista CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS presenta a la supervisión el **INFORME TÉCNICO - CONSULTA N° 01**.
- Con fecha **07/05/2025** la supervisión solicita con Carta N° 024 -2025-CNRD/CD, el Calendario Acelerado de Obra por motivo que el contratista cae en un retraso injustificado en menos del 80% del acumulado programado.
- Con fecha 09/05/2025 el contratista ha asentado en el Asiento 54 del cuaderno de obra, una **PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR MOTIVOS DE SEGURIDAD - EXTORSIÓN AL CONTRATISTA**. Esta paralización es unilateral solo por el Contratista.
- Con fecha 09/05/2025 el jefe de supervisión suscribió en el cuaderno de obra en el Asiento 57 sobre la **SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN Y EVIDENCIA DE NO LABORES EJECUTADAS EN ZONA DE OBRA**, por parte del Contratista y se pronuncia que la extorsión **no** es motivo de paralización.
- Mediante **oficio N°0001112-2025-GRLL-PECH-SGO**, la Entidad remite OBSERVACIONES A LA VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 E INFORME MENSUAL del Contratista, correspondiente al mes de Abril del 2025 de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI:2593295 ITEM 01 COMPONENTE DE OBRAS CIVILES, dirigida a la supervisión CONSORCIO DIAMANTE, con fecha 12 de mayo dando un plazo de 3 días calendario para levantar dichas observaciones.
- Mediante **oficio N°0001113-2025-GRLL-PECH-SGO**, la Entidad remite al Consultor OBSERVACIONES A SU VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 E INFORME MENSUAL del Consultor, correspondiente al mes de Abril del 2025 de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI:2593295 ITEM 01 COMPONENTE DE OBRAS CIVILES, con fecha 12 de mayo dando un plazo de 3 días calendario para levantar dichas observaciones.
- Con fecha 19/05/2025 el contratista presenta los cronogramas acelerados de obra con carta N°047 -2025-2025-CEO/RC
- Con informe N°014-2025-JAJC-SO, el supervisor de obra, informa y cuantifica las penalidades al contratista acumuladas al 22 de Mayo del 2025

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 054850



- Asegurar el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Trujillo a través de la construcción de obras de arte en el canal madre que mitiguen el riesgo de daños a causa de la presencia de flujo de detritos.
- Mitigar el riesgo de afectación a la infraestructura del canal madre y poder seguir brindando un servicio continuo tanto para el sector agrícola, saneamiento y energético.

2.4. ANTECEDENTES:

- Con fecha 21 de Marzo del 2025, el Gobierno Regional de La libertad y **Consorcio Ejecutor de obras**, suscribieron el **Contrato SGO 06 -2025-PECH** para la contratación de la ejecución de la Obra "Construcción de Obras de Arte: en El (La) Sistema De Riego Chavimochic I y II Etapa Distrito De Chao, Provincia Virú, Departamento La Libertad - CUI: 2593295 ITEM 1 Componente Obras Civiles", por un monto de **S/7,502,429.05 (Siete Millones Quinientos Dos Mil cuatrocientos veintinueve 05/100 soles)**, con un plazo de ejecución de Ciento Cincuenta (150) días calendarios, bajo el sistema A Precios Unitarios.
- Suscrito el contrato para la ejecución de la obra mencionada en el párrafo precedente; el Gobierno Regional de La Libertad, en cumplimiento al Artículo 176º del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, se realizó la Entrega del terreno para ejecución de la obra con fecha 09/04/2025.
- Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución contractual de la obra es de 150 días calendario.
- De fecha 05/03/2025, el comité de selección adjudico la buena pro de la AS N° 02-2025-PECH. Para la contratación del servicio de consultoría de obra "CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE: EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 1 COMPONENTE OBRAS CIVILES".
- De fecha 02/04/2025, suscribieron contrato SGO 07-2025-PECH para la contratación del servicio de consultoría de obra "CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE: EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 1 COMPONENTE OBRAS CIVILES" con la Entidad Contratante GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD, con un monto ascendente a **s/ 408,415.00 (Cuatrocientos Ocho mil Cuatrocientos Quince 00/100 soles)**
- De fecha 10/04/2025, el **Ing. Juan Antonio Jiménez Carrasco**, inicia su función como JEFE DE SUPERVISIÓN DEL OBRA.
- De fecha 30/04/2025, con **Carta N° 032-2025-CEO/RC** el contratista **CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS** hace entrega de la valorización N° 01 del mes de Abril a la supervisión, para su aprobación de pago.
- Con fecha 24/04/2025 se presentó a la entidad mediante CARTA N° 09- 2025-CNRD/CD REPRESENTANTE COMÚN CONSULTOR sobre La Aprobación de CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, DIAGRAMA GANTT Y PERT CPM.
- De fecha 30/04/2025, con **Carta N° 032-2025-CEO/RC** el contratista **CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS** hace entrega de la valorización N° 01 del mes de Abril a la supervisión, para su aprobación de pago.



2.5. METAS FISICAS DEL PROYECTO

Las metas físicas del proyecto son los que a continuación se detalla:

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
01	COMPONENTE OBRAS CIVILES		
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES		
01.01.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS	glb	1.00
01.01.01.02	CAMPAMENTO PROVISIONAL	m2	700.00
01.01.01.03	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	u/mes	45.00
01.01.01.04	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m	und	1.00
01.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	glb	1.00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACION AMBIENTAL, PLAN DE MONITOREO		
01.02.01	SEGURIDAD Y SALUD		
01.02.01.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	glb	1.00
01.02.01.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00
01.02.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00
01.02.01.04	CAPACITACION DE SEGURIDAD	glb	1.00
01.02.01.05	RECURSOS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION	glb	1.00
01.02.02	MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION O CORRECCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES		
01.02.02.01	MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DEL SUELO	glb	1.00
01.02.02.02	MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DEL AGUA	glb	1.00
01.02.02.03	MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DEL AIRE Y EL RUIDO	glb	1.00
01.02.02.04	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	1.00
01.02.02.05	PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL	glb	1.00
01.02.02.06	PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL	glb	1.00
01.02.02.07	PLAN DE CIERRE DE OBRA	glb	1.00
01.02.03	MONITOREO ARQUEOLOGICO		
01.02.03.01	MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00
01.03	ESTRUCTURA DE INGRESO DE CONCRETO ARMADO LA RINCONADA KM 28+908		
01.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.03.01.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO SIMPLE EN CANAL MADRE CON DISCO e=0.10 m	m	17.16
01.03.01.02	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	158.86
01.03.01.03	EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	928.14



01.03.01.04	EXCAVACION PARA CIMENTACION DE UÑA DE ENROCADO	m3	239.57
01.03.01.05	CORTE, PERFILADO Y REFINE DE TALUD	m2	947.12
01.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE PARA CONFORMACION DE DIQUE	m3	4,225.48
01.03.01.07	RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ESTRUCTURAS COMPACTADO	m3	283.08
01.03.01.08	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO	m3	20.62
01.03.01.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 2.0 km	m3	0.41
01.03.01.10	EXTRACCION, SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA PARA ENROCADOS	m3	554.14
01.03.01.11	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCADOS D=0.5km (PROMEDIO)	m3	554.14
01.03.01.12	TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCADOS POR CADA km ADICIONAL	m3k	7,480.83
01.03.01.13	ACOMODO DE ENROCADO	m3	554.14
01.03.02	CONCRETO SIMPLE		
01.03.02.01	CONCRETO SIMPLE $f_c=100$ kg/cm ² , E=0.10m (SOLADOS)	m3	8.94
01.03.02.02	MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON $f_c=210$ kg/cm ²	m3	53.77
01.03.03	CONCRETO ARMADO		
01.03.03.01	CONCRETO $f_c=210$ kg/cm ² , CON CEMENTO TIPO MS(MH)	m3	60.06
01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (RECTO)	m2	166.24
01.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (CURVO)	m2	34.71
01.03.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (RECTO)	m2	26.19
01.03.03.05	ACERO $f_y=4200$ kg/cm ² GRADO 60	kg	4,331.34
01.03.04	JUNTAS Y SELLOS		
01.03.04.01	JUNTA WATERSTOP, E=6"	m	20.70
01.03.04.02	JUNTA ELASTOMERICAS	m	20.70
01.04	CANOA DE CONCRETO ARMADO LOS COLORADOS KM 25+314		
01.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.04.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	2,750.72
01.04.01.02	EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	1,910.57
01.04.01.03	EXCAVACION PARA CIMENTACION DE UÑA DE ENROCADO	m3	185.41
01.04.01.04	CORTE, PERFILADO Y REFINE DE TALUD	m2	324.21
01.04.01.05	COMPACTACION DE SUBRASANTE EN TRAMOS DE CORTE	m3	179.24
01.04.01.06	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE PARA CONFORMACION DE DIQUE	m3	1,191.17
01.04.01.07	RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ESTRUCTURAS COMPACTADO	m3	420.43
01.04.01.08	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO	m3	111.87
01.04.01.09	PLATAFORMA PARA FABRICACION DE VIGAS	m2	380.00
01.04.01.10	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 2.0 km	m3	3,882.11
01.04.01.11	EXTRACCION, SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA PARA ENROCADOS	m3	376.46
01.04.01.12	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCADOS D=0.5km (PROMEDIO)	m3	376.46
01.04.01.13	TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCADOS POR CADA km ADICIONAL	m3k	2,974.06



ING. JUAN A. JIMÉNEZ CARRASCO
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA
CIP Nº 054850

Colle Adolfo King N° 148 – PROVINCIA DE PACASMAYO – LA LIBERTAD
Cel. N° 990 076 913
e-Mail: juanjim2005@hotmail.com

000288

01.04.01.14	ACOMODO DE ENROCADO	m3	376.46
01.04.01.15	AFIRMADO e=0.20m	m3	12.97
01.04.02	CONCRETO SIMPLE		
01.04.02.01	CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm ² , E=0.10m (SOLADOS)	m3	28.09
01.04.02.02	SUB CIMENTO CORRIDO DE CONCRETO C:H, 1:12 + 30% P.G.	m3	58.56
01.04.02.03	MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON F'C=210 kg/cm ²	m3	414.92
01.04.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SUBCIMIENTO DE ESTRIBOS	m2	64.96
01.04.02.05	DESMOLDANTE PARA SOLADO DE VIGAS PREFABRICADAS	m2	40.80
01.04.03	CONCRETO ARMADO		
01.04.03.01	CONCRETO PRE MEZCLADO f'c = 280 kg/cm ² , CON CEMENTO TIPO MS(MH)	m3	156.57
01.04.03.02	CONCRETO f'c=210 kg/cm ² , CON CEMENTO TIPO MS(MH)	m3	206.66
01.04.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (RECTO)	m2	294.37
01.04.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (CURVO)	m2	15.12
01.04.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (RECTO)	m2	254.54
01.04.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA (FONDO)	m2	258.72
01.04.03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA PRE FABRICADO (CARAVISTA)	m2	555.44
01.04.03.08	ACERO fy=4200 kg/cm ² GRADO 60	kg	58,625.97
01.04.04	JUNTAS Y SELLOS		
01.04.04.01	JUNTA WATERSTOP, E=6"	m	288.80
01.04.04.02	JUNTA ELASTOMERICAS	m	288.80
01.04.04.03	JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA	m	3.60
01.04.05	VARIOS		
01.04.05.01	TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS PRE FABRICADAS CON GRUA HIDRAULICA 250 Ton	und	8.00
01.05	CANOA DE CONCRETO ARMADO TOMA LAREDO KM 21+110		
01.05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.05.01.01	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO	m3	8.40
01.05.01.02	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA	m3	13.73
01.05.01.03	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	1,423.41
01.05.01.04	EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	724.29
01.05.01.05	EXCAVACION PARA CIMENTACION DE UÑA DE ENROCADO	m3	153.84
01.05.01.06	CORTE, PERFILADO Y REFINE DE TALUD	m2	95.15
01.05.01.07	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE PARA CONFORMACION DE DIQUE	m3	363.40
01.05.01.08	RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ESTRUCTURAS COMPACTADO	m3	421.33
01.05.01.09	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO	m3	21.24
01.05.01.10	PLATAFORMA PARA FABRICACION DE VIGAS	m2	332.50
01.05.01.11	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 2.0 km	m3	1,846.73

SUPERVISIÓN DE OBRA "CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 1 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN



ING. JUAN A. JIMENEZ CARRASCO
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA
CIP Nº 054850

Calle Adolfo King N° 148 - PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
Cel. N° 990 076 615
e-Mail: juanjim2005@hotmail.com

990287

01.05.01.12	EXTRACCION, SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA PARA ENROCADOS	m3	152.30
01.05.01.13	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCADOS D=0.5km (PROMEDIO)	m3	152.30
01.05.01.14	TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCADOS POR CADA km ADICIONAL	m3k	380.74
01.05.01.15	ACOMODO DE ENROCADO	m3	152.30
01.05.01.16	AFIRMADO e=0.20m	m3	54.24
01.05.02	CONCRETO SIMPLE		
01.05.02.01	CONCRETO SIMPLE $f_c=100$ kg/cm ² , E=0.10m (SOLADOS)	m3	30.04
01.05.02.02	SUB CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO C:H, 1:12 + 30% P.G.	m3	49.92
01.05.02.03	MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON $f_c=210$ kg/cm ²	m3	112.19
01.05.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SUBCIMIENTO DE ESTRIBOS	m2	56.32
01.05.02.05	DESMOLDANTE PARA SOLADO DE VIGAS PREFABRICADAS	m2	34.44
01.05.03	CONCRETO ARMADO		
01.05.03.01	CONCRETO PRE MEZCLADO $f_c = 280$ kg/cm ² , CON CEMENTO TIPO MS(MH)	m3	122.51
01.05.03.02	CONCRETO $f_c=210$ kg/cm ² , CON CEMENTO TIPO MS(MH)	m3	223.25
01.05.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (RECTO)	m2	391.90
01.05.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (CURVO)	m2	18.85
01.05.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (RECTO)	m2	155.40
01.05.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA (FONDO)	m2	209.10
01.05.03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA PREFABRICADO (CARAVISTA)	m2	439.07
01.05.03.08	ACERO $f_y=4200$ kg/cm ² GRADO 60	kg	60,117.90
01.05.04	JUNTAS Y SELLOS		
01.05.04.01	JUNTA WATERSTOP, E=6"	m	276.02
01.05.04.02	JUNTA ELASTOMERICAS	m	255.22
01.05.04.03	JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA	m	3.60
01.05.05	VARIOS		
01.05.05.01	TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS PREFABRICADAS CON GRUA HIDRAULICA 250 Ton	und	7.00
01.06	CANOA DE CONCRETO ARMADO YUGOSLAVIA KM 14+699		
01.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.06.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	394.13
01.06.01.02	EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	535.84
01.06.01.03	EXCAVACION PARA CIMENTACION DE UÑA DE ENROCADO	m3	323.99
01.06.01.04	CORTE, PERFILADO Y REFINE DE TALUD	m2	680.48
01.06.01.05	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE PARA CONFORMACION DE DIQUE	m3	2,500.06
01.06.01.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ESTRUCTURAS COMPACTADO	m3	192.85
01.06.01.07	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO	m3	16.51
01.06.01.08	PLATAFORMA PARA FABRICACION DE VIGAS	m2	190.00

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP Nº 054850

SUPERVISION DE OBRA "CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAYIMOCHIC I Y II
ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 1 COMPONENTE
OBRAS CIVILES"

Ing. Cesar M. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



ING. JUAN A. JIMÉNEZ CARRASCO
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA
CIP Nº 054850

Calle Adolfo King N° 148 - PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LINDERA

000286

Cel. N° 990 076 615

e-Mail: juanjim2005@hotmail.com

01.06.01.09	EXTRACCION, SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA PARA ENROCADOS	m3	575.60
01.06.01.10	TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCADOS D=0.5km (PROMEDIO)	m3	575.60
01.06.01.11	ACOMODO DE ENROCADO	m3	575.60
01.06.01.12	AFIRMADO e=0.20m	m3	31.61
01.06.02	CONCRETO SIMPLE		
01.06.02.01	CONCRETO SIMPLE $f_c=100$ kg/cm ² , E=0.10m (SOLADOS)	m3	15.13
01.06.02.02	SUB CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO C:H, 1:12 + 30% P.G.	m3	26.88
01.06.02.03	MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON $f_c=210$ kg/cm ²	m3	64.28
01.06.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SUBCIMIENTO DE ESTRIBOS	m2	33.28
01.06.02.05	DESMOLDANTE PARA SOLADO DE VIGAS PREFABRICADAS	m2	20.40
01.06.03	CONCRETO ARMADO		
01.06.03.01	CONCRETO PRE MEZCLADO $f_c = 280$ kg/cm ² , CON CEMENTO TIPO MS(MH)	m3	67.32
01.06.03.02	CONCRETO $f_c=210$ kg/cm ² , CON CEMENTO TIPO MS(MH)	m3	138.33
01.06.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (RECTO)	m2	227.99
01.06.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (CURVO)	m2	10.08
01.06.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (RECTO)	m2	157.87
01.06.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA (FONDO)	m2	102.00
01.06.03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA PRE FABRICADO (CARAVISTA)	m2	252.44
01.06.03.08	ACERO $f_y=4200$ kg/cm ² GRADO 60	kg	33,949.55
01.06.04	JUNTAS Y SELLOS		
01.06.04.01	JUNTA WATERSTOP, E=6"	m	160.10
01.06.04.02	JUNTA ELASTOMERICAS	m	138.10
01.06.04.03	JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA	m	3.60
01.06.05	VARIOS		
01.06.05.01	TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS PREFABRICADAS CON GRUA HIDRAULICA 250 Ton	und	4.00
01.07	CANOA DE CONCRETO ARMADO YUGOSLAVIA KM 14+510		
01.07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.07.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	1,000.28
01.07.01.02	EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	1,127.31
01.07.01.03	EXCAVACION PARA CIMENTACION DE UÑA DE ENROCADO	m3	337.32
01.07.01.04	CORTE, PERFILADO Y REFINE DE TALUD	m2	488.71
01.07.01.05	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE PARA CONFORMACION DE DIQUE	m3	1,984.59
01.07.01.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ESTRUCTURAS COMPACTADO	m3	469.70
01.07.01.07	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO	m3	58.13
01.07.01.08	PLATAFORMA PARA FABRICACION DE VIGAS	m2	200.00
01.07.01.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 2.0 km	m3	12.74

SUPERVISIÓN DE OBRA "CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE: EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 1 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar J. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



01.07.01.10	EXTRACCION, SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA PARA ENROCADOS	m3	541.56
01.07.01.11	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCADOS D=0.5km (PROMEDIO)	m3	541.56
01.07.01.12	ACOMODO DE ENROCADO	m3	541.56
01.07.01.13	AFIRMADO e=0.20m	m3	58.84
01.07.01.14	MEJORAMIENTO DE SUB. RASANTE	m3	88.30
01.07.02	CONCRETO SIMPLE		
01.07.02.01	CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm ² , E=0.10m (SOLADOS)	m3	11.57
01.07.02.02	SUB CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO C:H, 1:12 + 30% P.G.	m3	42.77
01.07.02.03	MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON FC=210 kg/cm ²	m3	187.25
01.07.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SUBCIMIENTO DE ESTRIBOS	m2	44.64
01.07.02.05	DESMOLDANTE PARA SOLADO DE VIGAS PREFABRICADAS	m2	43.20
01.07.03	CONCRETO ARMADO		
01.07.03.01	CONCRETO PRE MEZCLADO f'c = 280 kg/cm ² , CON CEMENTO TIPO MS(MH)	m3	114.87
01.07.03.02	CONCRETO f'c=210 kg/cm ² , CON CEMENTO TIPO MS(MH)	m3	109.08
01.07.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (RECTO)	m2	323.36
01.07.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (RECTO)	m2	179.62
01.07.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA (FONDO)	m2	89.30
01.07.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA PREFABRICADO (CARAVISTA)	m2	215.76
01.07.03.07	ACERO fy=4200 kg/cm ² GRADO 60	kg	26,846.53
01.07.04	JUNTAS Y SELLOS		
01.07.04.01	JUNTA WATERSTOP, E=6"	m	15.90
01.07.04.02	JUNTA ELASTOMERICAS	m	15.90
01.07.04.03	JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA	m	19.00
01.07.04.04	APOYO DE NEOPRENO EN CANOAS	m2	2.40
01.07.05	VARIOS		
01.07.05.01	TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS PREFABRICADAS CON GRUA HIDRAULICA 250 Ton	und	4.00
01.08	CANOA DE CONCRETO ARMADO LAS LOMAS KM 12+512		
01.08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.08.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	996.28
01.08.01.02	EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	9.43
01.08.01.03	EXCAVACION PARA CIMENTACION DE UÑA DE ENROCADO	m3	72.06
01.08.01.04	CORTE, PERFILADO Y REFINE DE TALUD	m2	144.03
01.08.01.05	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE PARA CONFORMACION DE DIQUE	m3	210.95
01.08.01.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ESTRUCTURAS COMPACTADO	m3	547.52
01.08.01.07	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO	m3	11.68
01.08.01.08	PLATAFORMA PARA FABRICACION DE VIGAS	m2	189.00



ING. JUAN A. JIMÉNEZ CARRASCO
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA
CIP Nº 054850

Calle Adolfo King N° 148 - PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
Cel. N° 990 076 615
e-Mail: juanjim2005@hotmail.com

000284

01.08.01.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 2.0 km	m3	383.15
01.08.01.10	EXTRACCION, SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA PARA ENROCADOS	m3	149.76
01.08.01.11	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCADOS D=0.5km (PROMEDIO)	m3	149.76
01.08.01.12	ACOMODO DE ENROCADO	m3	149.76
01.08.01.13	AFIRMADO e=0.20m	m3	36.06
01.08.02	GAVIONES		
01.08.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVION CAJA 5.0x1.0x1.0m, ABERTURA 10x12cm, ALAMBRE 3.40mm (AINC+ALUMINIO+PVC)	und	28.00
01.08.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVION CAJA 5.0x1.5x1.0m, ABERTURA 10x12cm, ALAMBRE 3.40mm (AINC+ALUMINIO+PVC)	und	28.00
01.08.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLCHON RENO 5.0x2.0x0.3m, ABERTURA 10x12cm, ALAMBRE 3.40mm (AINC+ALUMINIO+PVC)	und	35.00
01.08.03	CONCRETO SIMPLE		
01.08.03.01	CONCRETO SIMPLE $f_c=175$ kg/cm ² , E=0.10m	m3	14.00
01.08.03.02	CONCRETO SIMPLE $f_c=100$ kg/cm ² , E=0.10m (SOLADOS)	m3	14.23
01.08.03.03	SUB CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO C:H, 1:12 + 30% P.G.	m3	19.52
01.08.03.04	MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON $f_c=210$ kg/cm ²	m3	64.83
01.08.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SUBCIMIENTO DE ESTRIBOS	m2	25.92
01.08.03.06	DÉMOLDANTE PARA SOLADO DE VIGAS PREFABRICADAS	m2	19.08
01.08.04	CONCRETO ARMADO		
01.08.04.01	CONCRETO PRE MEZCLADO $f_c = 280$ kg/cm ² , CON CEMENTO TIPO MS(MH)	m3	63.60
01.08.04.02	CONCRETO $f_c=210$ kg/cm ² , CON CEMENTO TIPO MS(MH)	m3	138.52
01.08.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (RECTO)	m2	361.93
01.08.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (CURVO)	m2	5.67
01.08.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (RECTO)	m2	87.74
01.08.04.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA (FONDO)	m2	84.80
01.08.04.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA PREFABRICADO (CARAVISTA)	m2	262.45
01.08.04.08	ACERO $f_y=4200$ kg/cm ² GRADO 60	kg	32,604.36
01.08.05	JUNTAS Y SELLOS		
01.08.05.01	JUNTA WATERSTOP, E=6"	m	139.19
01.08.05.02	JUNTA ELASTOMERICAS	m	117.50
01.08.05.03	JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA	m	1.80
01.08.05.04	JUNTA EN LOSA DE VEREDA	m	27.00
01.08.06	VARIOS		
01.08.06.01	TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS PREFABRICADAS CON GRUA HIDRAULICA 250 Ton	und	3.00
01.09	CANOA DE CONCRETO ARMADO LAS LOMAS KM 11+387		
01.09.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		

SUPERVISIÓN DE OBRA "CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMÓCHOS"
ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 1 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



ING. JUAN A. JIMÉNEZ CARRASCO
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA
CIP Nº 054850

Calle Adolfo King N° 148 - PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
Cel. N° 990 076 615
e-Mail: juanjim2005@hotmail.com

9900283

01.09.01.01	DÉMOLICION DE CONCRETO ARMADO	m3	2.81
01.09.01.02	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	1,775.57
01.09.01.03	EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	1,557.75
01.09.01.04	EXCAVACION PARA CIMENTACION DE UÑA DE ENROCADO	m3	113.00
01.09.01.05	CORTE, PERFILADO Y REFINE DE TALUD	m2	215.77
01.09.01.06	COMPACTACION DE SUBRASANTE EN TRAMOS DE CORTE	m3	313.60
01.09.01.07	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE PARA CONFORMACION DE DIQUE	m3	667.22
01.09.01.08	RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ESTRUCTURAS COMPACTADO	m3	810.12
01.09.01.09	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO	m3	88.48
01.09.01.10	PLATAFORMA PARA FABRICACION DE VIGAS	m2	250.00
01.09.01.11	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 2.0 km	m3	2,366.15
01.09.01.12	EXTRACCION, SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA PARA ENROCADOS	m3	497.34
01.09.01.13	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCADOS D=0.5km (PROMEDIO)	m3	497.34
01.09.01.14	ACÓMODO DE ENROCADO	m3	497.34
01.09.01.15	AFIRMADO e=0.20m	m3	62.72
01.09.01.16	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE	m3	94.08
01.09.02	CONCRETO SIMPLE		
01.09.02.01	CONCRETO SIMPLE $f_c=100 \text{ kg/cm}^2$, E=0.10m (SOLADOS)	m3	11.62
01.09.02.02	SUB CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO C:H, 1:12 + 30% P.G.	m3	55.73
01.09.02.03	MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m3	289.87
01.09.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SUBCIMIENTO DE ESTRIBOS	m2	54.24
01.09.02.05	DESMOLDANTE PARA SOLADO DE VIGAS PREFABRICADAS	m2	54.00
01.09.03	CONCRETO ARMADO		
01.09.03.01	CONCRETO PRE MEZCLADO $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$, CON CEMENTO TIPO MS(MH)	m3	131.97
01.09.03.02	CONCRETO $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$, CON CEMENTO TIPO MS(MH)	m3	119.27
01.09.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (RECTO)	m2	326.96
01.09.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (RECTO)	m2	222.08
01.09.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA (FONDO)	m2	115.90
01.09.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA PREFABRICADO (CARAVISTA)	m2	269.70
01.09.03.07	ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	31,757.96
01.09.04	JUNTAS Y SELLOS		
01.09.04.01	JUNTA WATERSTOP, E=6"	m	17.85
01.09.04.02	JUNTA ELASTOMERICAS	m	17.85
01.09.04.03	JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA	m	19.00
01.09.04.04	APOYO DE NEOPRENO EN CANOAS	m2	3.00
01.09.05	VARIOS		
01.09.05.01	TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS PREFABRICADAS CON GRUA HIDRAULICA 250 Ton	und	5.00

SUPERVISIÓN DE OBRA "CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE: EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAYIMOCHIC Y LA ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 1 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



ING. JUAN A. JIMENEZ CARRASCO
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA
CIP N° 054850

Calle Adolfo King N° 148 - PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Cel. N° 990 076 615

e-Mail: juanjim2005@hotmail.com

000282

01.10	CANOA DE CONCRETO ARMADO LAS LOMAS KM 11+128		
01.10.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.10.01.01	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO	m3	3.09
01.10.01.02	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA	m3	9.66
01.10.01.03	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	1,436.17
01.10.01.04	EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	1,544.63
01.10.01.05	EXCAVACION PARA CIMENTACION DE UÑA DE ENROCADO	m3	163.87
01.10.01.06	CORTE, PERFILADO Y REFINE DE TALUD	m2	170.38
01.10.01.07	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE PARA CONFORMACION DE DIQUE	m3	527.58
01.10.01.08	RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ESTRUCTURAS COMPACTADO	m3	272.78
01.10.01.09	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO	m3	16.07
01.10.01.10	PLATAFORMA PARA FABRICACION DE VIGAS	m2	151.20
01.10.01.11	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 2.0 km	m3	2,828.46
01.10.01.12	EXTRACCION, SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA PARA ENROCADOS	m3	280.87
01.10.01.13	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCADOS D=0.5km (PROMEDIO)	m3	280.87
01.10.01.14	ACOMODO DE ENROCADO	m3	280.87
01.10.01.15	AFIRMADO e=0.20m	m3	21.05
01.10.02	CONCRETO SIMPLE		
01.10.02.01	CONCRETO SIMPLE $f_c=100$ kg/cm ² , E=0.10m (SOLADOS)	m3	31.76
01.10.02.02	SUB CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO C/H, 1:12 + 30% P.G.	m3	49.92
01.10.02.03	MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON $f_c=210$ kg/cm ²	m3	71.66
01.10.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SUBCIMIENTO DE ESTRIBOS	m2	56.32
01.10.02.05	DESMOLDANTE PARA SOLADO DE VIGAS PREFABRICADAS	m2	34.44
01.10.03	CONCRETO ARMADO		
01.10.03.01	CONCRETO PRE MEZCLADO $f_c = 280$ kg/cm ² , CON CEMENTO TIPO MS(MH)	m3	122.51
01.10.03.02	CONCRETO $f_c=210$ kg/cm ² , CON CEMENTO TIPO MS(MH)	m3	218.13
01.10.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (RECTO)	m2	386.06
01.10.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (CURVO)	m2	18.85
01.10.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (RECTO)	m2	143.75
01.10.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA (FONDO)	m2	209.10
01.10.03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA PREFABRICADO (CARAVISTA)	m2	439.07
01.10.03.08	ACERO $f_y=4200$ kg/cm ² GRADO 60	kg	61,535.70
01.10.04	JUNTAS Y SELLOS		
01.10.04.01	JUNTA WATERSTOP, E=6"	m	275.32
01.10.04.02	JUNTA ELASTOMERICAS	m	254.52
01.10.04.03	JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA	m	3.60

SUPERVISIÓN DE OBRA "CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC
ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 1 COMPONENTE
OBRAS CIVILES"

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivra Diaz
REPRESENTANTE COMUN

01.10.05	VARIOS		
01.10.05.01	TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS PREFABRICADAS CON GRUA HIDRAULICA 250 Ton	und	7.00
01.11	FLETE		
01.11.01	FLETE TERRESTRE	gib	1.00

Fuente: Expediente Técnico.

2.6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES POR PARTIDA.

Las actividades ejecutadas en el periodo del 01 al 31 del mes de mayo 2025 son las que se detallan a continuación:

2.6.1. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

2.6.1.1. ALQUILER DE BAÑO QUÍMICO

Descripción

Comprende el suministro y el transporte al lugar de la obra, baños químicos portátiles (sanitarios portátiles) para uso exclusivo del personal de la obra y necesarios para la ejecución de los trabajos.

Los servicios higiénicos estarán ubicados cerca de la zona en la que se ejecutarán los trabajos en tal forma que no interfieran con el normal desarrollo de las labores.

Ejecución

Esta partida contempla la dotación o alquiler de baños químicos portátiles (sanitarios portátiles) para uso exclusivo del personal de la obra. Se considera 09 módulos de servicios higiénicos portátiles modelo estándar para el personal obrero, en los diferentes frentes de trabajo, no se considera esta partida para el campamento principal, toda vez que dicho campamento en su costo incluye sus servicios higiénicos.

2.6.2. ESTRUCTURA DE INGRESO DE CONCRETO ARMADO LA RINCONADA KM 28+905.

2.6.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.6.5.1.1. EXCAVACIÓN MASIVA EM MATERIAL SUELTO

Descripción

Esta partida consiste en excavar a máquina en las zonas aguas arriba de las canoas a fin de tener una franja de terreno parejo, que permita direccionar la escorrentía que bajara por la quebrada hacia la bocal de entrada de la canoa. El nivel del fondo de la excavación, será aquel que se determina en los planos, y es desde aquí de donde se hará la excavación de la uña del enrocado de protección. El terreno a cortar está constituido por material suelto, el mismo que debe ser colocado en las inmediaciones donde se conformarán los diques para utilizarlo como material de relleno, el material que no reúna las condiciones será colocado convenientemente en el borde del canal madre a manera de protección ante probables avenidas aguas arriba de las quebradas. Queda entendido que las



rocas sueltas de diámetro menor a un metro, serán consideradas como material suelto.

Las excavaciones se harán teniendo en cuenta todo lo indicado en el acápite 3.2 Especificaciones técnicas de obras de movimiento de tierras.

2.7. CUADRO DE RESUMEN DE AVANCES LOS FISICOS Y FINANCIEROS

Durante el periodo del 01 al 31 del mes de mayo del 2025, se han ejecutado las partidas contractuales siguiente:

AVANCES FISICOS

AVANCE EJECUTADO HASTA EL MES DE MAYO 2025:

VAL. N°	MES	MONTOS PROGRAMADOS (Inc/ IGV)		% AVANCE PROGRAMADO		MONTOS EJECUTADOS (Inc./ IGV)		% AVANCE EJECUTADO	
		PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.	MENSUAL	ACUM.
01	30/04/2025	S/. 51,344.51	S/.51344.51	0.68%	0.68%	S/. 51,344.51	S/.51,344.51	0.68%	0.68%
02	31/05/2025	S/. 436,241.61	S/.487,586.12	5.81%	6.49%	S/. 626.31	S/.51,970.82	0.01%	0.69%
	TOTAL		S/. 487,586.12		6.49%		S/. 51,970.82		0.69%

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA					
VALORIZACION			MONTO FACTURABLE CON IGV	ACUMULADO MENSUAL (C/IGV)	AVANCE FISICO
MES	DESCRIPCION	MONTO (C/IGV)	S/	S/	%
ABRIL 2025	VALORIZACION DE OBRA N° 01	S/. 51,344.51	S/. 51,344.51	S/. 51,344.51	0.68%
MAYO 2025	VALORIZACION DE OBRA N° 02	S/. 626.31	S/. 626.31	S/. 51,970.82	0.01%
TOTAL				S/. 51,970.82	0.69%

2.8. PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS

Durante el periodo del 01 al 31 del mes de mayo 2025, se han ejecutado las partidas contractuales siguiente:

SUPERVISIÓN DE OBRA "CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL L.A. SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - SUL: 2593295 ITEM 1 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE CONSORCIO



ING. JUAN A. JIMÉNEZ CARRASCO
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA
CIP N° 054830

Calle Adolfo King N° 148 – PROVINCIA DE PACASMAYO – LA LIBERTAD
Cel. N° 990 076 615
e-Mail: juanjim2005@hotmail.com

00027

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
01	COMPONENTE OBRAS CIVILES		
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES		
01.01.01.03	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	u/mes	0.52
01.03	ESTRUCTURA DE INGRESO DE CONCRETO ARMADO LA RINCONADA KM 28+905		
01.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.06.01.02	EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	24.93

2.9. CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA

El porcentaje de avance financiero de la obra se determina con la siguiente fórmula:

$$\% \text{ AVANCE FINANCIERO} = \frac{\text{VALORIZACIÓN ACUMULADA}}{\text{COSTO TOTAL DE LA OBRA (C/IGV)}} \times 100$$

Valor. Acum. May.2025 : S/ 51,970.82 (C/IGV)

Costo Total De La Obra Contractual : S/ 7'502,429.05 (C/IGV)

% AVANCE FINANCIERO MAYO 2025 : 0.69 %

RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO

DESEMBOLSOS		CONCEPTO	MONTO A FACTURAR(C/IGV)	RETENCIÓN (C/IGV)	MONTO NETO A COBRAR (C/IGV)	% AVANCE
No.	MES					
1	Abril - 2025	VALORIZACIÓN DE OBRA N°01	S/. 51,344.51	S/. 125,040.48	S/. 0.00	0.68%
1	Mayo - 2025	VALORIZACIÓN DE OBRA N°02	S/. 626.31	S/. 125,040.48	S/. 0.00	0.01%
TOTAL, ACUMULADO:			S/. 51,970.82	S/. 250,080.96	S/. 0.00	0.69%

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54830

CONSORCIO DIAMANTE

SUPERVISIÓN DE OBRA "CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC"
ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 1 COMPONENTE
OBRAS CIVILES"



1.1 CONTROL DE RETENCIONES.

000278

AMORTIZACION DE RETENCIÓN DEL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO					
VALORIZACION BRUTA Sin IGV			AMORTIZACION		
N°	MES VALORIZACION	MONTO VALORIZADO C/IGV	DETRACCION	MONTO AMORTIZADO	ACUMULADO
1	Abr-25	51,344.51	2054.00	49,290.51	49,290.31
2	May-25	626.31	25.00	601.31	49,891.82

2.10. EVALUACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

La obra se está ejecutando bajo los estándares de calidad establecidos, así mismo se está ejecutando lo establecido en Expediente Técnico realizando a la par las mejoras necesarias para que la obra logre su finalidad. La obra cuenta con un avance físico ejecutado en el mes de mayo de 0.01%, encontrándose ATRASADA 5.80%, en relación a los calendarios programados acumulados de avance de la obra.



La obra cuenta con un avance físico ejecutado del 01 al 31 de mayo del 2025 de 0.01%, y en consecuencia un avance acumulado ejecutado, en comparación a lo programado del mes presenta atraso, siendo necesario la presentación de Calendario acelerado, por lo que el porcentaje acumulado ejecutado no supera el 80%.



000277

2.11. MANEJO DE IMPACTOS AMBIENTALES

Consiste en el cumplimiento de objetivos articulados en torno a los impactos directos identificados y evaluados, previamente, en los diferentes componentes ambientales.

Las medidas aplicables estas interrelacionadas con impactos que afectan indistintamente a más de un componente socio ambiental.

Aquí se encuentran comprendidos los trabajos de:

- Programa de manejo de residuos sólidos
- Plan de monitoreo ambiental

2.12. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO POR PARTIDA.

Equipo Topográfico y de laboratorio

Se cuenta en campo con las calibraciones de los equipos topográficos que usa el Consorcio Ejecutor de Obras para dar conformidad a los procesos, que requieren su uso.

Sobre los Materiales, Equipos y Herramientas

Para realizar la actividad, se pueden considerar entre otros el siguiente equipamiento:

- Teodolito y Nivel topográfico o Estación total, GPS.
- Prisma y mini prisma
- Mira y jalones
- Winchas metálicas
- Estacas de fierro o madera (mínimo de 0.30m de longitud), clavos, tiza, yeso, pintura.
- Lampa, pico, barretas y carretillas.
- Otros.
- En el mes de mayo se realizó la verificación de equipos topográficos.

Materiales

Se verifica que el almacén de obra cumpla con lo establecido, en referencia al almacenaje de los materiales. Así mismo se verifica que el contratista ingrese a obra los materiales de buena calidad.

- **Control de procedimientos constructivos**

Los métodos constructivos utilizados por el contratista son los mismos que indican las Especificaciones Técnicas del Proyecto, por lo tanto, el contratista está cumpliendo con lo estipulado en el expediente técnico.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54850

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMÚN



000276



CONSORCIO DIAMANTE



PANEL FOTOGRÁFICO - MES DE MAYO 2025

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar F. Rivera Diaz
REPRESENTANTE UNIÓN

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CP 14000

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 01 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

2.13. PANEL FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES

000275

PANEL FOTOGRÁFICO DEL MES DE MAYO 2025

Imagen n.º 01



Se verificó la realización de la partida de movimiento de tierras en Yugoslavia.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54850

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

000274

Imagen n.º 02



Se supervisó la aprobación de la partida de la excavación y se verificó con la arqueóloga que no se encontraron restos arqueológicos en Yugoslavia.

Imagen n.º 03



Se supervisó en Yugoslavia la señalización en campo.

CONSORCIO DIAMANTE

Juan A. Jiménez Carrasco
Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54850

CONSORCIO DIAMANTE

Imagen n.º 04



Se supervisó el trabajo de la partida de corte y excavación en Rinconada.

Imagen n.º 05



Se supervisó la señalización de campo en el sector de la Rinconada

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 054850

CONSORCIO DIAMANTE

000272

Imagen n.º 06



La supervisión y el contratista definiendo procesos constructivos en el Sector Rinconada.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 054850

Imagen n.º 07



Se verifico la excavación para loza de estructura de ingreso en el Sector de Rinconada.

Imagen n.º 08



Inspección de trabajos por parte del Proyecto especial de CHAVIMOCHIC en Sector de Yugoslavia.

Imagen n.º 09



Se verificó los equipos procedente para la compactación de la partida Relleno con Material procedente de corte para la conformación del dique en el sector de Rinconada.

Imagen n.º 10



Se verificó el uso los materiales para el encofrado en el sector la Rinconada.

CONSORCIO DIAMANTE

Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 054850

Imagen n.º 11



Se supervisó la partida de excavación y corte en el sector la Rinconada.

CONSORCIO DIAMANTE

Imagen n.º 12



Se supervisó junto con el especialista ambiental cumpliendo el PMA en Yugoslavia.

Imagen n.º 13



Se supervisó el punto ecológico en el sector la Rinconada.

CONSORCIO DIAMANTE

Imagen n.º 16



Participación de la supervisión en la charla Diarias en Yugoslavia.

Imagen n.º 17



Se definió los procesos constructivos y el avance real con la Contraloría y la Entidad en el sector de Yugoslavia.

CONSORCIO DIAMANTE

Imagen n.º 18



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54050

Se verificó la partida el trazo y replanteo en Yugoslavia II.

Imagen n.º 19



Se verificó inicio de excavaciones en zona de las estructuras en la ubicación de las canos en el Sector de Yugoslavia I y II.

Imagen n.º 20



Se vació el solado que no está considerado con la aprobación por parte de la Supervisión en el sector Yugoslavia II.

Imagen n.º 21



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jimenez Carrasco

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz

Imagen n.º 22



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 23



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP Nº 054850

CONSORCIO DIAMANTE

Imagen n.º 24



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 25



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE

Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54830

CONSORCIO DIAMANTE

Imagen n.º 26



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 27



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE

Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 34850

CONSORCIO DIAMANTE

Imagen n.º 28



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 29



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CP N° 054850

Imagen n.º 30



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 31



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 054850

CONSORCIO DIAMANTE

No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 32



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 33



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 054830

CONSORCIO DIAMANTE

Imagen n.º 34



Imagen n.º 35



CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54850

CONSORCIO DIAMANTE

Imagen n.º 36



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 37



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CP N° 054850

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar V. Rivera Díaz
GERENTE GENERAL

Imagen n.º 38



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 39



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54850

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. César N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE CONSORCIO

Imagen n.º 40



Imagen n.º 41



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez C.
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54850

CONSORCIO DIAMANTE

Imagen n.º 42



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 43



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jimenez C.
JEFE DE SUPERVISION
CIP 054830

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE OGBU

Imagen n.º 44



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 45



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54850

CONSORCIO DIAMANTE

Imagen n.º 46



Imagen n.º 47



CONSORCIO DIAMANTE

Imagen n.º 48



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 49



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54850

CONSORCIO DIAMANTE

Imagen n.º 50



No se registraron actividades por parte del contratista.


Imagen n.º 51



No se registraron actividades por parte del contratista.


CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54850

Imagen n.º 52

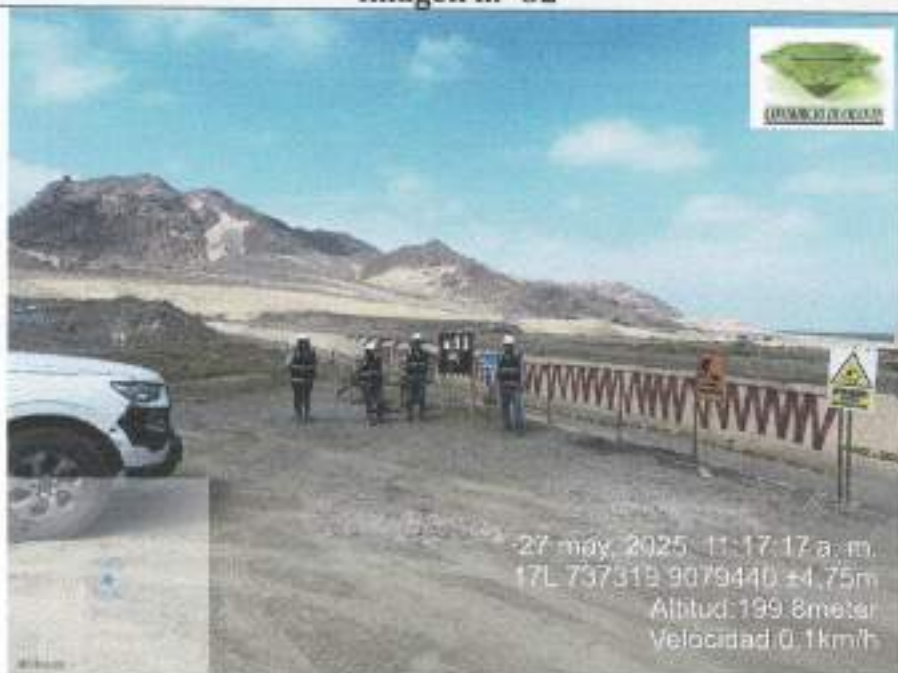

No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 53

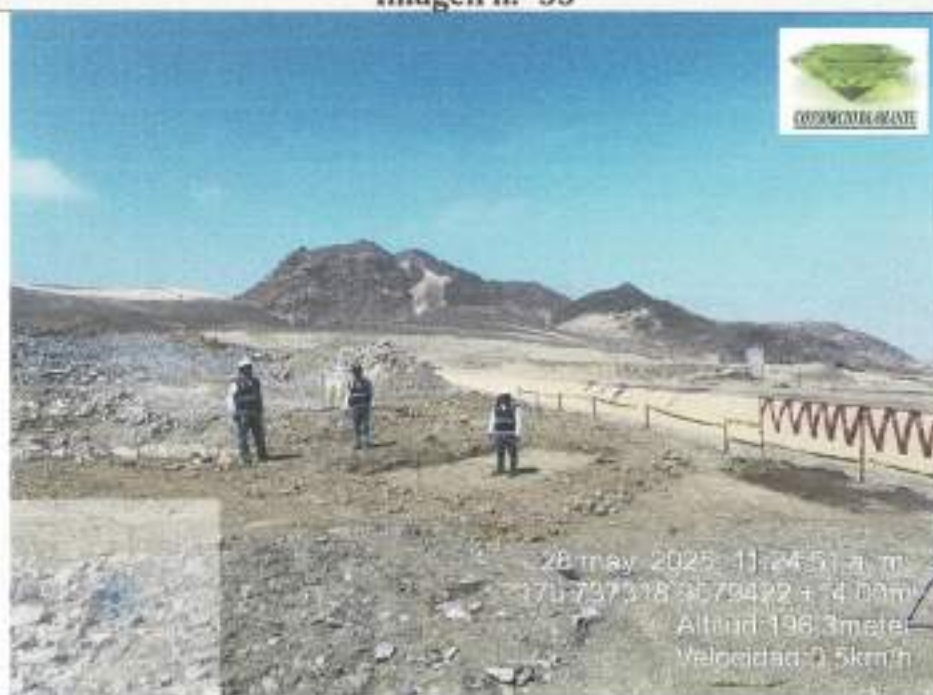


No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE
Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54830

CONSORCIO DIAMANTE

Imagen n.º 54

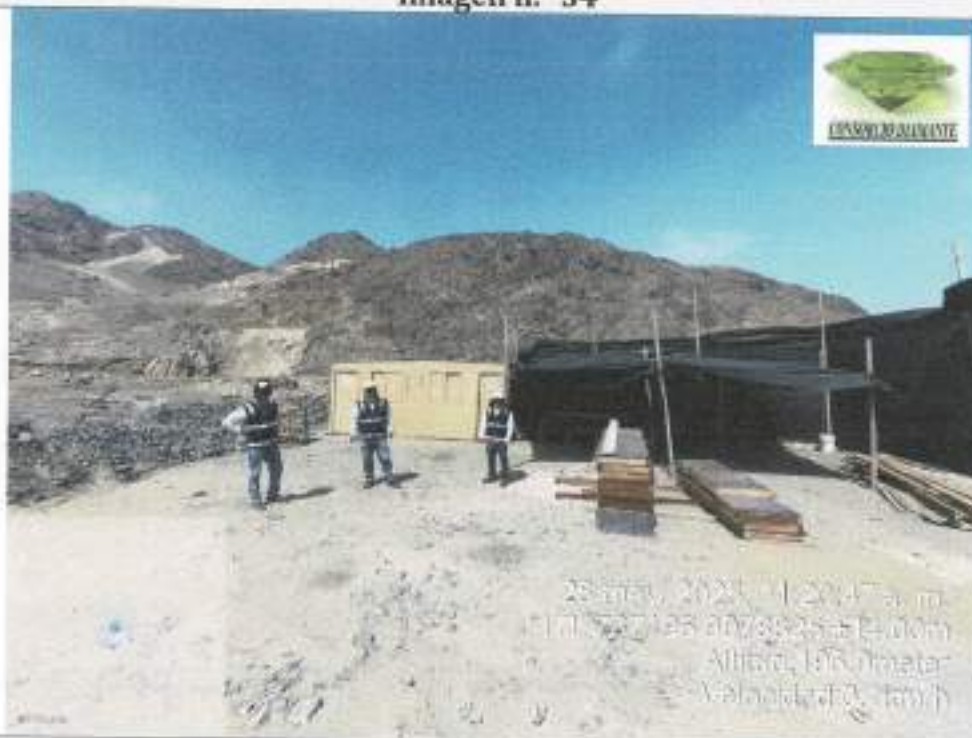

No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 55



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54850

CONSORCIO DIAMANTE

Imagen n.º 56



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 57



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54850

CONSORCIO DIAMANTE

No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 58



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 59



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54850



2.14. CONCLUSIONES

- Se da CONFORMIDAD a los trabajos realizados por el contratista a fin de que sea sustento para los tramites de valorización pertinente.
- Se ha cumplido con los deberes contractuales concernientes al servicio de consultoría para la supervisión de la obra.
- Se recomienda dar trámite a la valorización de supervisión de obra N°2, por el periodo del 01 al 31 de mayo de acuerdo a las formas y plazos de ley.
- La valorización N° 02- mayo 2025 del contratista, presenta un avance de ejecución de obra 0.01% con un monto de S/626.31(Seiscientos veinte seis con 31/10 soles) con IGV.
- En el presente mes presenta un Avance Acumulado ejecutado 0.69% con respecto al calendario de avance de obra propuesto por el contratista ejecutor de la obra (Avance progr. Acumulado: 6.49%. Encontrándose la obra ATRASADA.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMÚN



- El avance físico contractual mayo 2025 corresponde a S/626.31(Seiscientos veinte seis con 31/10 soles) con un avance físico ejecutado de **0.01 %** con respecto al presupuesto contractual.
- El monto a cancelar del mes de mayo 2025 al contratista CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS es de **S/ 0.00(Cero con 00/100 soles) con IGV.**
- Encontrándose la obra en nuevamente en ATRASO siendo necesario por segunda vez la solicitud del calendario acelerado de Obra, ya que se encuentra por debajo del 80% del programado acumulado.
- Solo se aprecia trabajos en obra del día 01 al 08 de mayo del 2025, desde el 09 hasta el 31 de mayo del 2025 no se apreció actividades en obra debido a la ausencia del personal clave del contratista.

2.15. RECOMENDACIONES

- Se recomienda al contratista CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS, cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico.
- El contratista Consorcio Ejecutor de Obras no presentó valorización de obra N°02 correspondiente al mes de mayo 2025, por lo que corresponde actuar de acuerdo a la cláusula Decima Quinta: Penalidades, respecto al ítem N°04 (No presentar oportunamente informes de valorización Mensual)
- Sirvase a la Entidad actuar de acuerdo al artículo 204 Intervención económica de la obra de la ley N° 30225, Ley de contrataciones de Estado.

Sin otro particular, me suscribo de usted no sin antes manifestarle mi mayor consideración.

Atentamente,


CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54830


CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



000243



CONSORCIO DIAMANTE



PROYECTO
**CHAVI
MOCHIC**

VALORIZACIÓN N°02 - EJECUCIÓN PRESENTADA POR LA SUPERVISIÓN

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. José A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 34350

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 01 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN



000242



CONSORCIO DIAMANTE



PROYECTO
**CHAVI
MOCHIC**

PRESUPUESTO DE OBRA

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54680

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ÍTEM 01 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO AL INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ARTE EN PUENTE SOTENA DE RIGGO CHAMMOCHÉ Y 1ª ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VILLI, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" C.M.
 CLIENTE: PROYECTO ESPECIAL CHAMMOCHÉ
 CONTRATISTA: CONSORCIO RESOLUTOR DE OBRAS

000241

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO \$/.	PARCIAL \$/.
01	COMPONENTE OBRAS CIVILES				
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				
01.01.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS	gr	1.00	100,000.00	100,000.00
01.01.01.02	CAMPAMENTO PROVISIONAL	m2	700.00	150.00	105,000.00
01.01.01.03	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	univ	45.00	540.00	24,300.00
01.01.01.04	CARTIL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.00 X 2.40 m	univ	1.00	743.80	743.80
01.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	gr	1.00	42,566.00	42,566.00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACION AMBIENTAL, PLAN DE MONITOREO				
01.02.01	SEGURIDAD Y SALUD				
01.02.01.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	gr	1.00	4,500.00	4,500.00
01.02.01.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	gr	1.00	0,265.76	0,265.76
01.02.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	gr	1.00	4,787.17	4,787.17
01.02.01.04	CAPACITACION DE SEGURIDAD	gr	1.00	900.00	900.00
01.02.01.05	RECURSOS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION	gr	1.00	1,308.80	1,308.80
01.02.02	RIESGOS DE PREVENION, MITIGACION O CORRECCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES				
01.02.02.01	MEDIDAS DE PREVENICION Y MITIGACION DEL SUELO	gr	1.00	100.00	100.00
01.02.02.02	MEDIDAS DE PREVENICION Y MITIGACION DEL AGUA	gr	1.00	2,070.00	2,070.00
01.02.02.03	MEDIDAS DE PREVENICION Y MITIGACION DEL AIRE Y EL RUIDO	gr	1.00	26,674.00	26,674.00
01.02.02.04	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	gr	1.00	10,885.00	10,885.00
01.02.02.05	PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL	gr	1.00	35,715.00	35,715.00
01.02.02.06	PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL	gr	1.00	3,820.00	3,820.00
01.02.02.07	PLAN DE CIERRE DE OBRA	gr	1.00	5,890.00	5,890.00
01.02.03	MONITOREO ARQUEOLOGICO	gr	1.00	41,000.00	41,000.00
01.03	ESTRUCTURA DE INGRESO DE CONCRETO ARMADO LA RINCONADA KM 28+300				
01.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.03.01.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO SIMPLE EN CANAL MADRE CON CASCO #10 10 m	m3	17.10	8.81	151.37
01.03.01.02	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	158.80	7.25	1,151.34
01.03.01.03	EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	429.14	5.72	2,454.88
01.03.01.04	EXCAVACION PARA CIMENTACION DE UÑA DE ENROCADO	m3	290.07	6.03	1,749.33
01.03.01.05	CORTE, PERILADO Y REFINO DE TALUD	m3	947.12	3.02	2,860.30
01.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE PARA CONFORMACION DE OBRAS	m3	4,225.48	13.84	58,660.94
01.03.01.07	RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ESTRUCTURAS COMPACTADO	m3	383.08	20.70	7,939.48
01.03.01.08	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO	m3	20.82	116.42	2,421.41
01.03.01.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 2.0 m	m3	5.41	8.80	47.80
01.03.01.10	EXTRACCION, SELECCION Y ACOPIO DE ROCA PARA ENROCADOS	m3	954.14	17.88	17,055.18
01.03.01.11	CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCADOS 0.80 km (PROMEDIO)	m3	954.14	12.85	12,255.41
01.03.01.12	TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCADOS POR CADA km ADICIONAL	m3	7,489.81	3.01	22,553.32
01.03.01.13	ACORDO DE ENROCADO	m3	354.14	35.40	12,516.96
01.03.02	CONCRETO SIMPLE				
01.03.02.01	CONCRETO SIMPLE f _c =160 kg/cm ² , E=10m (BOLADOS)	m3	8.04	377.88	3,036.07
01.03.02.02	ARMPOSTERIA DE PIEDRA ARRENTADA Y ENCOQUILLADA CON PC=315 kg/cm ²	m3	53.77	449.11	24,148.62
01.03.03	CONCRETO ARMADO				
01.03.03.01	CONCRETO f _c =210 kg/cm ² , CON CEMENTO TIPO 80(MH)	m3	06.00	907.80	5,446.80
01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (RECTO)	m2	166.24	65.07	10,800.00
01.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (CURVO)	m2	84.71	92.83	7,844.13
01.03.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (RECTO)	m2	25.16	89.05	2,243.39
01.03.03.05	ACERO f _y =4200 kg/cm ² GRADO 60	kg	4,331.34	4.01	17,368.68
01.03.04	JUNTAS Y SELLOS				
01.03.04.01	JUNTA WATERSTOP, E=1"	m	20.70	19.92	412.34
01.03.04.02	JUNTA ELASTOMERICA	m	20.70	20.27	419.48
01.04	CANAL DE CONCRETO ARMADO LOS COLORADOS KM 28+324				
01.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.04.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	2,750.72	7.25	19,942.72
01.04.01.02	EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	1,810.07	5.72	10,358.42
01.04.01.03	EXCAVACION PARA CIMENTACION DE UÑA DE ENROCADO	m3	180.41	6.03	1,090.27
01.04.01.04	CORTE, PERILADO Y REFINO DE TALUD	m3	324.21	3.02	979.11
01.04.01.05	COMPACTACION DE SUBGRANITE EN TRAMOS DE CORTE	m3	170.24	1.84	313.24
01.04.01.06	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE PARA CONFORMACION DE OBRAS	m3	1,191.17	13.84	16,485.72
01.04.01.07	RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ESTRUCTURAS COMPACTADO	m3	430.43	20.70	8,908.01
01.04.01.08	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO	m3	111.87	116.42	12,995.41
01.04.01.09	PLATAFORMA PARA FABRICACION DE VIAS	m3	380.00	4.10	1,558.00
01.04.01.10	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 2.0 m	m3	5,882.11	6.08	35,563.84
01.04.01.11	EXTRACCION, SELECCION Y ACOPIO DE ROCA PARA ENROCADOS	m3	270.44	17.88	4,826.87
01.04.01.12	CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCADOS 0.80 km (PROMEDIO)	m3	270.44	12.85	3,474.08
01.04.01.13	TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCADOS POR CADA km ADICIONAL	m3	2,874.86	3.01	8,651.82
01.04.01.14	ACORDO DE ENROCADO	m3	270.44	12.40	3,354.36
01.04.01.15	ARMADO #10 30m	m3	12.81	147.87	1,894.40
01.04.02	CONCRETO SIMPLE				
01.04.02.01	CONCRETO SIMPLE f _c =160 kg/cm ² , E=10m (BOLADOS)	m3	35.06	377.88	13,270.00
01.04.02.02	SUB CEMENTO CORRIDO DE CONCRETO C.H., 1:12 + 30% P.C.	m3	50.00	170.07	8,503.50
01.04.02.03	ARMPOSTERIA DE PIEDRA ARRENTADA Y ENCOQUILLADA CON PC=315 kg/cm ²	m3	414.00	446.11	184,698.60
01.04.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SUBCIMENTO DE BARRIOS	m2	04.90	72.84	3,570.88
01.04.02.05	DESMOLDANTE PARA SOLADO DE VIAS PREFABRICADAS	m2	40.80	11.25	459.00
01.04.03	CONCRETO ARMADO				
01.04.03.01	CONCRETO FHE MEZCLADO f _c =280 kg/cm ² , CON CEMENTO TIPO 80(MH)	m3	100.57	988.81	99,421.30
01.04.03.02	CONCRETO f _c =210 kg/cm ² , CON CEMENTO TIPO 80(MH)	m3	200.60	907.80	182,161.80
01.04.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (RECTO)	m2	294.27	65.07	19,148.96

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO DIAMANTE
 Ing. Juana Jimenez Carrasco
 JEFE DE SUPERVISION
 C.P. 5400

01.04.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (CURVO)	m2	15.12	92.83	1,423.09
01.04.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (RECTO)	m2	204.54	58.93	18,837.28
01.04.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA (FONDO)	m2	208.72	73.39	18,728.34
01.04.03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA PRE FABRICADO (CARAVISTA)	m2	355.44	88.93	38,118.85
01.04.03.08	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	88,628.97	4.91	267,953.51
01.04.04	JUNTAS Y SELLOS				
01.04.04.01	JUNTA WATERSTOP, E=H	m	280.00	16.50	4,680.00
01.04.04.02	JUNTA ELASTOMERICAS	m	280.00	20.07	5,199.20
01.04.04.03	JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA	m	3.00	32.28	80.21
01.04.05	VARIOS				
01.04.05.01	TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS PRE FABRICADAS CON GRUA HIDRAULICA 250 Ton	una	8.00	2,891.83	21,453.94
01.05	CANAL DE CONCRETO ARMADO TOMA LAREDO KM 21+118				
01.05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.05.01.01	DEMOLUCION DE CONCRETO ARMADO	m3	8.40	380.14	3,025.08
01.05.01.02	DEMOLUCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA	m3	13.73	276.18	3,786.46
01.05.01.03	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	1,423.41	7.25	10,319.72
01.05.01.04	EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	724.28	8.72	6,142.94
01.05.01.05	EXCAVACION PARA OMENTACION DE UNA DE ENROCADOS	m3	153.84	8.83	1,319.94
01.05.01.06	CORTE, PERIFILADO Y REFINE DE TALUD	m3	95.15	3.82	897.38
01.05.01.07	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE PARA CONFORMACION DE DIQUE	m3	283.40	13.84	3,919.48
01.05.01.08	RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ESTRUCTURAS COMPACTADO	m3	421.33	29.76	12,538.70
01.05.01.09	RELLENO CON MATERIAL DE PRESFAMO COMPACTADO	m3	21.24	115.45	2,414.82
01.05.01.10	PLATAFORMA PARA FABRICACION DE VIGAS	m2	322.06	4.18	1,363.26
01.05.01.11	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 2.0 km	m3	1,886.73	8.03	15,087.21
01.05.01.12	EXTRACCION, SELECCION Y ACOPIO DE ROCA PARA ENROCADOS	m3	152.30	17.06	2,672.87
01.05.01.13	CARGUNO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCADOS D=8.5m (PROMEDIO)	m3	152.30	12.05	1,895.12
01.05.01.14	TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCADOS POR CADA 8m ADICIONAL	m3m	885.74	3.81	1,146.00
01.05.01.15	ACOMODO DE ENROCADOS	m3	152.30	18.48	2,816.53
01.05.01.16	AFIRMADO e=0.20m	m3	54.24	141.87	7,884.10
01.05.02	CONCRETO SIMPLE				
01.05.02.01	CONCRETO SIMPLE fy=180 kg/cm2, E=8.10m (SOLADOS)	m3	30.04	377.88	11,360.31
01.05.02.02	SUB CEMENTO CORRIDO DE CONCRETO C.H. 1:12 + 30% P.G.	m3	46.90	176.07	8,199.61
01.05.02.03	MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA Y ENROCADILLA CON FIO=215 kg/m2	m3	112.18	446.11	50,085.65
01.05.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SUBCIMENTO DE ESTRIBOS	m2	56.33	72.84	4,081.08
01.05.02.05	DESALOLANTE PARA SOLADO DE VIGAS PREFABRICADAS	m2	34.44	11.75	404.67
01.05.03	CONCRETO ARMADO				
01.05.03.01	CONCRETO PRE MEZCLADO fy=350 kg/cm2, CON CEMENTO TIPO M5(MH)	m3	122.51	888.51	75,186.42
01.05.03.02	CONCRETO fy=210 kg/cm2, CON CEMENTO TIPO M5(MH)	m3	273.25	552.25	154,438.38
01.05.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (RECTO)	m2	391.90	88.97	30,338.83
01.05.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (CURVO)	m2	18.85	92.83	1,748.88
01.05.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (RECTO)	m2	185.45	86.03	16,051.85
01.05.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA (FONDO)	m2	203.10	72.38	15,136.70
01.05.03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA PRE FABRICADO (CARAVISTA)	m2	439.07	88.93	48,113.37
01.05.03.08	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	90,117.00	4.91	290,173.58
01.05.04	JUNTAS Y SELLOS				
01.05.04.01	JUNTA WATERSTOP, E=H	m	276.00	16.50	4,670.28
01.05.04.02	JUNTA ELASTOMERICAS	m	295.22	20.07	5,122.27
01.05.04.03	JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA	m	3.00	32.28	80.21
01.05.05	VARIOS				
01.05.05.01	TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS PREFABRICADAS CON GRUA HIDRAULICA 250 Ton	una	7.00	2,891.83	18,771.41
01.06	CANAL DE CONCRETO ARMADO YUDOSLAVIA KM 14+888				
01.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.06.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	394.13	7.25	2,897.44
01.06.01.02	EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	335.84	8.72	3,025.08
01.06.01.03	EXCAVACION PARA OMENTACION DE UNA DE ENROCADOS	m3	323.89	8.83	2,146.65
01.06.01.04	CORTE, PERIFILADO Y REFINE DE TALUD	m3	988.49	3.82	2,195.85
01.06.01.05	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE PARA CONFORMACION DE DIQUE	m3	2,083.30	13.84	24,905.83
01.06.01.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ESTRUCTURAS COMPACTADO	m3	182.35	29.76	5,708.22
01.06.01.07	RELLENO CON MATERIAL DE PRESFAMO COMPACTADO	m3	16.51	115.45	1,984.78
01.06.01.08	PLATAFORMA PARA FABRICACION DE VIGAS	m2	190.08	4.18	779.93
01.06.01.09	EXTRACCION, SELECCION Y ACOPIO DE ROCA PARA ENROCADOS	m3	325.68	17.06	5,511.78
01.06.01.10	TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCADOS D=8.5m (PROMEDIO)	m3	325.68	12.05	3,987.10
01.06.01.11	ACOMODO DE ENROCADOS	m3	325.68	18.48	6,042.04
01.06.01.12	AFIRMADO e=0.20m	m3	31.87	141.87	4,578.18
01.06.02	CONCRETO SIMPLE				
01.06.02.01	CONCRETO SIMPLE fy=180 kg/cm2, E=8.10m (SOLADOS)	m3	16.16	377.88	5,711.00
01.06.02.02	SUB CEMENTO CORRIDO DE CONCRETO C.H. 1:12 + 30% P.G.	m3	28.85	176.07	4,752.18
01.06.02.03	MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA Y ENROCADILLA CON FIO=210 kg/m2	m3	64.26	446.11	28,888.78
01.06.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SUBCIMENTO DE ESTRIBOS	m2	33.28	72.84	2,417.45
01.06.02.05	DESALOLANTE PARA SOLADO DE VIGAS PREFABRICADAS	m2	35.48	11.75	238.70
01.06.03	CONCRETO ARMADO				
01.06.03.01	CONCRETO PRE MEZCLADO fy=350 kg/cm2, CON CEMENTO TIPO M5(MH)	m3	87.30	588.51	51,362.18
01.06.03.02	CONCRETO fy=210 kg/cm2, CON CEMENTO TIPO M5(MH)	m3	130.32	552.25	77,088.23
01.06.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (RECTO)	m2	227.98	88.97	19,385.11
01.06.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (CURVO)	m2	10.08	92.83	935.73
01.06.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (RECTO)	m2	151.67	86.03	13,424.16
01.06.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA (FONDO)	m2	162.80	72.38	11,980.78
01.06.03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA PRE FABRICADO (CARAVISTA)	m2	253.44	88.93	22,424.96
01.06.03.08	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	33,948.90	4.91	168,882.28
01.06.04	JUNTAS Y SELLOS				
01.06.04.01	JUNTA WATERSTOP, E=H	m	186.30	16.50	3,066.84
01.06.04.02	JUNTA ELASTOMERICAS	m	138.10	20.07	2,771.67
01.06.04.03	JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA	m	3.00	32.28	80.21
01.06.05	VARIOS				
01.06.05.01	TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS PREFABRICADAS CON GRUA HIDRAULICA 250 Ton	una	4.00	2,891.83	11,567.32
01.07	CANAL DE CONCRETO ARMADO YUDOSLAVIA KM 14+888				
01.07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.07.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	1,000.28	7.25	7,282.03
01.07.01.02	EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	1,127.31	8.72	9,845.21
01.07.01.03	EXCAVACION PARA OMENTACION DE UNA DE ENROCADOS	m3	337.32	8.83	2,985.43
01.07.01.04	CORTE, PERIFILADO Y REFINE DE TALUD	m3	418.71	3.82	1,476.80

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jarama Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
C.P. 64080

01.07.01.05	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE PARA CONFORMACION DE DIQUE	m3	1,364.59	12.84	17,495.73
01.07.01.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE ESTRUCTURAS COMPACTADO	m3	463.70	28.76	13,376.27
01.07.01.07	RELLENO CON MATERIAL DE PRISTIMO COMPACTADO	m3	58.15	118.42	6,892.59
01.07.01.08	PLATAFORMA PARA FABRICACION DE VASAS	m2	200.00	4.10	820.00
01.07.01.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 2.5 km	m3	12.74	3.50	108.29
01.07.01.10	EXTRACCION, SELECCION Y ACOPIO DE ROCA PARA EMPICADOS	m3	541.58	17.09	9,254.35
01.07.01.11	CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA EMPICADOS C=0.5km (PROMEDIO)	m3	541.58	12.08	6,538.95
01.07.01.12	ACORDADO DE EMPICADO	m3	541.58	16.48	8,921.44
01.07.01.13	APRIMADO 4HS 20m	m2	58.84	141.67	8,335.85
01.07.01.14	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE	m3	82.35	96.54	7,936.18
01.07.02	CONCRETO SIMPLE				
01.07.02.01	CONCRETO SIMPLE Fc=180 kg/cm2, E=3.10m (SOLADOS)	m3	11.57	377.88	4,371.34
01.07.02.02	SUB CEMENTO CORRIDO DE CONCRETO C.H. 1 T2 + 30% F.G.	m3	42.71	176.97	7,558.21
01.07.02.03	MAMPUESTA DE PIEDRA ABENTADA Y EMBOQUILLADA CON Fc=210 kg/cm2	m3	187.20	445.11	84,205.85
01.07.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SURGIMIENTO DE ESTREBOS	m2	44.84	12.54	5,612.63
01.07.02.05	DESMOLDANTE PARA SOLIDO DE VIGAS PREFABRICADAS	m2	43.20	15.70	507.80
01.07.03	CONCRETO ARMADO				
01.07.03.01	CONCRETO PRE ARMADO Fc = 280 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO MS(MH)	m3	114.87	589.01	67,558.58
01.07.03.02	CONCRETO Fc=210 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO MS(MH)	m3	189.08	557.35	106,196.74
01.07.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARRASTA (RECTO)	m2	105.34	33.07	3,485.24
01.07.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (RECTO)	m2	175.62	86.02	15,180.31

000239

CONSORCIO DIAMANTE
 Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP 54850

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
 REPRESENTANTE CUBAN

01.07.03.05	ENDOCFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA (FONDO)	m2	89.36	72.39	6,484.43
01.07.03.06	ENDOCFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA PREFABRICADO (CARAVISTA)	m2	216.78	88.83	19,587.87
01.07.03.07	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	28,886.64	4.91	131,816.46
01.07.04.01	JUNTAS Y SELLOS				
01.07.04.02	JUNTA WATERSTOP, E=1"	m	15.90	18.82	299.03
01.07.04.03	JUNTA ELASTOMERICA	m	15.90	20.87	331.11
01.07.04.04	JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA	m	19.00	34.40	654.74
01.07.04.05	APOYO DE NEOPRENO EN CANCHAS	m2	2.45	787.21	1,941.30
01.07.05	VARIOS				
01.07.05.01	TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS PREFABRICADAS CON GRUA HIDRAULICA 250 Ton	unf	4.00	2,881.83	10,726.52
01.08	CANCHA DE CONCRETO ARMADO LAS LOMAS RM 10-513				
01.08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.08.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	366.20	7.25	2,653.03
01.08.01.02	EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	9.40	5.73	53.84
01.08.01.03	EXCAVACION PARA CIMENTACION DE VIGA DE ENROCCADO	m3	72.06	9.63	697.76
01.08.01.04	CORTE, PERFILADO Y REFINO DE TALUD	m3	188.00	3.02	404.97
01.08.01.05	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE PARA CONFORMACION DE DQUE	m3	210.05	15.84	3,329.58
01.08.01.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ESTRUCTURAS COMPACTADO	m3	547.52	29.78	16,294.20
01.08.01.07	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO	m3	11.83	118.43	1,382.91
01.08.01.08	PLATAFORMA PARA FABRICACION DE VIGAS	m2	168.90	4.10	774.90
01.08.01.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 2.0 km	m3	383.10	8.80	3,369.28
01.08.01.10	EXTRACCION, SELECCION Y ACOPO DE ROCA PARA ENROCCADOS	m3	149.70	17.39	2,608.29
01.08.01.11	CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCCADOS 0-0.5km (PROMEDIO)	m3	149.70	12.85	1,906.86
01.08.01.12	ACOMODO DE ENROCCADO	m3	149.70	15.48	2,308.95
01.08.01.13	AFIRMADO e=0.20m	m3	36.08	141.67	5,108.62
01.08.02	GAVIONES				
01.08.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVION CAJA 5.0x1.0x1.0m, ABERTURA 10x10cm, ALAMBRE 3.45mm (VARC+ALUMINO+PVC)	unf	28.00	1,106.44	31,580.32
01.08.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVION CAJA 5.0x1.5x1.0m, ABERTURA 15x15cm, ALAMBRE 3.45mm (VARC+ALUMINO+PVC)	unf	28.00	1,828.10	51,188.80
01.08.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLCHON RIVET 5.0x2.0x1.0m, ABERTURA 10x10cm, ALAMBRE 3.45mm (VARC+ALUMINO+PVC)	unf	35.00	1,000.71	35,024.85
01.08.03	CONCRETO SIMPLE				
01.08.03.01	CONCRETO SIMPLE fy=175 kg/cm2, E=6.10m	m3	18.08	610.51	7,253.14
01.08.03.02	CONCRETO SIMPLE fy=180 kg/cm2, E=6.10m (SOLADOS)	m3	18.23	377.88	6,908.86
01.08.03.03	SUB CEMENTO CORREDO DE CONCRETO C.H. 1:12 + 30% P.O.	m3	10.53	176.07	1,846.38
01.08.03.04	MAMPUESTA DE PIEDRA AZENTADA Y ENMOQUILLADA CON PC=210 kg/cm2	m3	94.83	488.11	20,115.89
01.08.03.05	ENDOCFRADO Y DESENCOFRADO PARA SUBCIMENTO DE ESTRIBOS	m2	25.83	72.84	1,880.69
01.08.03.06	DESMOLDANTE PARA BLOQUEO DE VIGAS PREFABRICADAS	m2	18.89	11.75	224.19
01.08.04	CONCRETO ARMADO				
01.08.04.01	CONCRETO PRE MEZCLADO fy = 280 kg/cm2, CON CEMENTO TIPO M500H	m3	62.80	188.01	11,816.88
01.08.04.02	CONCRETO fy=210 kg/cm2, CON CEMENTO TIPO M500H	m3	138.53	587.30	77,204.12
01.08.04.03	ENDOCFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (RECTO)	m2	981.93	83.07	81,698.39
01.08.04.04	ENDOCFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (CURVO)	m2	5.07	92.63	470.35
01.08.04.05	ENDOCFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (RECTO)	m2	87.78	66.00	5,795.47
01.08.04.06	ENDOCFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA (FONDO)	m2	84.88	72.38	6,135.67
01.08.04.07	ENDOCFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA PREFABRICADO (CARAVISTA)	m2	302.45	68.83	18,011.94
01.08.04.08	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	32,804.38	4.91	161,087.41
01.08.05	JUNTAS Y SELLOS				
01.08.05.01	JUNTA WATERSTOP, E=1"	m	106.19	18.92	2,008.08
01.08.05.02	JUNTA ELASTOMERICA	m	117.80	20.87	2,458.29
01.08.05.03	JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA	m	1.80	32.28	58.10
01.08.05.04	JUNTA EN LOSA DE VEREDA	m	37.80	19.95	754.88
01.08.06	VARIOS				
01.08.06.01	TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS PREFABRICADAS CON GRUA HIDRAULICA 250 Ton	unf	3.00	2,881.83	8,645.49
01.09	CANCHA DE CONCRETO ARMADO LAS LOMAS RM 11-387				
01.09.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.09.01.01	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO	m3	2.01	380.14	1,011.09
01.09.01.02	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	1,775.67	7.25	12,872.88
01.09.01.03	EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	1,891.78	5.73	8,970.33
01.09.01.04	EXCAVACION PARA CIMENTACION DE VIGA DE ENROCCADO	m3	112.00	9.63	1,079.16
01.09.01.05	CORTE, PERFILADO Y REFINO DE TALUD	m3	216.71	3.02	655.69
01.09.01.06	COMPACTACION DE SUBRASANTE EN TRAMOS DE CORTE	m3	313.80	1.84	575.38
01.09.01.07	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE PARA CONFORMACION DE DQUE	m3	967.22	15.84	15,324.32
01.09.01.08	RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ESTRUCTURAS COMPACTADO	m3	818.10	23.70	19,386.17
01.09.01.09	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO	m3	58.42	118.43	6,918.83
01.09.01.10	PLATAFORMA PARA FABRICACION DE VIGAS	m2	280.00	4.10	1,148.00
01.09.01.11	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 2.0 km	m3	2,286.18	8.80	20,112.24
01.09.01.12	EXTRACCION, SELECCION Y ACOPO DE ROCA PARA ENROCCADOS	m3	497.04	17.39	8,628.32
01.09.01.13	CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCCADOS 0-0.5km (PROMEDIO)	m3	497.04	12.85	6,389.52
01.09.01.14	ACOMODO DE ENROCCADO	m3	497.04	15.48	7,695.02
01.09.01.15	AFIRMADO e=0.20m	m3	62.72	141.67	8,885.04
01.09.01.16	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	m3	94.58	58.54	5,518.42
01.09.02	CONCRETO SIMPLE				
01.09.02.01	CONCRETO SIMPLE fy=180 kg/cm2, E=6.10m (SOLADOS)	m3	11.82	377.88	4,466.73
01.09.02.02	SUB CEMENTO CORREDO DE CONCRETO C.H. 1:12 + 30% P.O.	m3	58.75	176.07	10,342.88
01.09.02.03	MAMPUESTA DE PIEDRA AZENTADA Y ENMOQUILLADA CON PC=210 kg/cm2	m3	289.87	488.11	140,953.52
01.09.02.04	ENDOCFRADO Y DESENCOFRADO PARA SUBCIMENTO DE ESTRIBOS	m2	64.74	72.84	4,708.96
01.09.02.05	DESMOLDANTE PARA BLOQUEO DE VIGAS PREFABRICADAS	m2	58.00	11.75	684.50
01.09.03	CONCRETO ARMADO				
01.09.03.01	CONCRETO PRE MEZCLADO fy = 280 kg/cm2, CON CEMENTO TIPO M500H	m3	131.07	580.01	77,171.95
01.09.03.02	CONCRETO fy=210 kg/cm2, CON CEMENTO TIPO M500H	m3	119.27	597.38	71,070.13
01.09.03.03	ENDOCFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (RECTO)	m2	326.98	83.07	27,164.49
01.09.03.04	ENDOCFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (RECTO)	m2	325.58	66.00	21,492.84
01.09.03.05	ENDOCFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA (FONDO)	m2	115.88	72.38	8,380.09
01.09.03.06	ENDOCFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA PREFABRICADO (CARAVISTA)	m2	268.70	68.83	18,500.51
01.09.03.07	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	31,757.96	4.91	155,931.58
01.09.04	JUNTAS Y SELLOS				
01.09.04.01	JUNTA WATERSTOP, E=1"	m	17.85	18.92	338.82
01.09.04.02	JUNTA ELASTOMERICA	m	17.85	20.87	372.25
01.09.04.03	JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA	m	19.00	34.40	654.74
01.09.04.04	APOYO DE NEOPRENO EN CANCHAS	m2	5.00	787.21	3,936.05

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jimenez Carr. SED
JEFE DE SUPERVISION
C.R. 54350

01.09.00	VARIOS				
01.09.05.01	TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS PREFABRICADAS CON GRUA HIDRAULICA 200 Ton	unb	5.00	2,981.83	13,408.15
01.10	CANAL DE CONCRETO ARMADO LAS LORIAS KM 11+120				
01.10.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.10.01.01	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO	m3	3.08	380.14	1,112.83
01.10.01.02	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA	m3	0.88	270.18	2,684.03
01.10.01.03	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	1,435.17	7.25	10,412.23
01.10.01.04	EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	1,944.89	5.72	8,835.28
01.10.01.05	EXCAVACION PARA CIMENTACION DE LISA DE ENROCADO	m3	163.47	8.53	1,898.48
01.10.01.06	CORTE, PERFILEADO Y REFINE DE TALUD	m3	175.35	3.30	814.85
01.10.01.07	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE PARA CONFORMACION DE DIQUE	m3	527.58	13.94	7,351.71
01.10.01.08	RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ESTRUCTURAS COMPACTADO	m3	273.78	29.78	8,117.83
01.10.01.09	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO	m3	16.07	138.46	1,362.84
01.10.01.10	PLATAFORMA PARA FABRICACION DE VIGAS	m3	151.25	4.10	819.93
01.10.01.11	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 2.0 km	m3	2,528.46	6.58	24,041.91
01.10.01.12	EXTRACCION, SELECCION Y ACOPIO DE ROCA PARA ENROCADOS	m3	280.67	17.58	4,929.27
01.10.01.13	CARGADO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCADOS D=0.5m (PROMEDIO)	m3	280.67	12.68	3,565.81
01.10.01.14	ACOMODO DE ENROCADO	m3	280.67	18.49	5,193.38
01.10.01.15	AFIRMADO a=0.20m	m3	21.85	191.67	2,982.15
01.10.02	CONCRETO SIMPLE				
01.10.02.01	CONCRETO SIMPLE Fc=180 kg/cm2, E=0.10m (SOLADOS)	m3	31.76	377.86	12,000.83
01.10.02.02	SUB CEMENTO CORRIDO DE CONCRETO C.H. 1-12 + 30% P.O.	m3	48.92	178.67	8,739.41
01.10.02.03	MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON Fc=210 kg/cm2	m3	71.96	448.11	32,155.23
01.10.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SUBCIMENTO DE ESTRIBOS	m2	58.20	72.84	4,261.88
01.10.02.05	DESMOLDANTE PARA SOLADO DE VIGAS PREFABRICADAS	m2	34.44	11.70	404.87
01.10.03	CONCRETO ARMADO				
01.10.03.01	CONCRETO PREMEZCLADO Fc = 280 kg/cm2, CON CEMENTO TIPO MICH	m3	122.51	589.01	72,188.42
01.10.03.02	CONCRETO Fc=210 kg/cm2, CON CEMENTO TIPO MICH	m3	218.12	557.36	121,974.75
01.10.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (RECTO)	m2	285.06	85.07	24,242.12
01.10.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (CURVO)	m2	18.83	87.83	1,749.80
01.10.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (RECTO)	m2	143.19	85.03	9,481.81
01.10.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LISA (PONDO)	m2	226.13	75.38	15,136.75
01.10.03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA PREFABRICADA (CARAVISTA)	m2	438.67	88.63	36,133.87
01.10.03.08	ACERO tp=420R kg/m2 GRADO 80	kg	81,518.70	4.81	392,140.28
01.10.04	JUNTAS Y SELLOS				
01.10.04.01	JUNTA WATERSTOP, E=7	m	219.32	18.82	4,858.41
01.10.04.02	JUNTA ELASTOMERICA	m	254.52	28.87	8,108.22
01.10.04.03	JUNTA ENTRE LISA Y ESTRUCTURA	m	3.40	22.20	80.21
01.10.05	VARIOS				
01.10.05.01	TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS PREFABRICADAS CON GRUA HIDRAULICA 200 Ton	unb	7.00	2,981.83	18,771.41
01.11	FLUJE				
01.11.01	FLUJE TERRESTRE	pb	1.00	95,187.05	95,187.05

COSTO DIRECTO S/.		5,528,687.58
GASTOS GENERALES S/.	10.90000000%	552,868.76
Gastos fijos	0.2642038%	
Gastos variables	9.7357962%	
UTILIDAD S/.	5.00%	276,434.38
SUB TOTAL S/.		6,357,990.72
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)	18.00%	1,144,438.33
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/.		7,502,429.05


 CONSORCIO DIAMANTE
 Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP 54830

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar A. Rivera Diaz
 REPRESENTANTE COMUN



000236



CONSORCIO DIAMANTE



PROYECTO
**CHAVI
MOCHIC**

FICHA TÉCNICA

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
C.P. 4430

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 01 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Flores Diaz
REPRESENTANTE COMÚN

FICHA TECNICA DE LA OBRA

1 OBRA	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - ÍTEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"		
2 Ubicación : Departamento	LA LIBERTAD		
Distrito	CHAO		
Provincia	VIRU		
Area Geografica según I.N.E.I.	I		
3 CONTRATISTA	CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS		
4 ENTIDAD	PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC		
5 SUPERVISOR	ING. JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO		
6 RESIDENTE	ING. FREDY AUCAHUAQUE QUISPE		
4 Fuente de financiamiento	Recursos Directamente Recaudados		
5 LICITACION PUBLICA	LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024-GRLL-GBJ/PECH - I CONVOCATORIA		
6 Sistema de Contratacion	PRECIOS UNITARIOS		
7 Presupuesto base, con IGV al 18% y fecha	S/. 8,336,032.27	31-Ago-24	
8 Presupuesto base, sin IGV y fecha	S/. 7,064,434.13	31-Ago-24	
9 Contrato de obra			
10 Fecha de Contrato de obra	21-Mar-25		
11 Fecha de Presupuesto	31-Ago-24		
12 Monto del contrato Inc/IGV	S/. 7,502,429.05		
13 Monto del contrato, Sin/IGV	S/. 6,357,990.72		
14 Monto del Presupuesto base	S/. 8,336,032.27		
15 Factor de Relación	0.90		
16 Adicionales de obra, Inc/IGV	S/. -		
17 Deductivos de obra, Inc/IGV	S/. -		
18 Intereses por mora, Inc/IGV	S/. -		
19 Mayores Gastos. Gral. prorr. plazo, Inc/IGV	S/. -		
24 fecha de Entrega del terreno	09-Abr-25		
25 Adelanto en efectivo Inc/IGV y fecha pago	S/. -	0.00%	
26 Adelanto en efectivo Sin/IGV y fecha pago	S/. -		
27 Adelanto P/Materiales Inc/IGV y fecha pago	S/. -		
28 Adelanto P/Materiales Sin/IGV y fecha pago			
29 Inicio oficial del plazo	10-Abr-25		
30 Plazo de Ejecucion de Obra	150		
31 Término original programado de obra	06-Sep-25		
32 Término vigente programado de obra	06-Sep-25		
33 Acta recepción de obra			
34 Valorización N°	01		
35 Fecha de presentación	30-Abr-25		
36 Avance Acumulado Anterior	0.68%		
37 Programado Acumulado Anterior	0.68%		
38 Avance Actual	0.01%		
39 Programado Actual	5.81%		
40 Avance Acumulado Actual	0.01%		
41 Programado Acumulado Actual	6.49%		
44 Condicion de la Obra	ATRASADA		

CONSORCIO DIAMANTE
 Juan Antonio Jimenez Carrasco
 JEFE DE SUPERVISION
 CP 54690

CONSORCIO DIAMANTE
 Ing. Cesar N. Rivera Diaz
 REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO DIAMANTE



RESUMEN DE METRADOS

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54890

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 01 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

CONSORCIO DIAMANTE
20613952714

RUC



RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS

OBRA "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ARTE EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CUI: 2593295 ITEM 01 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

CLIENTE PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

CONTRATISTA CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS

FECHA 31/05/2025

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
01	COMPONENTE OBRAS CIVILES		
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES		
01.01.01.03	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	u/mes	0.52
01.02	SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACION AMBIENTAL, PLAN DE MONITOREO		
01.02.01	SEGURIDAD Y SALUD		
01.02.01.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	glb	0.00
01.02.01.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	0.00
01.02.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	0.00
01.02.01.04	CAPACITACION DE SEGURIDAD	glb	0.00
01.02.02	MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION O CORRECCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES		
01.02.02.04	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	0.00
01.02.02.06	PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL	glb	0.00
01.02.03	MONITOREO ARQUEOLOGICO		
01.02.03.01	MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	0.00
01.03	ESTRUCTURA DE INGRESO DE CONCRETO ARMADO LA RINCONADA KM 28+805		
01.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.03.01.02	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	24.93
01.03.01.10	EXTRACCIÓN, SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA PARA ENROCADOS	m3	0.00

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan Carlos Sánchez
RUC 20613952714

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Celso N. Cerna Diaz
REPRESENTANTE COMUN



000231



CONSORCIO DIAMANTE



SUSTENTO DE METRADOS

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan Carlos Sánchez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54890

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 01 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

01.01.01.03 ALQUILER DE BAÑO QUÍMICO

AL NO PRESENTAR SUSTENTO DE PARTIDA POR PARTE DE LA CONTRATA LA SUPERVISION REALIZO EL ANALISIS DE LA PARTIDA CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

RESUMEN DE METRADO ACTUAL DEL MES DE MAYO

0.52 U/MES

CÁLCULO

DESCRIPCIÓN	SECCIÓN			Nº de días cuantificados (del 01 de mayo al 08 de mayo del 2025)	Nº días en meses	PARCIAL
	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD (Und)			
			Und/meses			
ALQUILER DE BAÑO QUÍMICO	-	-	2.00	8.00	31.00	0.52

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. González Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54650

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Celso N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

000239

01.03.01.02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO

FECHA: 31/05/2025

Descripción	sección				Unidad (m3)
	Ancho (m)	Altura (m)	Longitud (m)	Nº de veces	
Toma La Rinconada					
Estribo izquierdo - Ingreso	Área				
Losa	45.66	0.4			18.264
Uña 1	0.3	1.3	17.1		6.669
TOTAL					24.933

m3

CONSORCIO MANTENIMIENTO
Ing. Juan A. Amador Carrizosa
JEFE DE SUPERVISIÓN
JEFE CM 54850

CONSORCIO DAMIANTE
Ing. Cristóbal N. Riquelme Díaz
REPRESENTANTE CONIUM

000229



000228



CONSORCIO DIAMANTE



PROYECTO
**CHAVI
MOCHIC**

CONTROL TÉCNICO FINANCIERO – VALORIZACIÓN N°02 DE MAYO 2025

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Jhonny Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54080

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar V. Rivera Diaz
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 01 COMPONENTE OBRAS CIVILES"



000220



CONSORCIO DIAMANTE



RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°02 - MAYO 2025

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54050

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 01 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

RESUMEN DE VALORIZACION N°02 - MAYO 2025
VALORIZACION DE OBRA N°02: DEL 01 AL 08 MAYO DEL 2025

OBRA	: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL SISTEMA DE RIEGO CHAYMOCHIC I Y II ETAPA, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRIL, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - ÍTEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"				
ENTIDAD	: PROYECTO ESPECIAL CHAYMOCHIC				
CONTRATISTA	: CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS				
SUPERVISOR	: ING. JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO				
RESIDENTE DE OBRA	: ING. FREDY AUCAHUACUE GUISPE				
PLAZO DE EJECUCION	: 150 D.C.				
FECHA DE PRESUPUESTO V.R.	: 31-Ago-24				
MONTO DE OBRA CONTRATADO CON IGV AL 1	S/.	7,502,429.05	INC/IGV	S/.	6,357,990.72 Sin/IGV
ADELANTO DIRECTO	S/.	0.00	INC/IGV	S/.	- Sin/IGV
ADELANTO DE MATERIALES	S/.	0.00			
FACTOR DE RELACION	No Aplica				
AVANCE ANTERIOR	0.00%				
AVANCE ACTUAL	0.01%				
AVANCE PROGRAMADO	5.81%				
AVANCE ACUMULADO REAL	0.01%				
AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	6.49%				
CONCEPTOS	PRESUPUESTO	VALOR ANTERIOR	VALOR ACTUAL	VALOR ACUM.	SALDO
VALORIZACION CONTRACTUAL (Vc):					
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL SISTEMA DE RIEGO CHAYMOCHIC I Y II ETAPA, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRIL, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - ÍTEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"	6,357,990.72	43,512.30	530.77	44,043.07	6,313,947.65
TOTAL CONTRACTUAL	6,357,990.72	43,512.30	530.77	44,043.07	6,313,947.65
% DE AVANCE REAL DE OBRA A LA FECHA		0.48%	0.01%	0.49%	
% DE AVANCE PROGRAMADO OBRA A LA FECHA		0.48%	5.81%	6.49%	
REAJUSTES (R)					
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL SISTEMA DE RIEGO CHAYMOCHIC I Y II ETAPA, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRIL, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - ÍTEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"		-	-	-	
TOTAL DE REAJUSTE		0.00	0.00	0.00	
VALORIZACION BRUTA	VE = Vc + R	43,512.30	530.77	44,043.07	
AMORTIZACIONES (A)					
RETENCION DE FIE. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	635,799.07	105,966.51	105,966.51	211,933.02	423,866.05
ADENDA N° 01 AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL SISTEMA DE RIEGO CHAYMOCHIC I Y II ETAPA, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRIL, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - ÍTEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES	635,799.07	105,966.51	105,966.51	211,933.02	423,866.05
TOTAL AMORTIZACIONES	635,799.07	105,966.51	105,966.51	211,933.02	423,866.05
DEDUCCIONES (B)					
		-	-	-	
		-	-	-	
TOTAL DEDUCCIONES		-	-	-	-
VALORIZACION NETA	VB = VE - A - B	-	530.77	(147,889.95)	-
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA					
EN EFECTIVO (VN)		43,512.30	530.77	44,043.07	
I.G.V. = VN x 19%	18.00%	7,832.21	95.54	7,927.75	
MONTO TOTAL A FACTURAR		S/.			426.31
RETENCION POR FIE. CUMPLIMIENTO INC. IGV		S/.			125,040.48
MONTO NETO A COBRAR POR EL CONTRATISTA :		(-)			-
SOL: CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 96/100 SOLES					

CONSORCIO DIAMANTE
 Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
 JEFE DE SUPERVISION
 D.P. 54280

CONSORCIO DIAMANTE
 Ing. Cesar N. Rivera Diaz
 REPRESENTANTE CONJUNTO

000218



CONSORCIO DIAMANTE



PROYECTO
**CHAVI
MOCHIC**

CURVA S

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54858

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 01 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMIUN

AVANCE FISICO PROGRAMADO Vs. AVANCE FISICO REAL

CEPR

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC Y II ETAPA, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD – ÍTEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES

CONTRATISTA
SUPERVISOR

ING. JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO

Presup. Contr. sin IGV :
Fecha Ppto V.R.

Fechta Pedro V.R.


No. VAL	PERIODO AL :	PROGRAMADO ACCELERADO DE OBRA				REAL EJECUTADO DE OBRA			
		SOLES (S/60V)		PORCENTAJE		SOLES (S/60V)		PORCENTAJE	
		MESESUAL	ACUMULADO	MESESUAL	ACUMULADO	MESESUAL	ACUMULADO	MESESUAL	ACUMULADO
1	30-Abr-25	43,512.30	43,512.30	0.68%	0.68%	43,512.30	43,512.30	0.68%	0.68%
2	31-May-25	369,696.28	413,208.58	5.81%	6.50%	530.77	530.77	0.01%	0.01%
3	30-Jun-25	404,362.32	907,570.90	7.78%	14.27%				
4	31-Jul-25	1,935,715.67	2,844,286.57	30.40%	44.74%				
5	31-Ago-25	3,118,219.85	5,962,505.42	49.04%	83.78%				
6	06-Sep-25	305,495.30	6,357,990.72	6.22%	100.00%				
TOTAL ES:		6,357,990.72				44,043.07			0.69%

CONCLUSIONES: del cuadro anterior se puede concluir lo siguiente:

La obra se encuentra en un Avance Físico Acumulado Ejecutado del 0.69% lo cual no está dentro del plazo establecido, siendo el avance físico acumulado programado de 6.50%.

Un Avance Mensual Ejecutado es de 0.01%, siendo el programado 5.81%.

La obra se encuentra en estado ATRASADA con respecto al programado en un 5.80 %, para el presente periodo.

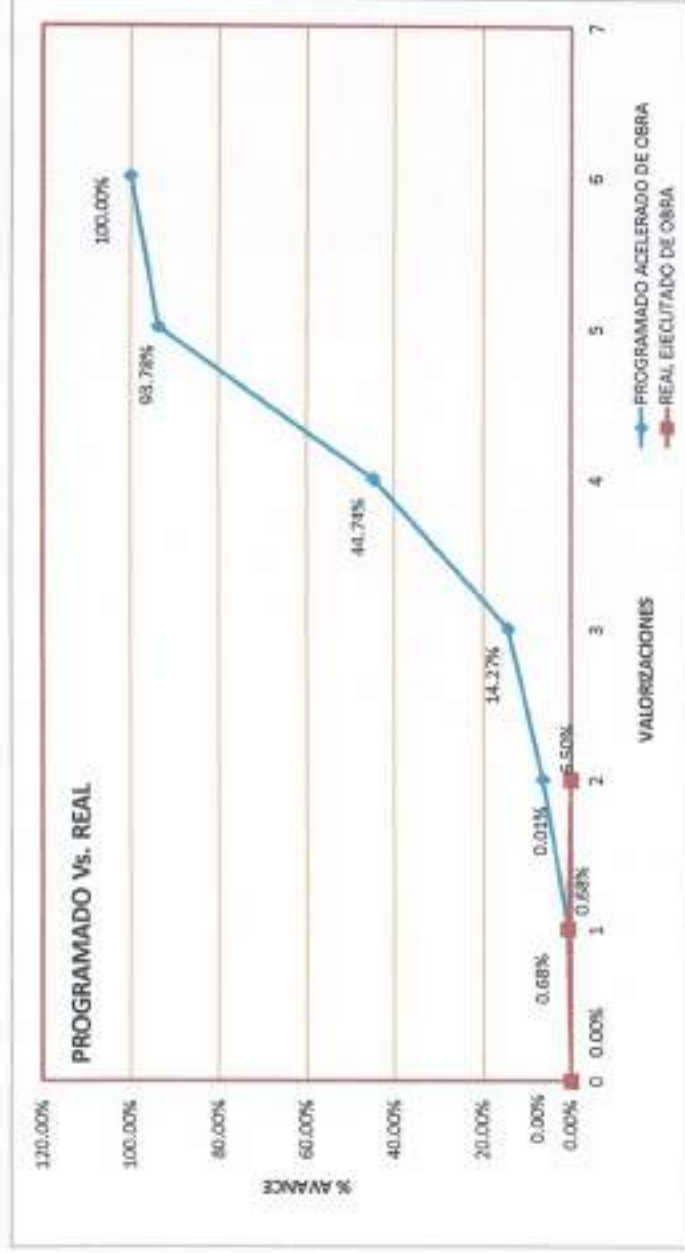

000217

CONSORCIO DIAMANTE

[Handwritten signature]

CONSORCIO DISMANTE

Ing. Cesar X. Rivera Diaz
REPRESENTANTE LEGAL

open to all



000216



CONSORCIO DIAMANTE



PROYECTO
**CHAVI
MOCHIC**

COMPARATIVO PROGRAMADO VS EJECUTADO

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. JUAN LUIS VILLALBA
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54690

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 01 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMÚN

000215

CONSORCIO MANANTE
Ing. Carlos Rivera Diaz
Representante Legal

CONSORCIO MANANTE
Ing. Juan Jimenez Carrasco
Jefe de Supervision
CIP 64090

CUADRO COMPARATIVO DE VALORIZACIONES MENSUALES

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRÚ,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - ÍTEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"

Obra: PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC


Entidad: CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS

Contratista: ING. FREDY AUCAHUAQUE QUISPE

Res. Obra: ING. JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO

Sup. Obra: 31-Ago-24

ESTADO DE LA OBRA : OK
VAL. ACUMULADA : 43,512.30
SALDO POR VAL. : 6,313,947.65

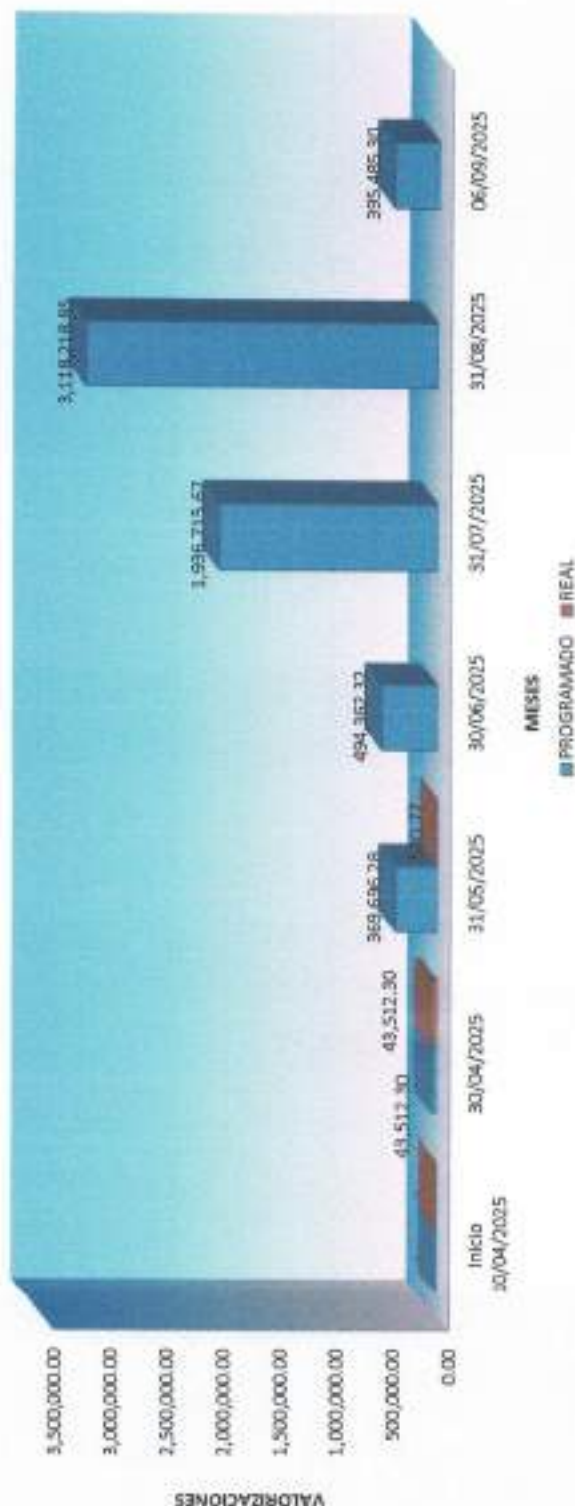

MESES	Inicio 30/04/2025	30/04/2025	31/05/2025	30/06/2025	31/07/2025	31/08/2025	06/09/2025	ACUMULADO
MONTO VAL. PARCIALES SI (Sin IGV)	-	43,512.30	389,896.28	494,362.30	1,936,715.67	3,118,218.85	395,485.30	6,357,990.72
REAL	-	43,512.30	530.77	-	-	-	-	44,043.07

OBRA: "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ARTE EN EL(A) SISTEMA DE REGADO CHAYMOCHE Y B ETAPA DISTRICTO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CUI: 259235 ITEM 03 COMPONENTE OBRAS CIVILES
CLIENTE: PROYECTO ESPECIAL CHAYMOCHE
CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS

ITEM	DESCRIPCION	UNO	METRADO	PRECIO	PARCIAL	AVANCE	PARCIAL	AVANCE	PARCIAL	AVANCE	PARCIAL	AVANCE	PARCIAL	AVANCE	PARCIAL	AVANCE
ITEM	DESCRIPCION	UNO	METRADO	PRECIO	PARCIAL	AVANCE	PARCIAL	AVANCE	PARCIAL	AVANCE	PARCIAL	AVANCE	PARCIAL	AVANCE	PARCIAL	AVANCE
01	COMPONENTE OBRAS CIVILES															
01.01	OBRAS PRELIMINARES Y TRABAJOS PRELIMINARES															
01.01.01	MOVILIZACION Y DESMOLVACION DE TIPO Y MACI BLANDOS	m ³	1.00	100.000.00	100.000.00	4.78%	24.126.32	24.126.32	23.31%	23.326.32	23.326.32	23.31%	23.326.32	23.326.32	2.14%	100.000.00
01.01.02	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE	m ²	700.00	110.00	77.000.00	8.89%	30.670.00	30.670.00	24.50%	30.670.00	30.670.00	24.50%	30.670.00	30.670.00	0.47%	132.000.00
01.01.03	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE	m ²	45.00	740.00	33.300.00	1.88%	5.825.00	5.825.00	24.34%	5.825.00	5.825.00	24.34%	5.825.00	5.825.00	4.31%	24.300.00
01.01.04	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE	m ²	1.00	740.00	740.00	100.00%	740.00	740.00	100.00%	740.00	740.00	100.00%	740.00	740.00	0.00%	740.00
01.01.05	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE	m ²	1.00	42.000.00	42.000.00	20.00%	8.400.00	8.400.00	20.13%	8.400.00	8.400.00	20.13%	8.400.00	8.400.00	4.84%	42.000.00
01.02	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.01	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.02	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.03	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.04	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.05	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.06	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.07	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.08	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.09	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.10	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.11	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.12	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.13	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.14	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.15	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.16	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.17	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.18	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.19	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.20	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.21	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.22	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.23	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.24	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.25	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.26	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.27	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.28	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.29	TRABAJO PRELIMINAR															
01.02.30	TRABAJO PRELIMINAR															
01.03	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.02	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.03	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.04	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.05	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.06	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.07	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.08	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.09	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.10	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.11	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.12	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.13	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.14	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.15	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.16	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.17	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.18	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.19	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.20	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.21	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.22	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.23	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.24	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.25	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.26	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.27	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.28	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.29	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.03.30	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.02	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.03	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.04	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.05	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.06	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.07	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.08	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.09	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.10	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.11	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.12	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.13	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.14	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.15	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.16	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.17	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.18	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.19	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.20	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.21	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.22	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.23	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.24	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.25	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.26	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.27	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.28	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.29	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															
01.04.30	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALBERGUE															

CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS
Ing. Cesar A. Novillo Diaz
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS
Ing. Cesar A. Novillo Diaz
REPRESENTANTE LEGAL

.....

1994

1999

Received 20 October 2004; accepted 12 November 2004

[illegible]

CONSORCIO DIAMANTE

11

Prof. Cesare N. Pizzi

© 2000 by The McGraw-Hill Companies

References

... ..

RESEARCH SPECIAL: QUALITATIVE

STUDIES IN ECONOMIC DEVELOPMENT

CONTRATO: CONCORDIO ELEVACION DE OBRA													
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO \$.	PARCIAL \$.	AVANCE [%]	PARCIAL \$.	AVANCE [%]	PARCIAL \$.	AVANCE [%]	PARCIAL \$.	AVANCE [%]	PARCIAL \$.
VERBOS													
10.000	TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS PREFABRICADAS CON UNDA HORMIGONADA 200 TON	m3	3.00	2,881.00	8,771.40	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	8,771.40
10.010	RETE	m2	1.00	90,187.20	90,187.20	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	90,187.20
10.110	RETE TUBERIA	m2				0.00%	33,475.83	24.89%	33,475.83	24.89%	23,054.39	17.69%	56,530.22
	COSTO DIRECTO \$.			37,056.26			33,475.83		42,999.03		1,084,100.18		5,200,087.58
	GASTOS ADMINISTRATIVOS \$.			6,783.68					348,410.06				552,868.76
	Reserva 10%												
	Gastos variables						19,271.75		21,406.01		84,285.03		
	UTILIDAD \$.												
									</				

CONSORCIO DIAMANTINO
Juan A. Méndez Carrillo
Jefe de SUBDIVISION
Caj. 54830

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE SOCIOS

000209

INFORME DEL ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Tinjoray Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54950

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



Urb. La Mercedes Mz B Lote 7, Piura - Piura - Piura



edwin2004df@hotmail.com



974 662 575

000207

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N°003-2025-ING.E.A.C.N/ESP CYP

A : Juan Antonio Jiménez Carrasco
Jefe de Supervisión de Obra

DE : Ing. Edwin Aldair Cerda Neira CIP N°233414
Especialista en Costos y Presupuestos y programación y valorizaciones.

ASUNTO : Informe Mensual de Especialidad de Obras Costos y Presupuestos

REFERENCIA : Obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 01 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

FECHA : Chao - Virú - La Libertad, 31 de Mayo del 2025

Por intermedio del presente me dirijo a usted, a fin de hacer llegar el **INFORME N°003-2025-ING.E.A.C.N/ESP CYP**, Realizado en la obra de la referencia durante el periodo del 01 de mayo del 2025 al 31 de mayo 2025, dichas actividades fueron realizadas durante la ejecución de los trabajos de Obras Provisionales (Construcciones provisionales) y Estructura de ingreso de concreto armado la rinconada km28+905 (Movimiento de tierras)01.03.01.03 Excavación para estructuras en material suelto conforme se puede apreciar en las tomas fotográficas adjunta al presente,

Es cuanto informo a usted, para los fines convenientes,

Atentamente.

I. GENERALIDADES

DATOS GENERALES - GA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C .

1.0. DEL CONTRATISTA

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 01 COMPONENTE OBRAS CIVILES "

UBICACIÓN : Distrito: Chao, Provincia: Virú, Departamento La Libertad

a) DATOS GENERALES CONTRATISTA Y ENTIDAD

Licitación Pública : Licitación Pública N° 001-2024-GRLL-
GOB/PECH I CONVOCATORIA

Modalidad : A PRECIOS UNITARIOS

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Edwin A. Cerda Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP. 233414

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN



Urb. La Mercedes Mz B Lote 7, Piura - Piura - Piura



edwin2004dj@hotmail.com



974 662 575

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 34880

Entidad Contratante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD -
Proyecto Especial Chavimochic
Contratista : CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS
Representante Común : DICK ROD LLARO HUERTA
DNI N° 40133490
Residente de Obra : ING. FREDY AUCAHUAQUE QUISPE
CIP N° 71854
Coordinador de Obra : ING. KEVIN WILSON VALDERRAMA BRIONES
Expediente técnico : (Aprob. Act. Expediente Técnico con Res.
de N° 000003-2024-GRLL-PECH-SGO)
Monto del contrato de Obra, con IGV : S/ 7'502,429.05
Fecha de Firma de Contrato de obra : CONTRATO SGO 06-2025 PROYECTO
ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Presupuesto Base : 21-Marzo-2025
Monto del contrato, sin IGV : S/. 8,336,958.58 Fecha Pres. Base agosto
2024
Plazo de ejecución según Bases Lic. : S/. 6,357,990,72
Fecha de Firma de Contrato de obra : 150 d.c.
Entrega de terreno : 21-Marzo-2025
Inicio oficial de plazo : 9-Abril-2025
Término vigente contractual : 10-Setiembre-25
06-Setiembre-25

b) DATOS GENERALES CONSULTORIA DE OBRA

Adjudicación Simplificada : Adjudicación Simplificada N°002-2025-
GRLL-DOB/PECH I CONVOCATORIA
Modalidad : A TARIFAS DIARIAS (EJECUCIÓN) - SUMA
ALZADA (LIQUIDACIÓN)
Monto del contrato de Obra, C/IGV : S/ 408,415.22
CONTRATO SGO 07-2025 PROYECTO
ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Declaración de Retención 10% : S/ 40,841.50 (24.05.2025)
Fecha de Firma de Contrato de obra : 02-Abril-2025
Plazo de ejecución según Bases Lic. : 150 D.C.
Inicio oficial de plazo : 10-Abril-2025
Termino vigente contractual : 06-Setiembre-2025
Supervisor : CONSORCIO IAMANTE
Representante Común : ING. CESAR NESTOR RIVERA DIAZ -
Jefe de Supervisor de Obra : ING. JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRAZCO
CIP N° 54850

Ingeniero Especialista en costos y presupuestos y programación y valorización : ING. EDWIN ALDAIR CERDA NEIRA
CIP N° 233414

Urb. La Mercedes Mz B Lote 7, Piura - Piura - Piura
edwin2004d1@hotmail.com
974 662 575

CONSORCIO IAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54850

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Edwin Aldair Cerda Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP. 233414

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

II. METAS ESPECIFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE:

- ✓ Construcción de estructura de ingreso: La Rinconada.
- ✓ Construcción de Canoa 01: Los Colorados.
- ✓ Construcción de Canoa 02: Rio Seco - Toma Laredo.
- ✓ Construcción de Canoa 03: Yugoslavia 01.
- ✓ Construcción de Canoa 04: Yugoslavia 02.
- ✓ Construcción de Canoa 05: Las Lomas 01.
- ✓ Construcción de Canoa 06: Las Lomas 02.
- ✓ Construcción de Canoa 07: Las Lomas 03.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Edwin A. Cerda Neira
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 233414

III. ANTECEDENTES:

-De las funciones del Especialista en Costos y Presupuestos:

- ✓ Debe de controlar la programación de la obra y avances de ejecución de la misma, así como también las obligaciones legales y contractuales de la entidad.
- ✓ Debe controlar que la obra se ejecute dentro del plazo establecido, con la calidad requerida de acuerdo a los documentos técnicos de la obra, realizando las coordinaciones con la Sub Gerencia de Obras del PECH.
- ✓ Elaborar e implementar plan de trabajo.
- ✓ Utilizar herramientas digitales para el logro de sus actividades.
- ✓ Realizar el seguimiento y control de las actividades.
- ✓ Dar conformidad a los trabajos.
- ✓ Tener el riesgo de todas las actividades diarias.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Edwin A. Cerda Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP 233414

a) Consideraciones Generales

- ❖ El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo Control de Calidad de las actividades y trabajos del Contratista relacionados con la ejecución de las obras y acorde el Expediente Técnico aprobados.
- ❖ Es obligación del Supervisor cuidar que las muestras se tomen y se ensayen conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas de los Expedientes Técnicos aprobados y en cumplimiento de la normatividad.
- ❖ Las muestras deben tomarse de tal manera que sean las más representativas de la cantera o apilamiento, y el muestreo deberá ser ejecutado por personal técnico calificado, verificándose que el procedimiento empleado en el muestreo este de acuerdo con el tipo de ensayo a realizar.
- ❖ El Supervisor será el responsable de obtener la cantidad de muestras representativas de los materiales a analizar, a fin de que la información obtenida en el laboratorio permita preparar la información estadística necesaria para la toma de decisiones adecuadas, y no resultados dudosos o perjudiciales para el desarrollo de los trabajos.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Ortiz
REPRESENTANTE COMUN





- ❖ La frecuencia de los controles estará determinada por el volumen de los materiales que se empleará en la ejecución de cada una de las actividades y trabajos que conforman las obras, y la magnitud que estos presentan.
- ❖ El Supervisor tendrá en cuenta en la ejecución de las obras, los volúmenes de materiales y cantidades de trabajo a ejecutar, deben estar en el orden de magnitud de los correspondientes a las Obras, por lo tanto, se dejará al mejor criterio técnico del Supervisor, determinar la frecuencia adecuada de los controles, siempre en cumplimiento de las normas técnica vigentes. En todo caso, el Supervisor deberá tener siempre presente que la calidad de cada una de los trabajos ejecutados debe ser garantizada mediante controles a los materiales, procedimientos constructivos y productos terminados.
- ❖ El Supervisor exigirá al Contratista la presentación sistemática de los certificados que acrediten que los materiales que ingresen a las obras, cumplan con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas. Sin embargo, deberá tomar de manera aleatoria las muestras necesarias para efectuar los ensayos correspondientes de verificación.
- ❖ El Supervisor efectuará e interpretará los ensayos de laboratorio en forma oportuna para poder tomar las medidas correctivas en caso no se cumpla con las especificaciones técnicas.
- ❖ El Informe Final de Control de Calidad también incluirá la presentación de CDs conteniendo la información señalada en el punto anterior y adicionalmente toda la información de los ensayos y certificados que constituyen el respaldo de los resultados estadísticos y cuadros resumen en archivos pdf, y organizada manteniendo la codificación utilizada en los informes mensuales.


Juan Guillermo Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 84434

b) Procedimiento de Control

- ❖ Las siguientes pautas, procedimientos, ensayos y controles agrupados por rubros, sin ser limitativos, constituirán una referencia obligada para la implementación del Control de Calidad de las obras. El Supervisor ajustará estas pautas, procedimientos, ensayos y controles a las exigencias de control de calidad geométrico de control de calidad tecnológico que plantea el Expediente Técnico.
- ❖ El Supervisor ajustará estas pautas, procedimientos, ensayos y controles a las exigencias de control de calidad geométrico de control de calidad tecnológico que plantea el Expediente Técnico.
- ❖ Sin embargo, esto no lo facultará a disminuir las exigencias mínimas que aquí se plantean, y en todo caso sus aportes deberán tener como objetivo contribuirá la implementación de mejoras.


CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Edwin A. Cerda Neira
INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP. 233414


CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



TOPOGRAFÍA

- ❖ Verificación de los puntos de control topográfico efectuados por el Contratista en general. Verificación del replanteo, estacado y monumentación de BMs efectuados por el Contratista.
- ❖ Verificación de volúmenes de las canteras para determinar su potencia.
- ❖ Verificación del replanteo de los levantamientos topográficos en canteras y áreas destinadas a botaderos para la determinación de volúmenes de materiales en cancha, o para determinar volúmenes de materiales eliminados.

CONTROL

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor realizará los siguientes controles principales:

- ❖ Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos para la ejecución de los trabajos.
- ❖ Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el contratista.
- ❖ Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos constructivos adoptados por el contratista.
- ❖ Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.
- ❖ Verificar el alineamiento, perfil y sección de las áreas excavadas.
- ❖ Comprobar la compactación de las áreas donde se hayan ejecutado remociones, excavaciones y cortes.

CONSORCIO DIAMANTE
Ejecutados

ACCESOS: CONFORMACIÓN DE LOS RELLENOS

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor realizará los siguientes controles principales:

- ✓ Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el contratista.
- ✓ Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajos aceptados.
- ✓ Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajos.
- ✓ Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento del tránsito.
- ✓ Comprobar que los materiales por emplear cumplan con los requisitos de calidad.
- ✓ Verificar la compactación de todas las capas de suelos que forman parte de la actividad especificada.
- ✓ Realizar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar la uniformidad de la superficie.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Edwin A. Cerdeña Nelli
ESPECIALISTA EN CONTOS Y PRESUPUESTOS
C.R. 233414

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

IV. ANALISIS :

Durante la ejecución de los trabajos se verificaron las siguientes partidas:

a. OBRAS PROVISIONALES

▫ Se verifico la colocación del alquiler del baño químico en YUGOSLAVIA y RINCONADA.

b. ESTRUCTURA DE INGRESO DE CONCRETO ARMADO LA RINCONADA KM 28+905

▫ Excavación para estructuras en material suelto.

Partidas ejecutadas en el mes de mayo 2025:

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
01	COMPONENTE OBRAS CIVILES		
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES		
01.01.01.03	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	u/mes	0.52
01.03	ESTRUCTURA DE INGRESO DE CONCRETO ARMADO LA RINCONADA KM 28+905		
01.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.03.01.02	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	24.93

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- ❖ Se ha verificado los avances ejecutados de acuerdo a la programación de obra en la valorización del presente mes mayo 2025.
- ❖ Se ha verificado que la obra no se viene ejecutando dentro de los plazos establecidos.
- ❖ Se recomienda la entidad actuar de acuerdo a la ley de contrataciones articulo 204 intervención económica de la obra.

Es cuanto Informo a usted, para los fines convenientes.

Atentamente,

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Edwin A. Cerda Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP. 233414

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54880

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar R. Rivero Diaz
REPRESENTANTE COMUN

VI. PANEL FOTOGRAFICO



SUPERVISIÓN DE LA PARTIDA EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN SECTOR RINCONADA
Se Observa el corte de unña 1

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Edwin A. Cerda Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP 233414

Imagen n.º 01



Se verificó la realización de la partida de movimiento de tierras en Yugoslavia.

Imagen n.º 02



Se supervisó la aprobación de la partida de la excavación y se verificó con la arqueóloga que no se encontraron restos arqueológicos en Yugoslavia.

Imagen n.º 03



Se supervisó en Yugoslavia la señalización en campo.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



Urb. La Mercedes Mz B Lote 7, Piura - Piura - Piura
edwin2004df@hotmail.com
974 662 575

Imagen n.º 04



Se supervisó la señalización de campo en el sector de la Rinconada

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Edwin A. Cerda Neira
REPRESENTANTE COMÚN
CIP Nº 233414

Imagen n.º 05



La supervisión y el contratista definiendo procesos constructivos en el Sector Rinconada.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN

Imagen n.º 06



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Edwin A. Cerda Neira
SPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP N° 233414

Se verifico la excavación para loza de estructura de ingreso en el Sector de Rinconada.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Edwin A. Cerda Neira
SPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP N° 233414

Imagen n.º 07



5/05/25, 14:33 a.m.
79.403.9579200 +5.41m
Altitud: 199.0meter
Velocidad: 2.3km/h

Inspección de trabajos por parte del Proyecto especial de CHAVIMOCHIC en Sector de Yugoslavia.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar H. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Imagen n.º 08



Se verificó los equipos procedentes para la compactación de la partida Relleno con Material procedente de corte para la conformación del dique en el sector de Rinconada.

Imagen n.º 09



Se verificó el uso los materiales para el encofrado en el sector la Rinconada.

Imagen n.º 10



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
Jefe de Supervision
CIP 54830

Se supervisó junto con el especialista ambiental cumpliendo el PMA en Yugoslavia.

Imagen n.º 11



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Edwin A. Cerda Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP. 233414

Inspección de la Contraloría y la Entidad en el sector la Rinconada.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Imagen n.º 12



Se definió los procesos constructivos y se verificó el avance real con la Controlaría y la Entidad en el sector la Rinconada.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Edwin A. Cerda Neira
Especialista en Costos y Presupuestos
CIP Nº 233414

Imagen n.º 13



Participación de la supervisión en la charla Diarias en Yugoslavia.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Edwin A. Cerda Neira
Especialista en Costos y Presupuestos
CIP Nº 233414

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Dias
REPRESENTANTE COMÚN

Imagen n.º 14



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Edwin A. Cerda Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP N° 233414

Se verificó la partida el trazo y replanteo en Yugoslavia II.

Imagen n.º 15



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Edwin A. Cerda Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP N° 233414

Se vació el solado que no está considerado con la aprobación por parte de la Supervisión en el sector Yugoslavia II.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



Imagen n.º 16



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 17



No se registraron actividades por parte del contratista.



Imagen n.º 18



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 19



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN

Imagen n.º 20



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Domínguez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 34830

No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 21



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Edwin A. Cerde Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP 23344

No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar R. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Imagen n.º 22



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 34830

No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 23



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Edwin A. Cerda Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP. 233414

No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar R. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Imagen n.º 24



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Edwin A. Cerda Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP. 233414

No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 25



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Edwin A. Cerda Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP. 233414

No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



Imagen n.º 26



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 27



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Edwin A. Cerda Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP. 233414

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN



Imagen n.º 28



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 29



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar M. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN

Imagen n.º 30



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 31



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Imagen n.º 32



CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Edwin A. Cerda Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP. 233414

No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 33



CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Juarez Carrasco
CIP. 241104

No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Imagen n.º 34



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 35



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar M. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Imagen n.º 36



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 37



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Edwin A. Cerda Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP. 233414

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar H. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Imagen n.º 38



No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 39



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar M. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Imagen n.º 40




23/05/25, 10:23 a. m.
17L 731576 9089085 ±4.75m
Altitud: 190.6 meter
Velocidad: 0.3km/h

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Romero Carrasco
JE II DE SUPERVISIÓN
CIP 54050

No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 41

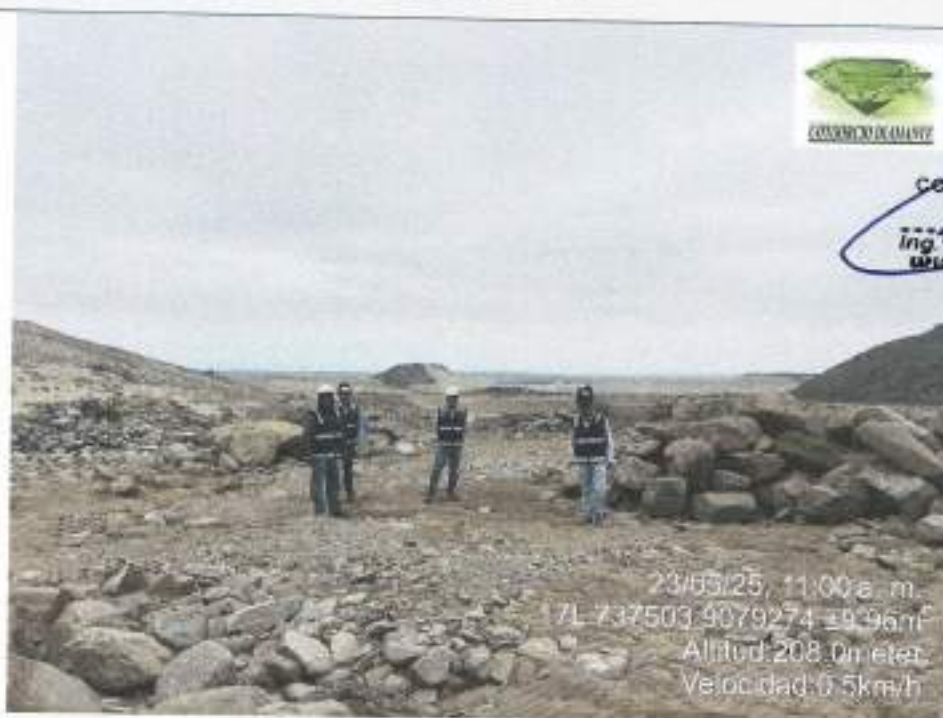

23/05/25, 11:00 a. m.
17L 737503 9079274 ±9.96m
Altitud: 208.0 meter
Velocidad: 0.5km/h

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Edwin A. Cerda Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP 233414

No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar H. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Imagen n.º 42



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 94854

No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 43



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Edwin A. Cerda Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP 233414

No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



Imagen n.º 44



CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Edwin A. Cerda Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP 233414

No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 45



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
SUPERVISOR
CIP 54210

No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN



Imagen n.º 46




CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Edwin A. Cerda Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP. 233414

No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 47

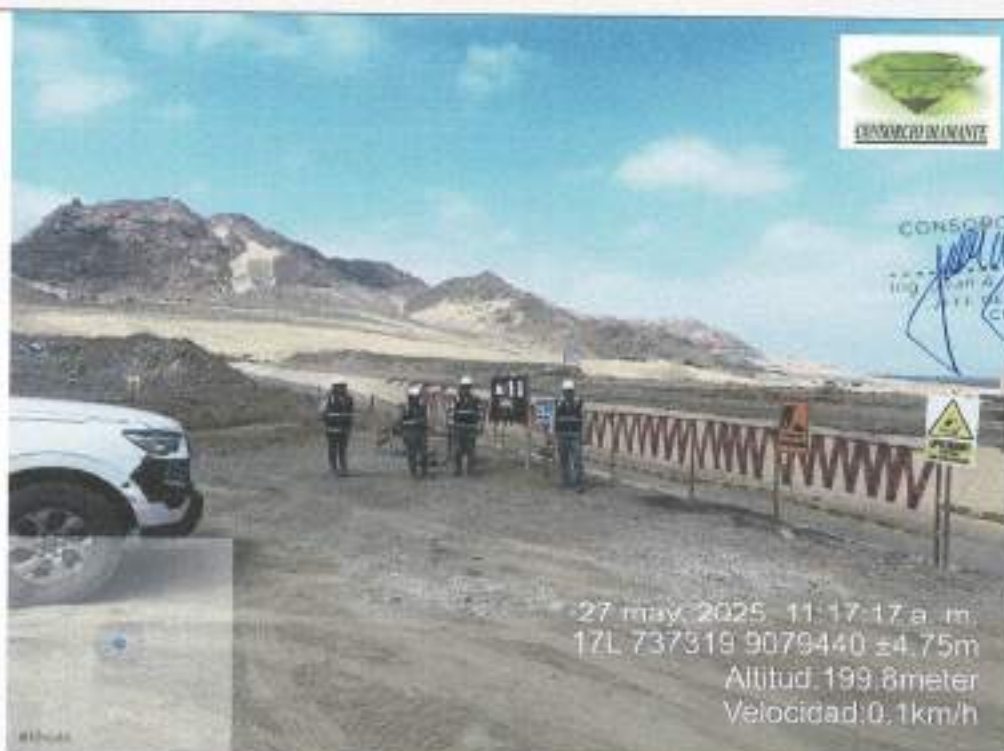

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Imagen n.º 48



CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Edwin A. Cerda Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP. 233614

28 may. 2025, 11:24:51 a. m.
78° 37' 18.9078422 ± 14.00 m
Altitud: 1963 msnm
Velocidad: 0.5 km/h

No se registraron actividades por parte del contratista.

Imagen n.º 49



CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
CIP. 54956

28 may. 2025, 11:20:17 a. m.
78° 37' 18.9078422 ± 14.00 m
Altitud: 1963 msnm
Velocidad: 0.5 km/h

No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Imagen n.º 50



No se registraron actividades por parte del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Edwin A. Cerda Neira
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP. 233414

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Sánchez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 34634

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN





ING. JOE D'CONING YEPEZ CRUZADO
CIP N° 255858

ESPECIALISTA DE CALIDAD

000175

INFORME DEL ESPECIALISTA DE CALIDAD

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54850

DOMICILIO LEGAL COMÚN: CA. PEDRO URRACA 334 - DPTO. 401 - URB. SAN ANDRÉS - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD.
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodiamante100@gmail.com

CELULAR: +51 948444568

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar H. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN



"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Trujillo, 02 de junio del 2025

INFORME N°009-2025-ING.JDYC/CD

A : Ing. Juan Antonio Jiménez Carrasco
Jefe de Supervisión

DE : Ing. Joe D'Coning Yépez Cruzado
Ing. Especialista de Calidad

ASUNTO : INFORME MENSUAL DE CALIDAD - VALORIZACIÓN N.º 02.

REFERENCIA : Supervisión "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE: EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ÍTEM 1 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo entregarle el INFORME MENSUAL DE CALIDAD correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo para la valorización N.º 02, de la obra en referencia y en cumplimiento de las funciones designadas.

Sin otro asunto más que tratar, quedamos a la espera de su atención.

Atentamente.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Joe Yépez Cruzado
ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Carr
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 34030

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE LEGAL



ING. JOE D'CONING YEPEZ CRUZADO
CIP N° 255858

000173
ESPECIALISTA DE CALIDAD

INFORME MENSUAL DE CALIDAD

VALORIZACIÓN N° 02



PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE: EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295, ÍTEM 1, COMPONENTE OBRAS CIVILES"

DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
PROVINCIA : VIRU
DISTRITO : CHAO

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN

JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA: JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO

REPRESENTANTE COMÚN : CESAR NESTOR RIVERA DIAZ

ESPECIALISTA DE CALIDAD : JOE D'CONING YEPEZ CRUZADO

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA
CIP 34851

DOMICILIO LEGAL COMÚN: CA. PEDRO URRACA 334 - DPTO. 401 - URB. SAN ANDRÉS - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD.
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodiamante100@gmail.com CELULAR: +51 948444568

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Joe D'Coning Yopez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP 255858



I. DATOS GENERALES

OBRA	:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ÍTEM 01 COMPONENTE OBRAS CIVILES "
UBICACIÓN	:	Distrito: Chao, Provincia: Virú, Departamento La Libertad
DATOS GENERALES CONTRATISTA Y ENTIDAD		
Licitación Pública	:	Licitación Pública N° 001-2024-GRLL- GOB/PECH I CONVOCATORIA
Modalidad	:	A PRECIOS UNITARIOS
Entidad Contratante	:	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Contratista	:	CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS
Representante Común	:	DICK ROD LLARO HUERTA DNI N.º 40133490
Residente de Obra	:	ING. FREDY AUCAHUAQUE QUISPE CIP N°71854
Coordinador de Obra	:	ING. KEVIN WILSON VALDERRAMA BRIONES
Monto del contrato de Obra, con IGV	:	S/7'502,429.05 CONTRATO SGO 06-2025 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Fecha de Firma de Contrato de obra	:	21-marzo-2025
Presupuesto Obras de arte	:	S/. 8,336,958.58 Fecha Pres. Base agosto 2024
Monto del contrato, sin IGV	:	S/. 6,357,990.72
Plazo de ejecución según Bases Lic.	:	150 d.C
Fecha de Firma de Contrato de obra	:	21-marzo-2025
Entrega de terreno	:	9-abril-2025
Inicio oficial de plazo	:	10-abril-25
Término vigente contractual	:	06-Setiembre-25
DATOS GENERALES CONSULTORÍA DE OBRA		

DOMICILIO LEGAL COMÚN: CA. PEDRO URRACA 334 – DPTO. 401 – URB. SAN ANDRES - TRUJILLO – TRUJILLO – LA LIBERTAD.
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodiamante100@gmail.com

CELULAR: +51 948444568

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Joe D'Coning Yepez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Jimenez Diaz
REPRESENTANTE LEGAL



Adjudicación Simplificada	:	Adjudicación Simplificada N°002-2025-GRLL-GOB/PECH I CONVOCATORIA
Modalidad	:	A TARIFAS DIARIAS (EJECUCIÓN) - SUMA ALZADA (LIQUIDACIÓN)
Monto del contrato de Obra, C/IGV	:	S/408,415.22 CONTRATO SGO 07-2025 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Declaración de Retención 10%	:	S/40,841.50 (24.05.2025)
Fecha de Firma de Contrato de obra	:	02-abril-2025
Plazo de ejecución según Bases Lic.	:	150 d.C.
Inicio oficial de plazo	:	10-abril-2025
Termino vigente contractual	:	06-Setiembre-2025
Representante Común	:	ING. CESAR NESTOR RIVERA DIAZ CIP N.º 40689
Jefe de Supervisor de Obra	:	ING. JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRAZCO CIP N.º 54850
Ingeniero Especialista de Calidad	:	ING. JOE D'CONING YEPEZ CRUZADO CIP N.º 255858

II. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento del Plan de Calidad y la normativa aplicable (ISO 9001:2015, RNE, NTP, ASTM) durante el periodo reportado.

III. ALCANCE

El presente informe Mensual comprende los registros, verificaciones y análisis necesarios, así como los detalles técnicos correspondientes durante el periodo del 01 al 31 de mayo, para garantizar que las obras civiles del Sistema de Riego CHAVIMOCHIC I y II ejecutadas, garanticen la futura operatividad hidráulica del proyecto con el nivel de servicio previsto y restablezcan durante el periodo evaluado las condiciones constructivas exigidas por la Entidad, conforme a la normativa vigente y al Plan de Calidad del proyecto.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Joe D'Coning Yopez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP N° 255858

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
Jefe de Supervisor de Obra
CIP N° 54850

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



IV. UBICACIÓN

El Componente Obras Civiles del proyecto a nivel de IOARR denominado: "Construcción de obras de arte en el (la) sistema de riego Chavimochic I y II etapa, distrito de Chao, provincia de Virú, departamento de La Libertad" se ejecutará en las quebradas La Rinconada, Los Colorados, Torra Laredo-Río Seco, Yugoslavia y Las Lomas, conformadas por las cuencas y subcuencas de afluentes que intersecan al canal madre Chavimochic.

UBICACIÓN POLÍTICA

El ámbito del estudio del proyecto, políticamente se ubica:

- Departamento: La Libertad
- Provincia: Trujillo-Virú
- Distrito: Salaverry-Virú

Figura N 01: Ubicación Política del área de estudio



Fuente: Google Maps



V. METAS

Las partidas programadas para el periodo valorizado son las siguientes:

TABLA 1: PARTIDAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO.

ITEM	DESCRIPCION	UND	AVANCE (%)
01	COMPONENTE OBRAS CIVILES		
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES		
01.01.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS	glb	23.90%
01.01.01.02	CAMPAMENTO PROVISIONAL	m2	24.55%
01.01.01.03	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	u/mes	24.38%
01.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	glb	13.42%
01.02	SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACION AMBIENTAL, PLAN DE MONITOREO		
01.02.01	SEGURIDAD Y SALUD		
01.02.01.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN ELTRABAJO	glb	20.67%
01.02.01.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	20.67%
01.02.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	20.67%
01.02.01.04	CAPACITACION DE SEGURIDAD	glb	20.67%
01.02.01.05	RECURSOS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION	glb	24.03%
01.02.02	MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION O CORRECCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES		
01.02.02.01	MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DEL SUELO	glb	24.03%
01.02.02.02	MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DEL AGUA	glb	24.03%
01.02.02.03	MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DEL AIRE Y EL RUIDO	glb	24.03%
01.02.02.04	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	24.03%
01.02.02.05	PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL	glb	24.03%
01.02.02.06	PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL	glb	20.67%
01.02.03	MONITOREO ARQUEOLOGICO		
01.02.03.01	MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	39.50%
01.03	ESTRUCTURA DE INGRESO DE CONCRETO ARMADO LA RINCONADA KM 28+905		
01.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.03.01.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO SIMPLE EN CANAL MADRE CON DISCO e=0.10 m	m	100.00%
01.03.01.02	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	100.00%
01.03.01.03	EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	100.00%



01.03.01.05	CORTE, PERFILADO Y REFINE DE TALUD	m2	44.44%
01.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE PARA CONFORMACION DE DIQUE	m3	100.00%
01.03.02	CONCRETO SIMPLE		
01.03.02.01	CONCRETO SIMPLE $f_c=100$ kg/cm ² , E=0.10m (SOLADOS)	m3	100.00%
01.03.02.02	MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON $f_c=210$ kg/cm ²	m3	0.00%
01.03.03	CONCRETO ARMADO		
01.03.03.05	ACERO $f_y=4200$ kg/cm ² GRADO 60	kg	90.91%
01.04	CANOA DE CONCRETO ARMADO LOS COLORADOS KM 25+314		
01.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.04.01.02	EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	55.56%
01.04.01.06	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE PARA CONFORMACION DE DIQUE	m3	5.88%
01.06	CANOA DE CONCRETO ARMADO YUGOSLAVIA KM 14+699		
01.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.06.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	100.00%
01.06.01.02	EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	82.24%
01.06.01.04	CORTE, PERFILADO Y REFINE DE TALUD	m2	57.69%
01.06.01.05	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE PARA CONFORMACION DE DIQUE	m3	100.00%
01.06.01.08	PLATAFORMA PARA FABRICACION DE VIGAS	m2	46.67%
01.06.01.09	EXTRACCION, SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA PARA ENROCADOS	m3	49.89%
01.06.01.10	TRANSPORTE DE ROCA PARA ENROCADOS D=0.5km (PROMEDIO)	m3	90.00%
01.06.01.11	ACOMODO DE ENROCADO	m3	23.33%
01.06.01.12	AFIRMADO e=0.20m	m3	85.71%
01.06.02	CONCRETO SIMPLE		
01.06.02.02	SUB CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO C/H 1:12 + 30% P.G.	m3	10.71%
01.06.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SUBCIMIENTO DE ESTRIBOS	m2	72.00%
01.07	CANOA DE CONCRETO ARMADO YUGOSLAVIA KM 14+510		
01.07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.07.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	100.00%
01.07.01.02	EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO	m3	100.00%
01.07.01.05	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE PARA CONFORMACION DE DIQUE	m3	18.52%
01.07.01.13	AFIRMADO e=0.20m	m3	50.00%
01.07.01.14	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE	m3	100.00%
01.07.02	CONCRETO SIMPLE		
01.07.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SUBCIMIENTO DE ESTRIBOS	m2	20.00%
01.11	FLETE		
01.11.01	FLETE TERRESTRE	glb	24.80%

FUENTE: Cronograma Acelerado de obra.



Las partidas antes mencionadas corresponden al CRONOGRAMA ACELERADO DE AVANCE DE OBRA para el mes de mayo.

VI. REVISIÓN EFECTUAL AL PROYECTO DE PARTIDAS EJECUTADAS

Las partidas ejecutadas durante el periodo valorizado son las siguientes:

TABLA 2: PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

ITEM	DESCRIPCION	UND
01	COMPONENTE OBRAS CIVILES	
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	
01.01.01.03	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	u/mes
01.03	ESTRUCTURA DE INGRESO DE CONCRETO ARMADO LA RINCONADA KM 28+905	
01.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	
01.03.01.02	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3

FUENTE: Valorización de Obra N°02.

Las partidas antes mencionadas corresponden al AVANCE DE OBRA EJECUTADO del 01 al 31 de mayo.

6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS LA RINCONADA Km 28+905.

En el presente periodo, se logró ejecutar una partida correspondiente a trabajos de movimiento de tierras, específicamente; Excavación para estructuras en material suelto ANÁLISIS de personal y maquinaria.

El personal y maquinaria empleados por el contratista según su valorización es el siguiente.

Tabla 3: PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

N°	PERSONAL CLAVE	CANTIDAD
01	RESIDENTE DE OBRA	01
02	INGENIERO DE PRODUCCIÓN	04
03	INGENIERO DE CONTROL Y CALIDAD	02
04	ESPECIALISTA AMBIENTAL	01
05	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	01
06	ESPECIALISTA EN COSTOS METRADOS Y PRESUPUESTOS, PROGRAMACIÓN Y VALORIZACIONES	01

DOMICILIO LEGAL COMÚN: CA. PEDRO URRACA 334 - DPTO. 401 - URB. SAN ANDRÉS - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD.
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodiamante100@gmail.com

CELULAR: +51 948444568

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Joe Ypez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Rivera Díaz
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar E. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMÚN



07	ARQUEÓLOGO	01
----	------------	----

FUENTE: Valorización de Obra N°02.

Tabla 4: EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADO EN EL MES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
01	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA - 115 HP	2
02	ESTACIÓN TOTAL	1

FUENTE: Valorización de Obra N°02.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se evaluó el estado de las máquinas, equipos in situ, además se revisó los documentos que garanticen su operatividad.
- Se empleó protocolo de calidad para la actividad de movimiento de tierras ejecutada.
- Se han identificado áreas que requieren atención, principalmente en la gestión de materiales y maquinaria; la eficiencia en la coordinación entre las diferentes fases es imprescindible para lograr una ejecución adecuada de los trabajos.
- Se solicita presentar la documentación necesaria respecto a los equipo y maquinaria ubicados en obra respecto a su fecha de ingreso.
- Se recomienda seguir los procesos constructivos de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- Se verifico trabajos del 01 al 08 de mayo del 2025, del 09 al 31 no se presencio actividades en obra debido a la ausencia del personal clave del contratista

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Joe Yopez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54890

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN



ING. JOE D'CONING YEPEZ CRUZADO
CIP N° 255858

000165
ESPECIALISTA DE CALIDAD

PANEL FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES - MAYO 2025

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar E. Siverio Díaz
REPRESENTANTE

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Joe D'Coning Yopez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jimenez C.
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 347142



IMAGEN 1: TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN YUGOSLAVIA II.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

IMAGEN 2: EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN RINCONADA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

DOMICILIO LEGAL COMÚN: CA. PEDRO URRACA 334 - DPTD. 401 - URB. SAN ANDRÉS - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD.
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodiamante100@gmail.com

CELULAR: +51 948444568

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Joe Yopez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP N° 255858

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 347301

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN



IMAGEN 3: COMPACTACION DE FONDO DE ZANJA PARA ESTRUCTURA SECTOR LA RINCONADA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

DOMICILIO LEGAL COMÚN: CA. PEDRO URRACA 334 – DPTO. 401 – URB. SAN ANDRÉS - TRUJILLO – TRUJILLO – LA LIBERTAD.
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodiamante100@gmail.com

CELULAR: +51 948444568

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Joe D'Coning Yopez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jimenez Carfascó
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 34751

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar S. Rivera Diaz
REPRESENTANTE LEGAL



IMAGEN 4: VERIFICACION DE EQUIPOS Y CASETA EN SECTOR LA RINCONADA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

IMAGEN 5: CHARLAS DE SEGURIDAD DIARIAS.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

DOMICILIO LEGAL COMÚN: CA. PEDRO URRACA 334 – DPTO. 401 – URB. SAN ANDRÉS - TRUJILLO – TRUJILLO – LA LIBERTAD.
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodiamante100@gmail.com

CELULAR: +51 948444568

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Joe Yopez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar A. Rivera Diaz
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 14 170000

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE
CIP 14 170000



ING. JOE D'CONING YEPEZ CRUZADO
CIP N° 255858

ESPECIALISTA DE CALIDAD

000161

IMAGEN 6: VISITA DE CONTRALORIA Y CHAVIMOCHIC A OBRA SECTOR LA RINCONADA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

IMAGEN 7: VISITA DE CONTRALORIA Y CHAVIMOCHIC A OBRA SECTOR YUGOSLAVIA I Y II.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

DOMICILIO LEGAL COMÚN: CA. PEDRO URRACA 334 - DPTO. 401 - URB. SAN ANDRES - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD.
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodiamante100@gmail.com

CELULAR: +51 948444598

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Joe D'Coning Yopez Cruzado
Especialista en Control de Calidad
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Sanchez Carrasco
Especialista en Supervisión
CIP 34830

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Rivera Diaz
Representante Común



IMAGEN 8: VISITA DE CONTRALORIA Y CHAVIMOCHIC A OBRA SECTOR LA RINCONADA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

IMAGEN 9: VISITA DE CONTRALORIA Y CHAVIMOCHIC A OBRA SECTOR LA RINCONADA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

DOMICILIO LEGAL COMÚN: CA. PEDRO URRACA 334 - DPTO. 401 - URB. SAN ANDRÉS - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodiamante100@gmail.com

CELULAR: +51 948444568

CONSORCIO DIAMANTE

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Joe Yopez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN



IMAGEN 10: VISITA A LA RINCONADA- NO SE ENCONTRÓ PERSONAL DEL CONTRATISTA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

IMAGEN 11: VISITA DE CHAVIMOCHIC A LA RINCONADA CON EL EQUIPO DE SUPERVISIÓN.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

DOMICILIO LEGAL COMÚN: CA. PEDRO URRACA 334 – DPTO. 401 – URB. SAN ANDRÉS - TRUJILLO – TRUJILLO – LA LIBERTAD.
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodiamante100@gmail.com

CELULAR: +51 948444658

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Joe Ypez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN



IMAGEN 12: VISITA DE CHAVIMOCHIC A LA OFICINA DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

IMAGEN 13: VISITA A YUGOSLAVIA II- NO SE ENCONTRÓ PERSONAL DEL CONTRATISTA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

DOMICILIO LEGAL COMÚN: CA. PEDRO URRACA 334 – DPTO. 401 – URB. SAN ANDRÉS - TRUJILLO – TRUJILLO – LA LIBERTAD.
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodiamante100@gmail.com

CELULAR: +51 948444568

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Joe Yopez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP N° 255858

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar S. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar S. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN



ING. JOE D'CONING YEPEZ CRUZADO
CIP N° 255858

ESPECIALISTA DE CALIDAD

000157

IMAGEN 14: VISITA A LA CASETA DE YUGOSLAVIA- NO SE ENCONTRÓ PERSONAL DEL CONTRATISTA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

IMAGEN 15: VISITA A LA RINCONADA- NO SE ENCONTRÓ PERSONAL DEL CONTRATISTA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

DOMICILIO LEGAL COMUN: CA. PEDRO URRACA 334 - DPTO. 401 - URB. SAN ANDRES - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD.
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodiamante100@gmail.com

CELULAR: +51 948444568

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Joe D'Coning Yopez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rios Diaz
EQUIPO DE SUPERVISION
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rios Diaz
REPRESENTANTE COMUN



IMAGEN 16: VISITA A LA CASETA DE YUGOSLAVIA- NO SE ENCONTRÓ PERSONAL DEL CONTRATISTA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

IMAGEN 17: VISITA A LA RINCONADA- NO SE ENCONTRÓ PERSONAL DEL CONTRATISTA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

DOMICILIO LEGAL COMÚN: CA. PEDRO URRACA 334 – DPTO. 401 – URB. SAN ANDRÉS - TRUJILLO – TRUJILLO – LA LIBERTAD.
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodiamante100@gmail.com

CELULAR: +51 948444568

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Joe D'Coning Yepez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP 255858

CONSORCIO


Ing. Juan A. Jimenez Castillo
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN



IMAGEN 18: VISITA A LA RINCONADA- NO SE ENCONTRÓ PERSONAL DEL CONTRATISTA.

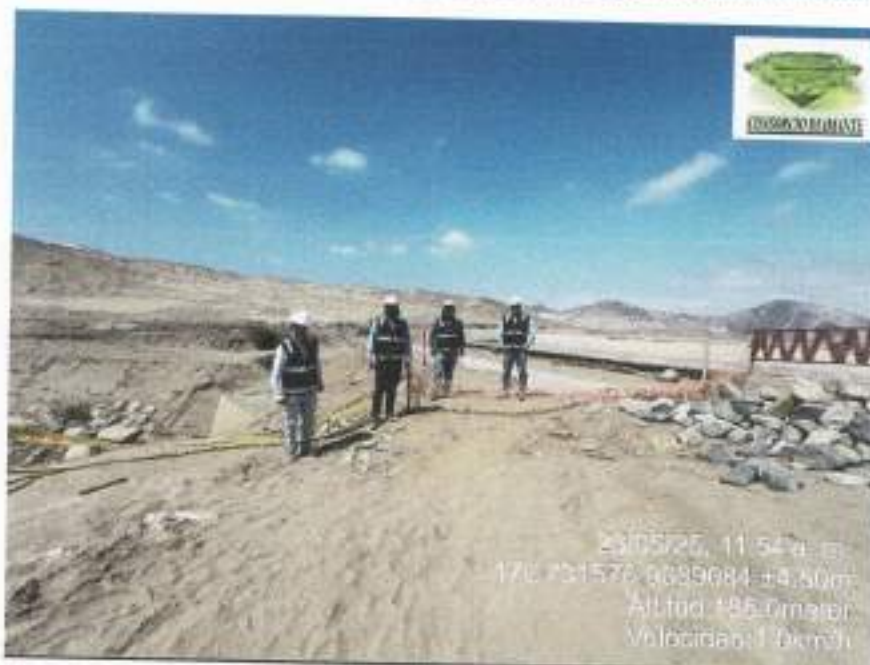

FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

IMAGEN 19: VISITA A YUGOSLAVIA II- NO SE ENCONTRÓ PERSONAL DEL CONTRATISTA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

DOMICILIO LEGAL COMÚN: CA. PEDRO URRACA 334 - DPTO. 401 - URB. SAN ANDRÉS - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD.
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodiamante100@gmail.com CELULAR: +51 948444568

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Joe Yopez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Joe Yopez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar A. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMÚN



IMAGEN 20: VISITA A YUGOSLAVIA II- NO SE ENCONTRO PERSONAL DEL CONTRATISTA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

IMAGEN 21: VISITA A LA RINCONADA- NO SE ENCONTRO PERSONAL DEL CONTRATISTA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

DOMICILIO LEGAL COMÚN: CA. PEDRO URRACA 334 – DPTO. 401 – URB. SAN ANDRÉS - TRUJILLO – TRUJILLO – LA LIBERTAD.
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodiamante100@gmail.com

CELULAR: +51 848444568

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Joe Yopez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



IMAGEN 22: VISITA A YUGOSLAVIA II- NO SE ENCONTRÓ PERSONAL DEL CONTRATISTA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

IMAGEN 23: VISITA A LA RINCONADA- NO SE ENCONTRÓ PERSONAL DEL CONTRATISTA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

DOMICILIO LEGAL COMÚN: CA. PEDRO URRACA 334 – DPTO. 401 – URB. SAN ANDRÉS - TRUJILLO – TRUJILLO – LA LIBERTAD.
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodiamante100@gmail.com

CELULAR: +51 948444568

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Joe Yopez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN



IMAGEN 24: VISITA A COLDRADOS- NO SE ENCONTRÓ PERSONAL DEL CONTRATISTA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

IMAGEN 25: VISITA A COLORADOS- NO SE ENCONTRÓ PERSONAL DEL CONTRATISTA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

DOMICILIO LEGAL COMUN: CA. PEDRO URRACA 334 - DPTO. 401 - URB. SAN ANDRES - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD.
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodiamante100@gmail.com

CELULAR: +51 948444568

ING. JOE D'CONING YEPEZ CRUZADO
ESPECIALISTA DE CALIDAD
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



IMAGEN 26: VISITA A LA RINCONADA- NO SE ENCONTRÓ PERSONAL DEL CONTRATISTA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

IMAGEN 27: VISITA A LA RINCONADA- NO SE ENCONTRÓ PERSONAL DEL CONTRATISTA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

DOMICILIO LEGAL COMÚN: CA. PEDRO URRACA 334 - DPTO. 401 - URB. SAN ANDRÉS - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD.
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodiamante100@gmail.com

CELULAR: +51 948444568

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Joe Yopez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar R. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar R. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN



IMAGEN 28: VISITA A LA CASETA DE YUGOSLAVIA- NO SE ENCONTRÓ PERSONAL DEL CONTRATISTA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

IMAGEN 29: VISITA A YUGOSLAVIA - NO SE ENCONTRÓ PERSONAL DEL CONTRATISTA.



FUENTE: EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA.

DOMICILIO LEGAL COMÚN: CA. PEDRO URRACA 334 – DPTO. 401 – URB. SAN ANDRES - TRUJILLO – TRUJILLO – LA LIBERTAD.
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodiamante100@gmail.com

CELULAR: +51 948444568

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Joe Yopez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Torres Diaz
REPRESENTANTE COMÚN
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar A. Torres Diaz
REPRESENTANTE COMÚN



ING. JOE D'CONING YEPEZ CRUZADO
CIP N° 255858

ESPECIALISTA DE CALIDAD

000149

PROTOCOLOS

DE ACTIVIDADES - MAYO 2025

DOMICILIO LEGAL COMÚN: CA. PEDRO URRACA 334 - DPTO. 401 - URB. SAN ANDRÉS - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodiamante100@gmail.com

CELULAR 451 948444568

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Joe Yopez Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP 255858

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Viquez Carrasco
CIP 542511

CONSORCIO DIAMANTE

Cesar E. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN

PROTOCOLO DE MOVIMIENTO DE TIERRA

FECHA: 11.04.2018
PÁGINA: 1 DE 1

N° DE REGISTRO: 02-MT

FECHA: 11.04.2018

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL LAJ SISTEMA DE REGO CHAWMOCHIC I Y II DISTRITO DE CHAO, PROVANCIA VILLI, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
CONTRATISTA:	CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS
SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA:	ING. JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO
MODALIDAD:	OBRA POR CONTRATO

A) DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:		B) MOVIMIENTO DE TIERRAS:	
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:		Excavación para estructura en material suelto	
FRONTE:		Excavación manual en material suelto	
PLANO DE REFERENCIA:		Excavación para cimentación de alto de anclado	
TIEMPO ESTIMADO:		Corte, perfilado y refino de talud	
PROGRESIVAS:		Relevo con material procedente de corte para conformación de filo	
		Relevo con material propio en estructura compactada	
		Relevo con material de préstamo compactado	
		Plataformas para fabricación de vigas	
		extracción, selección y acople de Rocas para anclados	
		Carga y Transporte de Rocas para anclados (TR-3 en (gramos))	
		Anclado de Enroscado	
		Afirmando 640.30 m	

C) EQUIPOS					
N°	HEERRAMIENTAS MANUALES Y/O EQUIPOS	INVENTARIO	NUOVO	MANTENIMIENTO	SEÑAL
01	RETROEXCAVADORA DE GRUPO DE 115 HP				✓
02	VOLQUETE DE 15 M3				✓
03	LAMPAS				✓
04	BARRETAS				✓
MATERIALES					
	YESO		✓		
	ESTACAS	✓	✓		
	WINDOJA		✓		
05	OTROS		✓		

D) TIPO DE EXCAVACIÓN					
PRIMO A LA EXCAVACIÓN	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES	GRÁFICO
Revisión de Planos y Especificaciones	✓				
Autorización de Excavación (*)	✓				
Unidad de PERC	✓				
Revisión de trazo (Verif. Topog.)	✓				
Seguridad, Orden y Limpieza	✓				
Perfiles de taludes			✓		
Sección (Sección de corte al detalle en Observaciones)			✓		
Continuidad de Mueles	✓				
Otros (proporcionar)		✓			
POSTERIOR A LA EXCAVACIÓN	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES	
Troncos de la excavación (Estadísticas, volúmenes, perfiles, etc.)	✓				
Control de trazo y niveles de excavación	✓				
Otros (proporcionar)		✓			

E) DATOS DE CAMPO			
Nivel de terreno (Punto a Punto):	M/N	183.76	
Nivel de Excavación (Según plano):	N/E	183.46	
Nivel final de Excavación:	N/E	183.46	
Plano y/o diagrama adjunto:	S	NO	

F) OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:			

RESIDENTE DE OBRA		CONTROL DE CALIDAD		SUPERVISOR DE OBRA	
NOMBRE:	ING. ROGER ALVARADO DE CUIRO	NOMBRE:	ING. ROGERO BANCOS ROSAS	NOMBRE:	ING. JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
FECHA:		FECHA:		FECHA:	

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Jose Velep Cruzado
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP 25474



INFORME DEL ESPECIALISTA DE AMBIENTAL

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Johnny L. Galvez Cubas
ESPECIALISTA AMBIENTAL
CIP. 225662

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54250

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

INFORME N° 008-2025/SUP-JLGC-IA.



"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

INFORME N° 008-2025/SUP-JLGC-1A.

A : Ing. Juan Antonio Jiménez Carrasco
Ing. Jefe de Supervisión de Obra

DE : Ing. Johnny Lorenz Gálvez Cubas
Ing. Especialista Ambiental

ASUNTO : **INFORME MENSUAL (INGENIERO AMBIENTAL) - MAYO 2025**, (Del 1 al 31/05/2025).

REFERENCIA : Supervisión "CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE: EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295 ITEM 1 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

FECHA : 2 DE JUNIO DEL 2025

De mi consideración,

Es grato dirigirme a Ud. para saludarle cordialmente y a la vez remitir el informe correspondiente a las fechas: Del 1 al 31/05/2025; así como recomendaciones a implementar en materia de Medio Ambiente, con la finalidad verificar que el proyecto cumpla con las obligaciones en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y la normativa ambiental vigente, así como busca promover la subsanación de cualquier incumplimiento y asegurar la protección del medio ambiente y la salud de la población.

Sin otro particular expreso las muestras de mi especial atención.

Atentamente,

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Johnny L. Gálvez Cubas
ESPECIALISTA AMBIENTAL
CIP: 225692

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP: 34850

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN



INFORME MENSUAL DE MEDIO AMBIENTE



CONSORCIO DIAMANTE



PROYECTO: "CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE: EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295. ITEM 1 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
PROVINCIA : VIRU
DISTRITO : CHAO

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 14680

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA: JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO
CONSULTOR DE REPRESENTANTE COMUN: CESAR NESTOR RIVERA DIAZ
ESPECIALISTA AMBIENTAL: ING. JOHNNY LORENZ GÁLVEZ CUBAS

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Johnny L. Galvez Cubas
ESPECIALISTA AMBIENTAL
CIP 225492

1 AL 31 MAYO 2025

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



INDICE GENERAL

DATOS GENERALES	4
1. OBJETIVO.....	5
2. REFERENCIA NORMATIVA.....	5
3. INSPECCION DE OBRA DE MEDIO AMBIENTE - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.....	7
3.1 Plan de Medidas de Prevención, Mitigación y/o Corrección de los Impactos Ambientales.....	7
3.1.1 Charlas, capacitación, entrenamiento del personal en materia de Medio Ambiente	7
3.1.2 Señalizaciones en Obra	7
3.1.3 Inspección y control de documentos de Gestión Ambiental.....	8
3.2 Programa de manejo de Residuos Sólidos.	8
3.3 Plan de Monitoreo Ambiental.	8
3.4 Plan de Contingencias.	8
3.5 Plan de Cierre.....	8
4. METAS.....	9
5. REVISIÓN EFECTUAL AL PROYECTO DE PARTIDAS EJECUTADAS.....	9
6. SUPERVISIÓN, CONTROL Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA AMBIENTAL DE OBRA:	9
6.1 Inspección en obra, observaciones realizadas y levantamiento de observaciones.	10
7. AMONESTACIONES Y SUSPENSIONES.....	10
8. CONCLUSIONES	10
9. RECOMENDACIONES	10
10. PANEL FOTOGRAFICO.....	111

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Johnny L. Galvez Cubas
ESPECIALISTA AMBIENTAL
CIP. 228492

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Rivera Diaz
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54880

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



DATOS GENERALES

1.1 Fecha de inicio de obra:	10/04/2025
1.2 Plazo de Ejecución:	150 días calendario
1.3 Fecha prevista de culminación:	06 de septiembre 2025
1.4 Código CUI:	2593295
1.5 Presupuesto General:	7,502,429.05
1.6 Ámbito:	Supervisor de Medio Ambiente
1.7 Lugar:	Distrito: Chao Provincia: Viru Región: La Libertad
1.8 Contratistas:	Consorcio Ejecutor de Obras
1.9 Ingeniero Supervisor M.A	Johnny Lorenz Gálvez Cubas
1.10 Coordinador de Obra	Charles Iván Ramírez Guzmán
1.11 Residente de Obra	Fredy Aucahuaque Quispe
1.12 Supervisor del Obra	Juan Antonio Jiménez Carrasco

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Johnny L. Gálvez Cubas
ESPECIALISTA AMBIENTAL
CIP. 226692

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 24880

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN



1. OBJETIVO

Supervisar el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) por parte del Consorcio Ejecutor de Obras, en el mes de Mayo del 2025 en obra, verificando el cumplimiento de las medidas de gestión ambiental establecidos en el Plan de Manejo Ambiental asegurando que la obra se desarrolla de manera sostenible y minimizando los impactos negativos en el entorno; del mismo modo se verifica de que las medidas de mitigación y compensación propuestas en el Plan se implementen correctamente y de forma eficaz, así como la identificación de posibles desviaciones o incumplimientos para tomar medidas correctivas a tiempo.

2. REFERENCIA NORMATIVA

- Constitución Política del Perú (29.12.1993).
- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (20.04.2001) y su Modificatoria D. L. N° 1078.
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (13.10.2005).
- Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (28.01.2005).
- Decreto Supremo (D.S.) N° 002-2009-MINAM.
- Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 (30.03.2009)
- La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 (modificada por Ley N° 27902 y por la Ley N° 29053)
- D.S. N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (23.03.2010)
- D.S. N° 017-2009-AG, Aprueban Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (02.09.2009)
- D.S. N° 019-2009-MINAM. Se aprueba el Reglamento de la Ley N° 27446.
- Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas.
- Ley N° 21147, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
- Ley N° 26839, Ley sobre la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica.
- Resolución Ministerial N° 157-2011 - MINAM.
- D.S. N° 004-2017-MINAM. Aprueban los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para agua (07.06.2017).
- D.S. N° 003-2017-MINAM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el Aire (07.06.2017).

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54850

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Johnny I. Gálvez Cubas

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Reyes Díaz
REPRESENTANTE COMÚN



"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

- D.S. N° 010-2019-MINAM. Aprueban el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
- D.S. N° 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (24.10.03).
- D.S. N° 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo (02.12.17).
- Decreto Legislativo N° 1501, Modificación del Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- Decreto Legislativo (D.L.) N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (23.12.2016).
- D.S. N° 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (21.12.2017).
- Ley 28256. Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos (18.06.04).
- D.S. 021-2008-MTC. Aprueban el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos (10.06.08).
- D.S. 030-2008-MTC. Modifican disposiciones del Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (02.10.2008).
- D.S. 043-2008-MTC. Incorporan Décimo primera disposición complementaria transitoria en el Reglamento Nacional de Transportes Terrestre de Materiales y Residuos peligrosos (20.11.08).
- D.S. N° 019-2012-AG Reglamento de gestión ambiental en actividades del sector Agrario.
- D.S. N° 014-2013-MINAGRI decreto que modifica a los artículos del reglamento de gestión ambiental del sector agrario.
- D.S. N° 017-2012-AG reglamento de infracciones y sanciones ambientales en el sector agrario.
- NTP 400.050-2017, Manejo de residuos de la Construcción.
- NTP 900.058.2019, Gestión de residuos sólidos.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Johnny L. Gálvez Cubas
ESPECIALISTA AMBIENTAL
CIP: 225692

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Johnny L. Gálvez Cubas
ESPECIALISTA AMBIENTAL
CIP: 225692

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar E. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

3. INSPECCION DE OBRA DE MEDIO AMBIENTE – IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

3.1 Plan de Medidas de Prevención, Mitigación y/o Corrección de los Impactos Ambientales.

Durante la inspección realizada a los diferentes frentes de trabajo que son LA RINCONADA Y YUGOSLAVIA 1, no se evidenció que se hayan implementado las Medidas de Prevención, Mitigación y/o Corrección de los Impactos Ambientales.

3.1.1 Charlas, capacitación, entrenamiento del personal en materia de Medio Ambiente

Charlas programadas

FECHA	DESCRIPCION DE LA CHARLA	DURACION
1 SEMANA		
07/05/2025	Conciencia ambiental	10 min
2 SEMANA		
14/05/2025	Medidas de prevención y/o mitigación de impactos ambientales	10 min
3 SEMANA		
21/05/2025	Buenas prácticas ambientales	10 min
4 SEMANA		
28/05/2025	Aspectos e impactos ambientales	10 min

- Fuente: Elaboración propia

Charla ejecutada

FECHA	DESCRIPCION DE LA CHARLA	DURACION
1 SEMANA		
07/05/2025	Conciencia ambiental	10 min

3.1.2 Señalizaciones en Obra

No se encontró ningún tipo de señalización en los frentes de trabajo.

SEÑALIZACIÓN	se encontró	no se encontró
aire		X
ruido		X
residuos sólidos		X
agua		X

Fuente: Elaboración propia

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Johnny L. Galvez Cubas
ESPECIALISTA AMBIENTAL
C.R. 225692

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

3.1.3 Inspección y control de documentos de Gestión Ambiental.

El contratista no presentó el control de asistencia del personal en las charlas ambientales

3.2 Programa de manejo de Residuos Sólidos.

Se encontró implementación de la gestión de residuos sólidos en el sector de Yugoslavia y Rinconada.

3.3 Plan de Monitoreo Ambiental.

No se ha presentado ninguna evidencia de haber realizado los monitoreos previos a la ejecución de la obra.

3.4 Plan de Contingencias.

Se encontraron los kit antiderrame en los equipos de línea amarilla:

Según la partida **01.02.02.06 PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL** el pago se efectuará según el precio del contrato, mensualmente en forma proporcional a la duración de los trabajos establecido en el cronograma.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO DE EXPEDIENTE
01.02.02.06	PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL	-	-
255090013	ADQUISICIÓN DE KIT ANTIDERRAME	glb	1

Según la tabla anterior y la descripción del EXPEDIENTE TÉCNICO, se estaría valorizando kit antiderrame de manera global/días.

Según la partida **01.02.02.04 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS** el pago que se está realizando la VALORIZACIÓN N°2 está en relación a los días trabajados

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO ACTUAL
01.02.02.04	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	-	-
2901500260009	IMPLEMENTACIÓN DE CONTENEDORES RR. SS	est	2.78
01.02.02.06	PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL	-	-
255090013	ADQUISICIÓN DE KIT ANTIDERRAME	glb	0.042

3.5 Plan de Cierre.

El plan de cierre aun no es necesario por lo que no está en ejecución

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.R. 54880

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Johnny L. Galvez Cubas
ESPECIALISTA AMBIENTAL
C.R. 228892

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN



"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

4. METAS

Las partidas programadas para el periodo valorizado son las siguientes:

TABLA 1: PARTIDAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	AVANCE PROGRAMADO (%)
1.02	SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACION AMBIENTAL, PLAN DE MONITOREO		
01.02.02	MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION O CORRECCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES		
01.02.02.01	MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DEL SUELO	glb	24%
01.02.02.02	MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DEL AGUA	glb	24%
01.02.02.03	MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DEL AIRE Y EL RUIDO	glb	24%
01.02.02.04	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	24%
01.02.02.05	PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL	glb	24%
01.02.02.06	PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL	glb	35%
01.02.02.07	PLAN DE CIERRE DE OBRA	glb	0%

FUENTE: Cronograma Acelerado Valorizado de Inicio de Obra

5. REVISIÓN EFECTUAL AL PROYECTO DE PARTIDAS EJECUTADAS

Las partidas ejecutadas durante el periodo valorizado son las siguientes:

TABLA 1: PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	AVANCE (%)
01.02	SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACION AMBIENTAL, PLAN DE MONITOREO		
01.02.02	MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION O CORRECCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES		
01.02.02.01	MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DEL SUELO	glb	0.00%
01.02.02.02	MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DEL AGUA	glb	0.00%
01.02.02.03	MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DEL AIRE Y EL RUIDO	glb	0.00%
01.02.02.04	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	0.00%
01.02.02.05	PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL	glb	0.00%
01.02.02.06	PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL	glb	0.00%
01.02.02.07	PLAN DE CIERRE DE OBRA	glb	0.00%

FUENTE: Valorización de Obra N°02.

6. SUPERVISIÓN, CONTROL Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA

AMBIENTAL DE OBRA: **CONSORCIO DIAMANTE**

Ing. Johnny L. Gálvez Cubas
ESPECIALISTA AMBIENTAL
CIP: 225492

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Llanos Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP: 54350

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE CUBAS



6.1 Inspección en obra, observaciones realizadas y levantamiento de observaciones.

OBSERVACIONES:

- Observaciones del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES:

- Se presentó el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SOLICITADO
- Se levantaron las observaciones del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
- Se aprobó el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

7. AMONESTACIONES Y SUSPENSIONES

Se verifico que no hubo amonestaciones y suspensiones en el área ambiental en el mes de mayo.

8. CONCLUSIONES

- Se ha valorizado 0% del PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.
- Se ha valorizado 0% del PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL.
- No se ha evidenciado la Implementación de la señalización ambiental para aire, ruido, agua y residuos sólidos.
- No se ha evidenciado las medidas de mitigación para contaminación de aire.
- No se ha evidenciado las medidas de mitigación para contaminación de agua.
- No se ha evidenciado las medidas de mitigación para ruido.
- No se presentaron los resultados del monitoreo ambiental programado.
- No se evidenciaron los puntos ecológicos en los frentes de trabajo.
- Solo se realizaron trabajos del 01 al 08 de mayo del 2025 y del 09 al 31 no se presenciaron trabajos debido a la ausencia del personal clave del contratista

9. RECOMENDACIONES

- Se recomienda implementar las medidas de prevención, mitigación o corrección ambiental.
- Se recomienda alcanzar las autorizaciones y certificaciones de la EO-RS con la que se trabajará.
- Se recomienda alcanzar el inventario de flora y fauna local teniendo énfasis en serpientes y arácnidos peligrosos.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Johnny L. Galvez Cubas

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Johnny L. Galvez Cubas
ESPECIALISTA AMBIENTAL
CIP: 225692

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP: 54850

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Carlos Rivera Diaz
RESPONSABLE COMUN



10. PANEL FOTOGRAFICO



FOTO N° 01: Punto ecológico en el sector de Yugoslavia 1.



FOTO N° 02: Punto ecológico en el sector de Rinconada.

CONSORCIO DIAMANTE
[Signature]
Ing. Juan A. Sánchez C.A.
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54810

CONSORCIO DIAMANTE
[Signature]
Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO DIAMANTE
[Signature]
Ing. Johnny L. Gálvez Cubas
ESPECIALISTA AMBIENTAL
CIP 229882



FOTO N° 03: Punto ecológico en el sector de Yugoslavia 1.



FOTO N° 04: Visita de contraloría verificando el cumplimiento de planes ambientales y otros en el sector de Yugoslavia

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan L. Gálvez Cubas
Especialista Ambiental
C.R. 23960

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Johnny L. Gálvez Cubas
Especialista Ambiental
C.R. 23960



"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"



FOTO N° 05: Visita de contraloría verificando el cumplimiento de planes ambientales y otros en el sector de Rinconada



FOTO N° 06: Contraloría inspeccionando los puntos ecológicos para la segregación de residuos.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar M. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Johnny Lorenz Gálvez Cubas
ESPECIALISTA AMBIENTAL
CIP 325692

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Johnny Lorenz Gálvez Cubas
ESPECIALISTA AMBIENTAL
CIP 325692



"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"



FOTO N° 07: Verificando el impacto ambiental en la flora y fauna de la zona



FOTO N° 08: Verificando limpieza de concreto después del vaciado.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar M. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Johnny Lorenz Gálvez Cubas
ESPECIALISTA AMBIENTAL
CIP: 54010

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Johnny L. Gálvez Cubas
ESPECIALISTA AMBIENTAL
CIP: 225682



"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"



FOTO N° 09: Visita a campo.



CONSORCIO DIAMANTE
 Juan A. Romero Ca
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP 34450

CONSORCIO DIAMANTE
 Ing. Cesar R. Rivera Diaz
 REPRESENTANTE COMUN

FOTO N° 10: Visita a campo.

CONSORCIO DIAMANTE
 Ing. Johnny L. Galvez Cubas
 ESPECIALISTA AMBIENTAL
 CIP 225692



FOTO N° 11: Visita a campo.

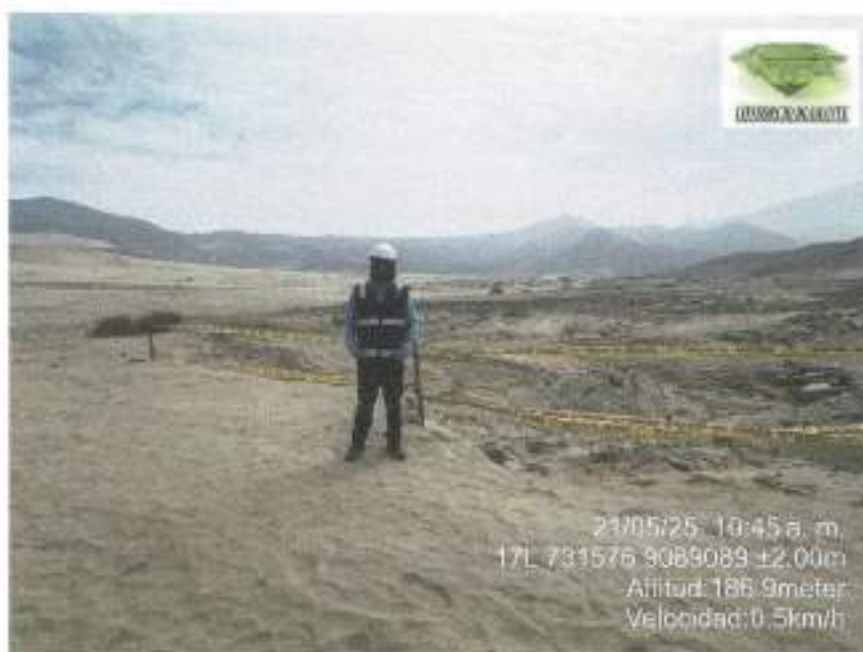


FOTO N° 12: Visita a campo.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Viquez Cerna
Jefe de Supervisión
CIP 54880

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Johnny Lorenz Gálvez Cubas
ESPECIALISTA AMBIENTAL
CIP 225682



FOTO N° 13: Visita a campo



FOTO N° 14: Visita a campo.

CONSORCIO DIAMANTE
Johnny Lorenz Gálvez Cubas
Ing. Johnny Lorenz Gálvez Cubas
Especialista Ambiental
CIP: 225692

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO DIAMANTE
Johnny Lorenz Gálvez Cubas
Ing. Johnny Lorenz Gálvez Cubas
Especialista Ambiental
CIP: 225692



FOTO N° 15: Visita a campo.



FOTO N° 16: Visita a campo.

CONSORCIO DIAMANTE
 Ing. Juan A. Carrasco
 JEFE DE SUPERVISION
 CAP DABCO

CONSORCIO DIAMANTE
 Ing. Cesar N. Rivera Diaz
 REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO DIAMANTE
 Ing. Johnny L. Galvez Cubas
 ESPECIALISTA AMBIENTAL
 C.M. 225692



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"



000128

INFORME DE ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Ricardo Jimeno Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54030

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 357671



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000127

INFORME N° 07-2025/SUP-CSBS-IS.

A : Ing. Juan Antonio Jiménez Carrasco
Ing. Jefe de Supervisión de Obra

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan Antonio Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA
CIP: 54888

DE : Ing. Christy Sttephane Briceño Salinas
Ing. Especialista de Seguridad

ASUNTO : INFORME MENSUAL DE ESPECIALISTA DE SEGURIDAD – MAYO
2025.

REFERENCIA : Supervisión "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE: EN EL (LA)
SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO,
PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295
ÍTEM 1 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257671

FECHA : 31 de Mayo del 2025

De mi consideración,

Es grato dirigirme a Ud. para saludarle cordialmente y a la vez remitir el informe N° 07-2025/SUP-CSBS-IS correspondiente a las fechas: Del 01 al 31/05/2025, así como recomendaciones a implementar en materia de seguridad en obra, con la finalidad garantizar la integridad física de las personas, evitar pérdidas humanas, a la propiedad y materiales.

Sin otro particular expreso las muestras de mi especial atención.

Atentamente,

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Díaz
JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

000126



PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE: EN EL (LA)
SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA
DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295. ÍTEM
1 COMPONENTE OBRAS CIVILES"

DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
PROVINCIA : VIRÚ
DISTRITO : CHAO

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257671

JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA: ING. JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO
CONSULTOR DE REPRESENTANTE COMÚN: ING. CESAR NESTOR RIVERA DIAZ
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD: ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

MAYO 2025

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000125

ÍNDICE GENERAL

1. DATOS GENERALES	4
2. OBJETIVO	4
3. REFERENCIA NORMATIVA	5
4. INSPECCIÓN DE OBRA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN	6
4.1 Kit para respuesta ante emergencia.....	6
4.2 Charlas, capacitación, entrenamiento del personal en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.....	6
4.3 Señalización en Obra.....	7
4.4 Uso de Equipos de Protección Personal (EPP).....	8
4.5 Inspección y Control de Documentos de Gestión de SST	8
4.6 Verificación de Instalación de Dispensadores de Agua Potable, Protección de Varillas y Barandas de Seguridad.....	8
5. SUPERVISIÓN, CONTROL Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA LA SEGURIDAD DE OBRA:	9
6. ÍNDICES ESTADÍSTICOS.....	9
7. AMONESTACIONES Y SUSPENSIONES	10
8. METAS.....	10
9. CONCLUSIONES	11
10. RECOMENDACIONES	11
11. PANEL FOTOGRÁFICO.....	12
12. ANEXOS	32

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
2016-08-01 SUPERVISIÓN
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar R. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMÚN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000124

1. DATOS GENERALES

1.1 Fecha de inicio de obra:	10/04/2025
1.2 Plazo de Ejecución:	150 días calendario
1.3 Fecha prevista de culminación:	06 de septiembre 2025
1.4 Código CUI:	2593295
1.5 Presupuesto General:	7,502,429.05
1.6 Ámbito:	Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo
1.7 Lugar:	Distrito: Chao Provincia: Virú Región: La Libertad
1.8 Contratistas:	Consorcio Ejecutor de Obras
1.9 Ingeniero Supervisor SST	Christy Sttephane Briceño Salinas
1.10 Coordinador de Obra	Charles Iván Ramírez Guzmán
1.11 Residente de Obra	Fredy Aucahuaque Quispe
1.12 Supervisor del Obra	Juan Antonio Jiménez Carrasco

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan Antonio Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 24850

2. OBJETIVO

El presente informe de Seguridad y Salud Ocupacional tiene como objetivo **documentar y evaluar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo** durante el mes de Mayo en el marco de las actividades ejecutadas en la obra "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE: EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - CUI: 2593295. ÍTEM 1 COMPONENTE OBRAS CIVILES". Asimismo, se busca **identificar peligros, verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos, proponer medidas preventivas y correctivas**, y contribuir a la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, con el fin de proteger la integridad física y salud de todos los trabajadores involucrados en el proyecto.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMÚN



3. REFERENCIA NORMATIVA

- Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ley N° 30222 que modifica la ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma G.050 Seguridad durante la construcción.
- Resolución Ministerial N° 375-2008-TR Normas básicas de Ergonomía y Procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico.
- Ley 30102 Medidas preventivas para la exposición a radiación solar de trabajadores.
- D.S N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783.
- D.S N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.
- D.S. N° 006-2014-TR Modifican el Reglamento de la ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR.
- D.S. N° 012-2014-TR Registro único de información de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales.
- D.S. N° 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos.
- R.M. N° 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.
- RM N°050-2013-TR Formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- R.M. N° 571-2014-MINSA Modificación de la R.M. N° 312-2011-MINSA. "Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad".
- R.M N° 023-2019-PCM aprueban ejecución de simulacros y simulaciones
- D.S N° 009-2020-TR Seguro de vida ley.
- DS. N° 003-2013-Vivienda, reglamento para gestión de residuos sólidos de la construcción y demolición.
- NTP 399.010-1, Señales de Seguridad.
- D.S 016-2016
- NTP 350.043-1, NTP 833.026-1, NTP 833.034, Extintores portátiles.
- NTP 400.033,034 – Andamios.
- NTP 400.050, Manejo de residuos de la Construcción.
- Ley 29664 Ley de Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.

Ing. Cesar N. Rivera Díaz
Jefe de Seguridad y Salud
CIP 34650

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN



4. INSPECCIÓN DE OBRA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN.

4.1 Kit para respuesta ante emergencia.

Durante la inspección realizada, no se constató que el contratista cuenta con el kit de emergencia exigido. Esta verificación se considera esencial, ya que ningún trabajador está exento de enfrentar situaciones imprevistas durante la jornada laboral, tales como golpes, cortaduras u otras lesiones menores. Disponer de un botiquín de primeros auxilios en el lugar de trabajo permite brindar atención inmediata ante estos eventos, contribuyendo así a la prevención de riesgos y al cumplimiento de las normativas de seguridad vigentes. Solo cuenta con el extintor y botiquín en la movilidad del personal técnico.

4.2 Charlas, capacitación, entrenamiento del personal en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Verificación de Charlas de Seguridad - Empresa Ejecutora

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Martínez Carasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54000

Se llevó a cabo la verificación del cumplimiento por parte de la empresa ejecutora respecto a la realización de las Charlas de 5 minutos de seguridad, efectuadas diariamente antes del inicio de la jornada laboral. Esta actividad preventiva fue ejecutada de manera continua durante el periodo comprendido entre el **01 al 08 de mayo**, cumpliendo así con los lineamientos establecidos para la gestión de la seguridad en obra. **Ver Panel fotográfico - Foto 01 y 02.**

- Revisión y verificación de la documentación:

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

Se efectuó la verificación del registro de asistencia de los trabajadores comprendido del **01 al 08 de mayo** que participan en las charlas de capacitación impartidas por la Ingeniera de Seguridad María Ysabel Enco Gutiérrez del Contratista Ejecutor de Obras. **Ver Panel fotográfico - Foto 03 y 04.**

Inspección del Cronograma de Charlas:

Se realizó la inspección del cronograma de charlas, verificando los temas desarrollados por el Consorcio Ejecutor de Obras comprendido del **01 de mayo hasta el 08 del mes de mayo de 2025.**

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMÚN



FECHA	DESCRIPCION DE LA CHARLA	DURACION
1ra SEMANA		
01/05/2025	Día del Trabajador	5 min
02/05/2025	Trabajo en Equipo	5 min
03/05/2025	Orden y Aseo en el Puesto de Trabajo	5 min
2da SEMANA		
05/05/2025	Código de Colores en Herramientas Manuales	5 min
06/05/2025	Manejo Defensivo	5 min
07/05/2025	Hostigamiento Laboral	5 min
08/05/2025	Seguridad en el Lugar de Trabajo	5 min

Fuente: Registro de charlas/Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo/ CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Sánchez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54850

4.3 Señalización en Obra

Se constató que la instalación de los carteles de señalización tiene como objetivo informar a los trabajadores sobre el uso obligatorio de los elementos de protección personal, los procedimientos de actuación ante emergencias, advertir sobre los riesgos existentes en el área de trabajo y prohibir conductas que puedan comprometer la seguridad y la integridad física del personal.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257871

TIPOS DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA

- **Señales de obligación.**

Se verificó que se cumple con la instalación de carteles de señalización que indican la obligatoriedad del uso de equipos de protección personal para la prevención de accidentes. Estas señales presentan un diseño circular, con fondo azul y pictogramas y texto en color blanco, lo que facilita su rápida identificación. Ver Panel fotográfico - Foto 05.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMITÉ

- **Señales de peligro o advertencia.**

Se supervisó el cumplimiento de la señalización de peligro, la cual advierte e informa sobre los riesgos asociados al uso de herramientas o materiales específicos, conforme a las partidas que se vienen ejecutando en la obra. Ver Panel fotográfico - Foto 06.



- **Señales de prohibición**

Las señales de prohibición tienen como objetivo restringir conductas que puedan generar situaciones de riesgo, protegiendo así la salud de los trabajadores. Su diseño es de forma circular, con pictogramas en color negro sobre fondo blanco, acompañados de un borde y una banda diagonal de color rojo que atraviesa el pictograma de izquierda a derecha en un ángulo de 45 grados, garantizando su adecuada visibilidad conforme a la normativa vigente de señalización de seguridad.

Ver Panel fotográfico - Foto 07.

4.4 Uso de Equipos de Protección Personal (EPP).

El Equipo de Protección Personal (EPP) es un conjunto de dispositivos diseñados para proteger al trabajador de los riesgos presentes en el ambiente laboral, con el fin de evitar accidentes o efectos adversos para la salud. Según lo dispuesto en la NTP 399.001 y las normativas del **Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)**, los EPP incluyen elementos como cascos de seguridad, guantes, protección ocular, prendas de alta visibilidad, calzado de seguridad, arneses de protección y sistemas de protección respiratoria, según el tipo de riesgo identificado en cada puesto de trabajo. Ver Panel fotográfico - Foto 08.

CONSORCIO DUMAYTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54251

4.5 Inspección y Control de Documentos de Gestión de SST

- Durante la inspección en obra, se verificó la correcta actualización y vigencia de los documentos relacionados con la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), incluyendo la revisión del seguro SCTR para los trabajadores, constatando que se encuentra al día y conforme a la normativa vigente. **VER ANEXO ÍTEM 1.**

Se verificó el correcto llenado de los formatos de seguridad, incluyendo el registro de los check lists de inspección de máquinas y equipos, las hojas de autorización de trabajo (ATS), así como los registros de entrega de equipos de protección personal (EPP), todos debidamente firmados y sellados conforme a lo establecido. **VER ANEXO ÍTEM 2 Y 3.**

4.6 Verificación de Instalación de Dispensadores de Agua Potable, Protección de Varillas y Barandas de Seguridad

Se efectuó la verificación de la correcta instalación y ubicación de los dispensadores de agua potable, garantizando el acceso adecuado a puntos de hidratación para prevenir posibles casos de deshidratación entre los trabajadores. Asimismo, se constató que las varillas expuestas cuentan con capuchones de protección tipo seta (color verde), minimizando el riesgo de lesiones por contacto. Finalmente, se inspeccionó la instalación

CONSORCIO DUMAYTE
Ing. Cesar R. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMÚN



adecuada de barandas de seguridad en las zonas de excavación, las cuales incluían cinta de advertencia color rojo y malla naranja, asegurando una delimitación visible y efectiva del área de riesgo. **Ver Panel fotográfico – Foto 9,10,11,12 y 13.**

5. SUPERVISIÓN, CONTROL Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA LA SEGURIDAD DE OBRA:

Inspección en obra, observaciones realizadas y acciones correctivas: Se efectuó un recorrido por las áreas de trabajo en la partida de trazo y replanteo en Yugoslavia I, II y La Rinconada, en el Proyecto de Obras de Artes del Sistema de Riego Chavimochic, ubicado en el canal madre. Durante esta inspección, se verificó el trazado del nivel topográfico para la ejecución de los cortes destinados a la conformación del dique, así como la limpieza de las bases y la selección de rocas. El objetivo fue comprobar el cumplimiento de las normativas de seguridad aplicables, tales como la **Ley N° 29783** de Seguridad y Salud en el Trabajo, la **Norma G-050** del sector construcción, las **NTP 399.010-1** sobre señales de seguridad, la **NTP 400.050**, y las directrices sobre manejo de residuos de construcción. Durante la inspección, se identificaron algunas observaciones, las cuales fueron notificadas al Ingeniero de Seguridad de Obra, quien, junto con su equipo técnico, procedió a subsanar las observaciones en el menor tiempo posible

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 54050

6. ÍNDICES ESTADÍSTICOS

De acuerdo con lo establecido en el **DS. N° 005-TR-2012**, Reglamento de la **Ley N° 29783** sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, es obligatorio llevar un control y registro de las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo en las obras. En este sentido, el **Cuadro N° 01** Se muestra los índices estadísticos correspondientes a Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el índice de accidentabilidad correspondiente al mes de agosto. Para el cálculo de los índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad, se emplearon las fórmulas establecidas según la **NTP G 050**

ÍNDICE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CUADRO N° 01 (01/05/25-08/05/25)

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

MES	CANTIDAD DE TRABAJADORES EN EL TRABAJO	H.H TRABAJADORES	ENFERMEDADES OCUPACIONALES	ACCIDENTES O/PERDIDA DE TIEMPO	ACCIDENTES FATALES	TOTAL DE ACCIDENTES	TOTAL DE DÍAS PERDIDOS



	Mes	Total	Mes	Acu m.	Me s	Acum.	M es	Acu m.	M es	Acu m.	M es	Acu m.	M es	Acu m.
MA YO	19	19	12 16	121 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL = 1216 H.H TRABAJADORES

• Índice de frecuencia

$$I.F. = \frac{\text{ACCIDENTES CON PÉRDIDA DE TIEMPO} \times 10^6}{\text{HORAS HOMBRE TRABAJADAS}}$$

$$I.F. = \frac{0 \times 10^6}{1216} = 0$$

• Índice de severidad

$$I.F. = \frac{(\text{DÍAS CARGADOS} + \text{DÍAS PERDIDOS}) \times 10^6}{\text{HORAS HOMBRE TRABAJADAS}}$$

$$I.F. = \frac{0 \times 10^6}{1216} = 0$$

• Índice de accidentabilidad

$$I.F. = \frac{IF \times IG}{1000} = \frac{0 \times 0}{1000} = 0$$

NOTA: Hubo 0 accidentes en obra.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Sánchez Carrasco
2025-05-08
CIP 257671

7. AMONESTACIONES Y SUSPENSIONES

Se verificó que no hubo amonestaciones ni suspensiones este mes de Mayo (del 01/05/2025 al 08/05/2025).

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

8. METAS

Las partidas programadas para el periodo valorizado son las siguientes:

TABLA 1: PARTIDAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	AVANCE (%)
01.02	SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACIÓN AMBIENTAL, PLAN DE MONITOREO		
01.02.01	SEGURIDAD Y SALUD		
01.02.01.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	glb	0.00%
01.02.01.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	glb	0.00%
01.02.01.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	0.00%

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar H. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN



01.02.01.04	CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD	glb	0.00%
01.02.01.05	RECURSOS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN	glb	0.00%

FUENTE: VALORIZACIÓN N°02 PROGRAMADA

9. CONCLUSIONES

- Se concluye que el índice de accidentabilidad en la obra durante el mes de **mayo** es del 0%.
- Se cuenta con la señalización adecuada a la norma de seguridad en obra en los puntos de trabajos donde se están realizando actividades.
- No se cuenta con la documentación de control de charlas diaria y de inducción realizadas al personal de obra hasta la fecha 08/05/25.
- Los trabajadores del contratista no renovaron los Equipos de Protección Personal, conforme a lo establecido por la normativa de seguridad, no adjuntaron documentos físicos y virtuales.

10. RECOMENDACIONES

- Se recomienda al área de seguridad mejorar la señalización en los puntos de acopio.
- Colocar una mejor señalización de prohibición en zonas donde se realizarán actividades.
- Monitoreo de las distintas áreas de actividades para garantizar el uso adecuado del equipo de protección personal (EPP) durante la ejecución de actividades.
- Las señalizaciones de obra y carteles deben estar estandarizadas de forma correspondiente a la NTP.399.
- Implementar conos y barandas anti caídas en las zonas de alto riesgo para poder garantizar los trabajos de forma segura
- Se recomienda enviar los documentos en manera física y virtual diario.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar H. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"



000116

PANEL FOTOGRAFICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CAP: 357671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan Bermúdez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CP: 54480

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000115

11. PANEL FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DEL 01 DE MAYO AL 08 DE MAYO DEL 2025

- CHARLAS, INUNDACIONES, CAPACITACIONES

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Jhon A. Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54850



FOTO 01: Se verificó el 02/05/2025 cumplimiento de las charlas por el personal contratista, antes de dar inicio a las actividades en la obra de La Rinconada.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671



FOTO 02: Se realizó el 07/05/2025 charlas para el personal del contratista y Supervisión, antes de dar inicio a las actividades en la obra de Yugoslavia

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000114

• **REVISIÓN DE DOCUMENTOS:**



FOTO 03: Se verificó el 02/05/2025 el llenado de asistencia de charlas que está ubicada en las partidas de Yugoslavia y La Rinconada.



FOTO 04: Inspeccionaron el 07/05/2025 el llenado de los documentos de SST ubicada en las partidas de Yugoslavia y La Rinconada.

Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 267871

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000113

• SEÑALIZACIÓN DE OBRA



FOTO 05: Se verificó el 07/05/2025 la colocación de señalización en obra y Almacén que está ubicada en las partidas de Yugoslavia y la Rinconada.



FOTO 06: Se inspeccionó el 07/05/2025 la colocación de señalización de advertencia en zona de trabajo de Yugoslavia y La Rinconada.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan Carlos Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP: 34851

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257871

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000112



7 may. 2025 8:04:01 a.m.
8°19'20.598"S 78°50'43.392"W
Via Sin Nombre
Virú
La Libertad
Altitud: 217.0m
Velocidad: 0.2km/h
#Ing. Christy S. Briceño Salinas

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Camacho
JEFE DE SUPERVISION
CIP: 54830

FOTO 07: Se inspeccionó el 07/05/2025 la colocación de señalización de prohibición en zona de trabajo de Yugoslavia y La Rinconada.

- EPP DEL PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES**



8 may. 2025 8:43:24 a.m.
280° W
CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS SST
Número de índice: 3320

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN

FOTO 08: Se inspeccionó el 08/05/2025 el uso adecuado de EPP por parte del personal obrero y personal técnico (La Rinconada)



ING. CHRISTY STEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000111

- DISPENSADOR DE AGUA**



FOTO 9: El 08/05/2025 Punto de agua colocado en área de trabajo con las medidas de seguridad y salud respectivas. (La Rinconada)

- PROTECCIÓN DE VARILLAS EXPUESTAS**



FOTO 10: El 07/05/2025 se verifico la colocación de capuchones a varillas expuestas de Yugoslavia y la Rinconada para los trabajos de trazos y replanteo.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMÚN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000110

• **SEÑALIZACIÓN**



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REP. DE SUPERVISION
CIP: 64550

FOTO 11: El 07/05/2025 se verifica uso de barandas de seguridad con cinta roja en áreas de trabajos (RINCONADA).



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy Sttephane Briceño Salinas
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 237671

FOTO 12: El 02/05/2025 se verifico la colocación de barandas de seguridad en las partidas de Yugoslavia y la Rinconada por parte del Consorcio Ejecutor de obras.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000109



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257671

FOTO 13: El 07/05/2025 se verifica la colocación de barandas de seguridad con cinta roja en áreas de trabajos (YUGOSLAVIA I).



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

FOTO 14: El 05/05/2025 se verifico la colocación de malla naranja en la zanja en La Rinconada.




ING. CHRISTY STEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000108

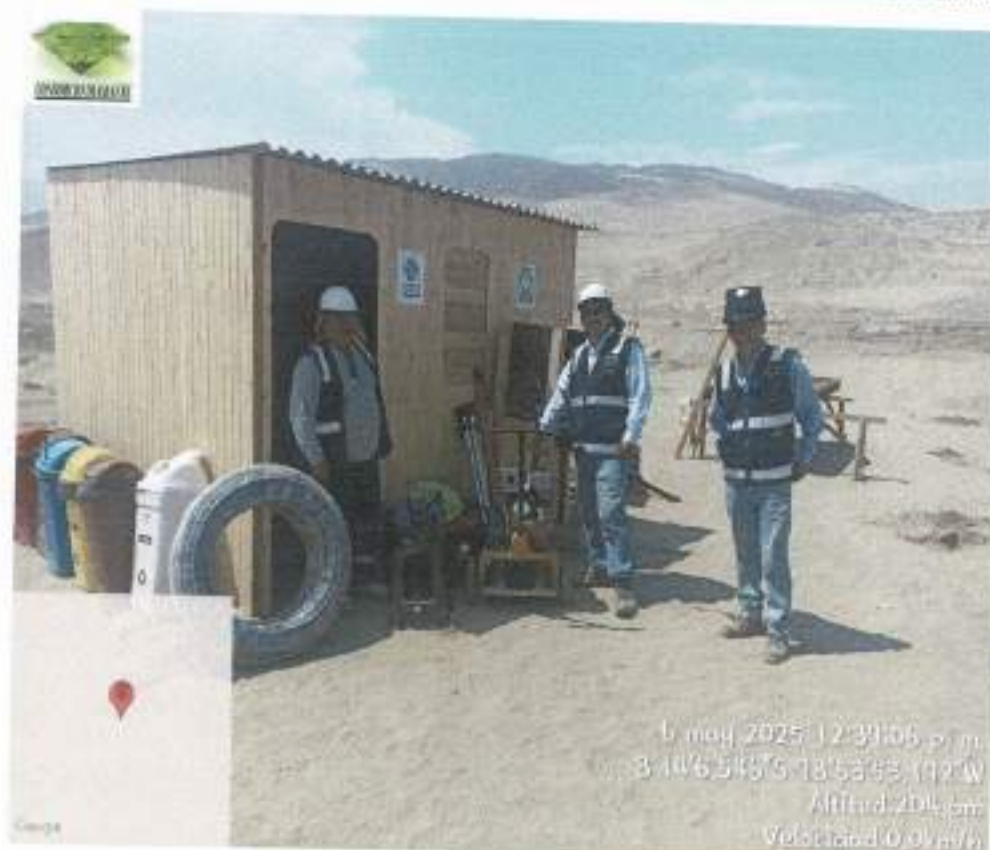

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan P. Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54850

FOTO 15: El 06/05/2025 se verifico la colocación de cinta de color del mes de máquina de compactadora en La Rinconada.



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 26767

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar M. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

FOTO 16: El 07/05/2025 nos visitó la Contraloría para visualizar el avance del Proyecto en cada partida (Yugoslavia y La Rinconada).



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000107



7 may. 2025 8:07:14 a. m.
8°19'20.634"S 78°50'42.552"W
Vía Sin Nombre
Trujillo
La Libertad
Altitud: 210.6m
Velocidad: 1.5km/h
#Ing. Christy S. Briceño Salinas

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN
CIP: 54050

FOTO 17: El 07/05/2025 nos visitó la Contraloría para visualizar el avance del Proyecto en cada partida (Yugoslavia y La Rinconada).



8 may 2025 10:10:05 a. m.
8°19'20.634"S 78°50'42.552"W
Vía Sin Nombre
Trujillo
La Libertad
Altitud: 210.6m
Velocidad: 1.5km/h

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy Briceño Salinas
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN

FOTO 18: El 08/05/2025 se verificó la colocación de capuchones verdes en la partida de la Rinconada.



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000106

**ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN DEL 01 DE MAYO AL 31 DE
MAYO DEL 2025**



FOTO 19: El 02/05/2025 se verifico la presencia de la arqueóloga en obra (Yugoslavia).



FOTO 20: El 05/05/2025 se verifico la colocación de malla naranja en zanja en la partida de La Rinconada.



ING. CHRISTY STEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000105



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP: 54451

FOTO 20: El 06/05/2025 se identificó la correcta señalización y orden en acopio de obra con sus respectivas cintas del mes. (La Rinconada)



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257671

FOTO 21: El 07/05/2025 se identificó la correcta señalización con sus respectivas cintas de seguridad. (La Rinconada)

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar M. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000104



8 may 2025, 10:18:47 a. m.
17L 737408 9079242 ±3.55m
Altitud: 199.1 meter
Velocidad: 0.6km/h

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. A. Sánchez Carra
ÁREA DE SUPERVISIÓN
CIP 54050

FOTO 22: El 08/05/2025 se identificó el correcto uso de los Equipos de Protección Personal en las actividades realizadas por el trabajador. (La Rinconada)



9 may. 2025 9:23:23 a. m.
8°19'26.256"S 78°50'39.192"W
Altitud: 229.4m
Velocidad: 0.4km/h
#Ing. Christy S. Briceño Salinas

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

FOTO 23: El 09/05/2025 se realizó verificación de la actividad ejecutada en la Partida de la Rinconada.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMÚN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000103



CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jimenez Carrizosa
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54850

10/05/25 9:25 a. m.
17L 731580 9089077 +14.00m
Altitud: 189.7 meter
Velocidad: 1.6 km/h

FOTO 24: El 10/05/2025 se inspección la colocación de malla naranja puesta en la Partida de la Rinconada – Ya no hubo actividades del contratista.



CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

12 may 2025 10:40:52 a. m.
8°10'1.11"S 78°43'51.93"W
Altitud: 206.1 m
Velocidad: 2.0 km/h

FOTO 25: El 12/05/2025 se inspección la colocación de malla naranja puesta en la Partida de la Rinconada – Ya no hubo actividades del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



ING. CHRISTY STEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000102



CONSORCIO DIAMANTE



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar H. Rivera Díaz
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54550

FOTO 26: El 13/05/2025 se inspección la colocación de malla naranja puesta en la Partida de la Rinconada - Ya no hubo actividades del contratista.



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

FOTO 27: El 14/05/2025 se inspección junto con los entes de Chavimochic las actividades que el contratista no realizo en la Partida de la Rinconada.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar H. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN



ING. CHRISTY STEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000101



15 may 2025 11:05:08

104° E

Altitud: 213.0m

Velocidad: 0.0km/h

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jimenez Carr

JEFE DE SUPERVISIÓN

OP 54950

FOTO 28: El 15/05/2025 se inspección la señalización puesta en la Partida de la Yugoslavia - Ya no hubo actividades del contratista.



16 may 2025 13:22:34

17L 731563 9089095

105° E

Altitud: 207.0m

Velocidad: 0.0km/h

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceño Salinas

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

OP 257671

FOTO 29: El 16/05/2025 se inspección la colocación de malla naranja y cinta amarilla de seguridad puesta en la Partida de la Rinconada - Ya no hubo actividades del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz

REPRESENTANTE COMUN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000100



FOTO 30: El 17/05/2025 se inspección la colocación de malla naranja puesta en la Partida de la Rinconada – Ya no hubo actividades del contratista.



FOTO 31: El 19/05/2025 se inspección la correcta colocación de baranda de seguridad con cinta roja puesta en la Partida de la Yugoslavia – Ya no hubo actividades del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMÚN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000099



FOTO 32: El 20/05/2025 se inspección la correcta colocación de baranda de seguridad con cinta roja puesta en la Partida de la Yugoslavia – Ya no hubo actividades del contratista.



FOTO 33: El 21/05/2025 se inspección que se está cayendo la malla naranja puesta en la Partida de la Rinconada – Ya no hubo actividades del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000098



FOTO 34: El 22/05/2025 se inspección la señalización de la malla naranja puesta en la Partida de la Rinconada – Ya no hubo actividades del contratista.



CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257071

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



ING. CHRISTY STEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000097



FOTO 36: El 24/05/2025 se inspección la señalización puesta en la Partida de la Yugoslavia - Ya no hubo actividades del contratista.



FOTO 37: El 26/05/2025 se inspección la señalización y barandas de seguridad con cinta roja puesta en la Partida de la Yugoslavia - Ya no hubo actividades del contratista.



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000096



27/05/25 12:19 p.m.

17°L 72°51' 9086369 +11395.45m

Altitud: 187.6meter

Velocidad: 0.4km/h

FOTO 38: El 27/05/2025 se inspección las barandas de seguridad con cinta roja puesta en la Partida de la Rinconada – Ya no hubo actividades del contratista.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Domínguez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54450

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar M. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

000095

ANEXOS

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIR. 8490

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIR. 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar M. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000094

1. SCTR DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRAS

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN
CIP 84890

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257571

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Nro. De Constancia MP/2025/11635899



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO



Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012500038731 y contrato de Salud No. 7022500048286, con vigencia del 09/04/2025 hasta el 09/05/2025, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL - TODA OBRA EN EJECUCION

ASEGURADO(S)

1	DNI	41978065	ALARCON SILVERA YERSON
2	DNI	09642512	AUCAHUAQUE QUISPE FREDY
3	DNI	80352299	BANCES INOÑAN RODOLFO
4	DNI	70756409	BARON GUEVARA KELVIN NATHANAE
5	DNI	43982971	ENCO GUTIERREZ MARIA YSABEL
6	DNI	76599830	INFANTE ALAYA MIGUEL ANGEL
7	DNI	17611189	PUEMAPE CAJUSOL CESAR AUGUSTO
8	DNI	40308647	RAMIREZ GUZMAN CHARLES IVAN
9	DNI	40684016	SALAZAR CORONEL HUGO CESAR
10	DNI	44250130	TINEO CARRASCO TEIDER BRUCELY
11	DNI	40972132	VASQUEZ LARRAIN JOSE DENIS
12	DNI	17880155	ZARATE RODRIGUEZ LUCIA DEL CARMEN

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

09/04/2025 01:00:38 pm

CONSORCIO
Ing. Camilo S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE SEGURIDAD
COP 217671

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Nro. De Constancia MP/2025/11635899

 **MAPFRE** | PERÚ



CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Amenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54050

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceño Salazar
INGENIERA EN RESERVA - INGENIERA
CIP 257671

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Conforme al art. 24.2 del D.S. N° 003-98-SA, si el contratante declara remuneraciones menores a las consignadas en las planillas y boletas de pago de sus trabajadores (Incluidas gratificaciones de Julio y Diciembre), para el cálculo de la prima, incurrirá en un supuesto de cobertura insuficiente, y facultará a la aseguradora a solicitar el reembolso de la diferencia entre el importe de la pensión calculada con información declarada por el empleador para el cálculo de la prima, y el monto de la pensión que corresponde a lo efectivamente percibido por el trabajador.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constancias.mapfre.com.pe/#/>

Validación en línea, a través de nuestro WhatsApp +51 999919133

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Nro. De Constancia MP/2025/11662837



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012500038731 y contrato de Salud No. 7022500048286, con vigencia del 09/04/2025 hasta el 09/05/2025, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL - TODA OBRA EN EJECUCION

ASEGURADO(S)

1	DNI	60575417	CASTRO TONGOMBOL ADRIAN
2	DNI	28068383	INFANTE TEJADA EDWIN
3	DNI	75558063	MIRANDA VASQUEZ DIANA ORFELINDA
4	DNI	72124940	REYES VASQUEZ YEFERSON
5	DNI	27559912	VASQUEZ GOICOECHEA RUPERTO

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

19/04/2025 11:28:38 am

Villacorta Velarde, Jose

CONSORCIO DIAMANTINO
Ing. Juan A. Gonzalez Carrasco
OFFICE SUPERVISOR
(202) 445-1100


 ISAAC RAMIREZ MOLINA
 UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. *Christy S. Breaño Salazar*
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIN 207041

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Conforme al art. 24.2 del D.S. N° 003-98-SA, si el contratante declara remuneraciones menores a las consignadas en las planillas y boletas de pago de sus trabajadores (Incluidas gratificaciones de Julio y Diciembre), para el cálculo de la prima, incurrirá en un supuesto de cobertura insuficiente, y facultará a la aseguradora a solicitar el reembolso de la diferencia entre el importe de la pensión calculada con información declarada por el empleador para el cálculo de la prima, y el monto de la pensión que corresponde a lo efectivamente percibido por el trabajador.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constancias.mapfre.com.pe/#/>

Validación en línea, a través de nuestro WhatsApp +51 999919133

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Nro. De Constancia MP/2025/11665930

 **MAPFRE** | PERÚ



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO



Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012500041748 y contrato de Salud No. 7022500052173, con vigencia del 21/04/2025 hasta el 21/05/2025, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL - TODA OBRA EN EJECUCION

ASEGURADO(S)

1	DNI	21095573	BALDEON MALQUI MIROLO ANTONIO
2	DNI	40232156	CABEZAS PEREZ PERCY
3	DNI	45011314	QUIROZ PALACIOS JUAN ARTURO
4	DNI	70318348	RAMOS CAMPOS MIGUEL RAFAEL
5	DNI	20590222	ROMERO HUAMANI PIO
6	DNI	48444664	TOVAR DELGADILLO YELSEN JAMES
7	DNI	71944246	VILA CARDENAS JUANEDEIOS
8	DNI	48160789	VILA PEREZ NICANOR

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

21/04/2025 11:59:57 am

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Martínez C.
JEFE DE SUPERVISORIA
(M. SAGU)


ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Conforme al art. 24.2 del D.S. N° 003-98-SA, si el contratante declara remuneraciones menores a las consignadas en las planillas y boletas de pago de sus trabajadores (incluidas gratificaciones de Julio y Diciembre), para el cálculo de la prima, incurrirá en un supuesto de cobertura insuficiente, y facultará a la aseguradora a solicitar el reembolso de la diferencia entre el importe de la pensión calculada con información declarada por el empleador para el cálculo de la prima, y el monto de la pensión que corresponde a lo efectivamente percibido por el trabajador.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constancias.mapfre.com.pe/#/>

Validación en línea, a través de nuestro WhatsApp +51 999919133

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN

Nro. De Constancia MP/2025/11746101



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO



Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012500048602 y contrato de Salud No. 7022500080806, con vigencia del 01/05/2025 hasta el 31/05/2025, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL - TODA OBRA EN EJECUCION

ASEGURADO(S)

1	DNI	44845159	CEDAMANOS SABOGAL JULIO CESAR
2	DNI	48111559	GUERRA CHUQUIMANGO MILTON MICHEL
3	DNI	10418082	LUJAN QUISPE EDGAR RAFAEL
4	DNI	45230245	MONCADA MESTANZA JUAN ALBERTO

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

07/05/2025 06:23:15 am

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
Jefe de Supervisión
CIP 54759

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Eddy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Conforme al art. 24.2 del D.S. N° 003-98-SA, si el contratante declara remuneraciones menores a las consignadas en las planillas y boletas de pago de sus trabajadores (Incluidas gratificaciones de Julio y Diciembre), para el cálculo de la prima, incurrirá en un supuesto de cobertura insuficiente, y facultará a la aseguradora a solicitar el reembolso de la diferencia entre el importe de la pensión calculada con información declarada por el empleador para el cálculo de la prima, y el monto de la pensión que corresponde a lo efectivamente percibido por el trabajador.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constancias.mapfre.com.pe/#/>

Validación en línea, a través de nuestro WhatsApp +51 999919133

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000088

2. REGISTRO DE CHARLAS DE SEGURIDAD DEL (01 AL 08 DE MAYO)

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan Luis Briceño Salinas
JEFE DE SUPERVISIÓN
COP. 34280

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
COP. 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar M. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000087

**CONTRATISTA NO
PRESENTO
DOCUMENTOS FISICOS
NI VIRTUALES DE
CHARLAS DE
SEGURIDAD DEL 01 DE
MAYO AL 08 DE MAYO
DEL 2025**

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar R. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

FORMATO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y
SIMULACROS DE EMERGENCIA

REVISIÓN	02
FECHA	10/04/2025
PÁGINA	1 de 1

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social o Denominación Social		CONSORCIO DIAMANTE	
RUC	20613952714	DOMICILIO	CAL PEDRO URRACA NRO. 334 DPTO. 401 URB. SAN ANDRÉS LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL		ACTIVIDAD ECONÓMICA	ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

000086

DATOS DE LA INSTRUCCIÓN

Nombre del Instructor:		Fecha: 02/05/2025	
Sección:		Unidad:	
Desde:		Inducción	Entrenamiento
Duración: (Nº Horas)	Asistentes:	Capacitación	Simulacro de Emergencia
		Reuniones	Charlas de 10 min.
Tema:		Nº Registro:	

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	ÁREA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	<div>Contratista no presento documentos físicos, ni virtuales.</div>				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceno Salinas
COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 54830

RESPONSABLE DEL REGISTRO

CONSORCIO DIAMANTE

Nombre:	
Cargo:	Ing. Cesar N. Rivera Diaz REPRESENTANTE COMÚN
Fecha:	
Firma:	

FORMATO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y
SIMULACROS DE EMERGENCIA

REVISIÓN:	02
FECHA:	10/04/2025
PÁGINA:	1 de 1

DATOS DEL EMPLEADOR

000085

Razón Social o Denominación Social		CONSORCIO DIAMANTE	
RUC	20613952714	DOMICILIO	CAL PEDRO URRACA NRO. 334 DPTO. 401 URB. SAN ANDRÉS LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL		ACTIVIDAD ECONÓMICA	ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

DATOS DE LA INSTRUCCIÓN

Nombre del Instructor:		Fecha:	
Sección:		Unidad:	
Desde:		Inducción	Entrenamiento
Duración: (N° Horas)	Asistentes:	Capacitación	Simulacro de Emergencia
		Reuniones	Charlas de 10 min.
Tema:		N° Registro:	

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	ÁREA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	<div>Contratista no presento documentos físicos, ni virtuales.</div>				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
INSPECTORA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP. 257611

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUBDIVISION
CIP. 84690

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:	
Cargo:	
Fecha:	
Firma:	

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

FORMATO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y
SIMULACROS DE EMERGENCIA

REVISIÓN:	02
FECHA:	10/04/2025
PÁGINA:	1 de 1

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social o Denominación Social	CONSORCIO DIAMANTE		
RUC	20613952714	DOMICILIO	CAL PEDRO URRACA NRO. 334 DPTO. 401 URB. SAN ANDRÉS LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL		ACTIVIDAD ECONÓMICA	ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

000084

DATOS DE LA INSTRUCCIÓN

Nombre del Instructor:		Fecha:	
Sección:		05/05/2025	
Unidad:			
Desde:			
Duración: (N° Horas)	Asistentes:	TIPO	TEMA
		Inducción	Entrenamiento
		Capacitación	Simulacro de Emergencia
		Reuniones	Charlas de 10 min.
Tema:		Otro:	
		N° Registro:	

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	ÁREA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	<div>Contratista no presento documentos físicos, ni virtuales.</div>				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar S. Enciso Salinas
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
COP. 357671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
COP. 357672

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:	
Cargo:	
Fecha:	
Firma:	

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

FORMATO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y
SIMULACROS DE EMERGENCIA

REVISIÓN:	02
FECHA:	10/04/2025
PÁGINA:	1 de 1

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social o Denominación Social		CONSORCIO DIAMANTE	
RUC	20613952714	DOMICILIO	CAL PEDRO URRACA NRO. 334 DPTO. 401 URB. SAN ANDRES LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL		ACTIVIDAD ECONÓMICA	ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

000083

DATOS DE LA INSTRUCCIÓN

Nombre del Instructor:		Fecha: 06/05/2025	
Sección:		Unidad:	
Desde:		Inducción	Entrenamiento
Duración: (N° Horas)	Asistentes:	Capacitación	Simulacro de Emergencia
		Reuniones	Charlas de 10 min.
Tema:		N° Registro:	

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	ÁREA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Contratista no presento documentos físicos, ni virtuales.				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257099

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Amador Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 84056

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:	
Cargo:	
Fecha:	
Firma:	

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar M. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

FORMATO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y
SIMULACROS DE EMERGENCIA

REVISIÓN:

02

FECHA:

10/04/2025

PÁGINA:

1 de 1

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social o Denominación Social

CONSORCIO DIAMANTE

000082

RUC

20513952714

DOMICILIO

CAL PEDRO URRACA N.º. 334 DPTO. 401 URB. SAN ANDRES LA LIBERTAD -
TRUJILLO - TRUJILLON° TRABAJADORES EN EL
CENTRO LABORAL

ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE
CONSULTORÍA TÉCNICA

DATOS DE LA INSTRUCCIÓN

Nombre del instructor:

Fecha:

07/05/2025

Sección:

Unidad:

Desde:

Inducción

Entrenamiento

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Duración:
(N° Horas)

Asistentes:

TIPO

Capacitación

Simulacro de Emergencia

TEMA

Reuniones

Charlas de 10 min.

Otro:

Tema:

N° Registro:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	ÁREA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	<div>Contratista no presento documentos fisicos, ni virtuales.</div>				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Gladys S. Briceno Salinas
FIRMANTE ASISTENTE DE SUPERVISIÓN
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Arce Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 38830

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

FORMATO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y
SIMULACROS DE EMERGENCIA

REVISIÓN:	02
FECHA:	10/04/2025
PÁGINA:	1 de 1

DATOS DEL EMPLEADOR

0010081

Razón Social o Denominación Social		CONSORCIO DIAMANTE	
RUC	20613962714	DOMICILIO	CAL. PEDRO URRACA NRO. 334 DPTO. 401 URB. SAN ANDRES LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL		ACTIVIDAD ECONÓMICA	ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

DATOS DE LA INSTRUCCIÓN

Nombre del Instructor:		Fecha:	08/05/2025
Sección:	Unidad:		
Desde:			
Duración: (N° Horas)	Asistentes:	TIPO	TEMA
		Inducción	Entrenamiento
		Capacitación	Simulacro de Emergencia
		Reuniones	Charlas de 10 min.
Tema:		N° Registro:	

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	ÁREA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Contratista no presento documentas físicos, ni virtuales.				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
ABSA DE SUPERVISIÓN
CIP: 540150

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:	
Cargo:	
Fecha:	
Firma:	

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar H. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



3. ATS DEL CONTRATISTA DEL (01 AL 08 DE MAYO)

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257871

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Martínez Carrasco
2811 001 3075 8715 (CIN)
CIP 34058

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar M. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMÚN



ING. CHRISTY STEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000079

CONTRATISTA NO PRESENTO DOCUMENTOS FISICOS NI VIRTUALES DE ATS DEL 01 DE MAYO AL 08 DE MAYO DEL 2025

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DIP. 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar H. Rivera Diaz
JEFE DE SUPERVISIÓN
DIP. 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar H. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO DIAMANTE

Versión:

1

Año:

2025

ID:

CONTRATISTA:

FECHA:

03-05-25

Nombre Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE TABLAS DE
DETECCIÓN DE RIESGO CHAMARCA
Y 4 Grpa, Distrito de AGO, REGIÓN V.R.

UBICACIÓN:

YUGOQUILA, RINCONADA

EPP

HERRAMIENTAS/EQUIPOS

RELACIÓN DE TRABAJADORES / V.B.

DNI

FIRMA

E SEGURIDAD

DESTORNILLADORES

01.

DE SEGURIDAD

ANDAMIOS

02.

REFLECTIVO

AROLADORAS

03.

TRABAJO

MARTILLOS, COMBAS

04.

DORES

TALADRO

05.

OREES DE OIDO *

EXTENSIONES ELECTRICAS

06.

ITEORAL

ALICATES

07.

EJO

ELEVADORES

08.

SERRUCHOS, SIERRAS

09.

PICO

10.

PALA

11.

LLAVES/DAOS

12.

ACTIVIDADES O TAREAS DEL DÍA

PELIGROS (*)

RIESGO ASOC. /
CONSECUENCIA (*)

NRI

MEDIDAS DE CONTROL

NRR

No Presentan Documentos

Físicos Ni Virtuales

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Carlos S. Briceño Salas
CIP 219671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Villarreal Carrasco
CIP 219671

TA NO LIMITATIVA
CUENTA

Responsable de la Ejecución del Trabajo
de la contratista.

Responsable Contratista

V.B. Residente/ Supervisor/ Encargado
de Obra

V.B. Supervisor de Seguridad y Salud
Ocupacional

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

CONSORCIO DIAMANTE

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

CONSORCIO DIAMANTE

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Carlos N. Rivera Diaz

CONSORCIO DIAMANTE COMUN

Ing. Carlos S. Briceño Salas
CIP 219671

000077



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO DIAMANTE

Versión:

1

Año:

2025

BO:

CONTRATISTA:

FECHA:

06-05-25

UBICACIÓN:

TRANQUILIDAD DE PERSONA

YUSCULAPIA, LINCOLN

Nombre Proveedor: Consorcio de Seguridad de Obras de
Obras en el Sistema de Riesgo Construcción
y el Círculo, Distrito de Cusco, Pucallpa, Ucayali

EPP
SE SEGURIDAD
DE SEGURIDAD
DE SEGURIDAD
REFLECTIVO
TRABAJO
DORES
TORES DE OÍDO *
TEGRAL
EJO

HERRAMIENTAS/EQUIPOS
ESCALERAS
ANDAMIOS
AMOLADORAS
MARTILLOS, COMBAS
TALADRO
EXTENSIONES ELÉCTRICAS
AUCATES
ELEVADORES
SERRUCHOS, SIERRAS
PICO
PALA
LLAVES/ADORNOS

RELACIÓN DE TRABAJADORES / V'B*
D1.
D2.
D3.
D4.
D5.
D6.
D7.
D8.
D9.
D10.
D11.
D12.

DNÍ	FIRMA

Horario de Inicio:

4:00

Horario estimado de finalización:

14:00

El incumplimiento de las medidas preventivas propuestas en este formulario podrá originar la suspensión de los trabajos.

ACTIVIDADES O TAREAS DEL DÍA

PELIGROS (*)

RIESGO ASOC. / CONSECUCIA (*)

NRI

MEDIDAS DE CONTROL

NRR

No Presentaron Documentos
Físicos Ni Virtuales

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Díaz
Ingeniero de Supervisión
CIP 257679

Responsable de la Ejecución del Trabajo de la contratista.

Nombre:

DNÍ:

Responsable Contratista.

Nombre:

DNÍ:

V'B* Residente/ Supervisor Encargado de Obra

Nombre:

DNÍ:

V'B* Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional

Nombre:

DNÍ:

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Díaz
Ingeniero de Supervisión
CIP 257679

000075

CONOSCENDO COMUNITÀ

Version:

INSEGNAMENTO DI AMMANTATE

CONTRATISTA:

UBICACIÓN:

FECHA: 02-05-25

TRANSFER OF PERSONNEL

FECHA:	07-05-20
YUGOSLAVIA, BINEOM400	

Nombre Proyecto: Construcción de obras de arte civil, fomento de los emprendimientos PYME, Distrito de Chlo. Province de

EPP		HERRAMIENTAS/EQUIPOS		RELACIÓN DE TRABAJADORES / V°B°		DN	FIRMA
DE SEGURIDAD	ESCALERAS		DESTORNILLADORES		01		
DE SEGURIDAD	ANDAMIOS		PUNTAS		02		
DE SEGURIDAD	ANILADORAS		CINCELES		03		
DE REFLECTIVO	MARTILLOS, CÓMBAS		SOPLETES		04		
TRABAJO	TALADRO		EQUIPOS DE SOLDADURA		05		
ADORES	EXTENSIONES ELÉCTRICAS		SIERRA CIRCULAR		06		
	ALICATES		OTROS		07		
	ELEVADORES				08		
	SERRUCHOS, SIERRAS				09		
	PICO				10		
	PALA				11		
	LLAVES/DADES				12		

ACTIVIDADES O TAREAS DEL DÍA	PELIGROS (*)	RIESGO ASOC. / CONSECUENCIA (*)	NRI	MEDIDAS DE CONTROL	NRR
				No Presentación Documentos	
			Físicos Ni Virtuales		

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceño Salazar

Especialista en Gestión de Proyectos

CIP 157673

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. J. A. [Firma]

Jefe de Proyecto

09/02/2023

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Ing. Christy S. Boccia Salvo
Speciale in Ingegneria Elettronica

CONSORCIO DIAMANT

visor de Seguridad y Salud
Ocupacional

Supervisor/ Encargado

CONSORCIO DIAMANTE

Normale:	
Abnormale:	

000074

CONSORCIO DUEMILANTE

Ing. Carlos Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMÚN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
(ATS)

CONSECUTIVO QUANTITE

Verfahren:

INSORCIO DIAMANTE

2

CONTRACTIST A:

UBICACIÓN:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

© 2000 Blackwell Science Ltd

10

JO: *	TRANSITO DE PESSOAS
-------	---------------------

YUCOSTQUIA, RINCONADA

Nombre Proyecto: Construcción de Obras de
obra en el sistema de E.D.S. Chacabambas
I y II etapas, dentro de la zona de influencia

EPP	HERRAMIENTAS/EQUIPOS	RELACIÓN DE TRABAJADORES / V°B*	DNI	FIRMA	Horario de trabajo: Hora: Hora fin estimada de término: Hora:
E SEGURIDAD	ESCALERAS	DESTORNILLADORES			
DE SEGURIDAD	ANDAMIOS	PUNTAS			
DE SEGURIDAD	AMOLADORAS	CINCELES			
D REFLECTIVO	MARTILLOS, COMBAS	SOPLETES			
TRABAJO	TALADRO	EQUIPOS DE SOLDADURA			
ADORES	EXTENSIONES ELÉCTRICAS	SIERRA CIRCULAR			
S	ALICATES	OTROS			
ORES DE OIDO	ELEVADORES				
ITEGRAL	SERRUCHOS, SIERRAS				
S	POO				
EJO	PALA				
	LLAVES/DAADOS				
		01.			
		02.			
		03.			
		04.			
		05.			
		06.			
		07.			
		08.			
		09.			
		10.			
		11.			
		12.			

ACTIVIDADES O TAREAS DEL DÍA

RIESGO ASOC. /
CONSECUENCIA M.

1991

MEDIDAS DE CONTROL

10

No presentacion documentos
Físicos Ni Viajeros

CONCERNING DIAPYCNATE

CONSORCIO PIRENEA
Calle 2 de Mayo 502
at 1100
Albuquerque, NM 87102

ing, Clancy S. Brice, Sr. Salina,
KS 67676-1818

STANCO LIMITATIVA
ACQUINTAResponsible de la Ejecución del Trabajo
de la contratista.

Responsible Contractor.

V.B. Residential Supervisor/ Encargado

Director de Seguridad y Salud

Nombre:

Normative:

November

100

ON 5/20/2015

Civili

DIN

01/10/2001

mail:

10

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar M. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

000073



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO DIAMANTE

Versión: 1

Año: 2025

Nombre Proyecto: *CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE*

ADRE EN EL DISTRITO DE ESTO CAPITAL

YU. CIPA, DISTRITO DE ESTO CAPITAL, DISTRITO DE ESTO CAPITAL, DISTRITO DE ESTO CAPITAL

FECHA: 02-05-25

UBICACIÓN: YUGOSLAVIA, ENCONCADO

RELACIÓN DE TRABAJADORES V'B*

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

HERRAMIENTAS/EQUIPOS

ESCALERAS

ANDAMIOS

AMOLADORAS

MARTILLOS, COMBAS

TALACRO

EXTENSIONES ELÉCTRICAS

ALCANTARILLOS

ELEVADORES

SERRUCHOS, SIERRAS

PICO

PALA

LLAVES/LLAVES

DESTORNILLADORES

PUNTAS

CINCELES

SOPLETES

EQUIPOS DE SOLDADURA

SIERRA CIRCULAR

OTROS

SEGURIDAD

DE SEGURIDAD

DE SEGURIDAD

REFLECTIVO

TRABAJO

DORES

OREAS DE ODO *

TEGRAL

EJO

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

LLAVES/LLAVES

RIESGO ASOC. / CONSECUCENCIA (*)

NRI

MEDIDAS DE CONTROL

NRR

PELIGROS (*)

ACTIVIDADES O TAREAS DEL DÍA

RIESGO ASOC. / CONSECUCENCIA (*)

NRI

RIESGO ASOC. / CONSECUCENCIA (*)

NRI

RIESGO ASOC. / CONSECUCENCIA (*)

NRI

RIESGO ASOC. / CONSECUCENCIA (*)

NRI

RIESGO ASOC. / CONSECUCENCIA (*)

NRI

RIESGO ASOC. / CONSECUCENCIA (*)

NRI

RIESGO ASOC. / CONSECUCENCIA (*)

NRI

No presentaban documentos

Físicos Ni Documentos

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Carlos S. Brindley Salinas

Ing. Carlos S. Brindley Salinas

Ing. Carlos S. Brindley Salinas

Ing. Carlos S. Brindley Salinas

Ing. Carlos S. Brindley Salinas

Ing. Carlos S. Brindley Salinas

Ing. Carlos S. Brindley Salinas

Ing. Carlos S. Brindley Salinas

Ing. Carlos S. Brindley Salinas

Ing. Carlos S. Brindley Salinas

Ing. Carlos S. Brindley Salinas

Ing. Carlos S. Brindley Salinas

Ing. Carlos S. Brindley Salinas

Ing. Carlos S. Brindley Salinas

Ing. Carlos S. Brindley Salinas

Ing. Carlos S. Brindley Salinas

Responsable de la Ejecución del Trabajo de la contratista

Nombre:

DNI:

Responsable Contratista

Nombre:

DNI:

Responsable de la Ejecución del Trabajo de la contratista

Nombre:

DNI:

Responsable Contratista

Nombre:

DNI:

000071

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz

Ing. Cesar N. Rivera Diaz

Ing. Cesar N. Rivera Diaz

Ing. Cesar N. Rivera Diaz

CONSORCIO DIAMANTE

Versión: 1

Año: 2025

Nombre Proyecto: TRANSITO DE PERSONAL (Cuerpo de)

FECHA: 03-05-25

UBICACIÓN: YUGOSLAYA - RINCONADA

EPP	HERRAMIENTAS/EQUIPOS		RELACION DE TRABAJADORES / V'B*	
	ESCALERAS	DESTORNILLADORES	01	02
SEGURIDAD	ANDAMIOS	PUNTAS	03	04
DE SEGURIDAD	MARTILLOS, COMBAS	CINCELES	05	06
REFLECTIVO	TALADRO	SOPLETES	07	08
TRABAJO	EXTENSIONES ELÉCTRICAS	EQUIPOS DE SOLDADURA	09	10
JOES	ALCATES	SIERRA CIRCULAR	11	12
	ELEVADORES	OTROS		
DRES DE OJO	SERRUCHOS, SIERRAS			
TEGRAL	PICO			
JO	PALA			
	LLAVES/DADES			

ACTIVIDADES O TAREAS DEL DÍA

RIESGO ASOC. / CONSECUENCIA (*)

PELIGROS (*)

NRI

MEDIDAS DE CONTROL

NRR

No Presentar los Documentos

FISICAS NI VIRTUALES

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Xivera Dias

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Xivera Dias

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Xivera Dias

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Xivera Dias

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Xivera Dias

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Xivera Dias

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Xivera Dias

000069



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO DIAMANTE

CONSORCIO DIAMANTE

Versión: 1

Año: 2025

Nombre Proveedor: **CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE ARTE EN EL DISTRITO DE BARRIO CHAUTOMAYAN Y EL DISTRITO DE CAJAS, MUNICIPIO VILCO**

FECHA: **05-05-25** UBICACIÓN: **YUGOSLAVIA**

EPP		HERRAMIENTAS/EQUIPOS		RELACIÓN DE TRABAJADORES / V°B°		FIRMA		Herramienta de trabajo:	
1. SEGURIDAD		ESCALERAS	DESTORNILLADORES	01.				Nombre:	
2. SEGURIDAD		ANDAMIOS	PUNTAS	02.				Horario estimado de inicio:	
3. SEGURIDAD		AMOLADORAS	CINCELES	03.				Horario:	
4. REFLECTIVO		MARTILLOS, COMBAS	BOPILETES	04.					
TRABAJO		TALADRO	EQUIPOS DE SOLDADURA	05.					
DORES		EXTENSIONES ELÉCTRICAS	SIERRA CIRCULAR	06.					
5.		AUCATES	OTROS	07.					
6. FOROS DE OÍDO		ELEVADORES		08.					
7. INTEGRAL		SERRUCHOS, SIERRAS		09.					
8.		PICO		10.					
9.		PAJA		11.					
10.		LLAVES/LLAVES		12.					

ACTIVIDADES O TAREAS DEL DÍA

RIESGO ASOC. / CONSECUENCIA (*)

NRB

MEDIDAS DE CONTROL

NRR

NO PRESENTAR DOCUMENTOS

FÍSICOS NI VIRTUALES

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cristian S. Briceño Salinas

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional

CIP 257479

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cristian S. Briceño Salinas

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional

CIP 257479

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cristian S. Briceño Salinas

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional

CIP 257479

000068

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO DIAMANTE

CONSORCIO DIAMANTE		Versión: 1		Año: 2025	
ID:	FECHA: 06-05-25	UBICACIÓN: YUGOZLAHUA		Nombre Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE	
ID:	CONTRATISTA: CORTE Y EXCAVACION		DE EN EL SISTEMA DE RIESGO CUALITATIVO		
EPP		HERRAMIENTAS/EQUIPOS		RELACIÓN DE TRABAJADORES / V'B*	
E SEGURIDAD	ESCALERAS	DESTORNILLADORES	01		
IE SEGURIDAD	ANDAMIOS	PUNTAS	02		
REFLECTIVO	AMOLADORAS	CINCELES	03		
TRABAJO	MARTILLOS, COMBAS	SOPLETES	04		
DORES	TALADRO	EQUIPOS DE SOLDADURA	05		
	EXTENSIONES ELÉCTRICAS	SIERRA CIRCULAR	06		
	ALCATES	OTROS	07		
ORES DE OIDO	ELEVADORES		08		
TEGRAL	SERRUCHOS, SIERRAS		09		
	PICO		10		
	PALA		11		
	LLAVES/LLAVES		12		

ACTIVIDADES O TAREAS DEL DÍA	PELIGROS (*)	RIESGO ASOC. / CONSECUENCIA (*)	NRI	MEDIDAS DE CONTROL	NRR
<p>NO PRESENTAN DOCUMENTOS</p> <p>FÍSICOS N° VIRTUALES</p> <p>CONSORCIO DIAMANTE</p> <p>Ing. Virgilio S. Briceño Salinas</p> <p>COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</p> <p>CIP 257679</p>					

A NO LIMITATIVA JUNTA	Responsable de la Ejecución del Trabajo de la contratista.	Responsable Contratista.	V'B* Residente Supervisor Encargado de Obra	V'B* Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
DNI:	DNI:	DNI:	DNI:	DNI:

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN

000066

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
(ATS)[illegible]

CONSORCIO DOSSMANTE

Ing. Celsa N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

000065

CONSORCIO DOSSMANTE



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO DIAMANTE

Versión: 1

Año: 2025

BO: CONTRATISTA: FECHA: 07-05-25 UBICACIÓN: YUGOSLAVIA

JO: Nombre Proyecto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE RIESGO EN YUGOSLAVIA

EPP: EQUIPO Y EXCAVACION

HERRAMIENTAS/EQUIPOS		RELACION DE TRABAJADORES / VB		DNI	FIRMA
EPP					
DE SEGURIDAD	ESCALERAS	DESTORNILLADORES	01		
DE SEGURIDAD	ANDAMIOS	PUNTAS	02		
DE SEGURIDAD	AVOLADORAS	CINCELES	03		
REFLECTIVO	MARTILLOS, COMBAS	SCPLETES	04		
TRABAJO	TAJADRO	EQUIPOS DE SOLDADURA	05		
DONES	EXTENSIONES ELECTRICAS	SIERRA CIRCULAR	06		
	ALICATES	OTROS	07		
FOROS DE OIDO	ELEVADORES		08		
ITEGRAL	SERRUCHOS SIERRAS		09		
	PALO		10		
EJO	PALA		11		
	LLAVESADROS		12		

ACTIVIDADES O TAREAS DEL DIA

RIESGO ASOC. / CONSECUENCIA (*)

NRI

MEDIDAS DE CONTROL

NRR

Horario de inicio:

Horario estimado de término:

El incumplimiento de las medidas preventivas propuestas en este formato podrá originar la suspensión de los trabajos.

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Carlos S. Briceño Salinas

Encargado de la ejecución de las actividades

CIP: 257671

VB* Residente Supervisor Encargado de Obra

Nombre:

DNI:

VB* Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional

Nombre:

DNI:

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Carlos S. Briceño Salinas

Encargado de la ejecución de las actividades

CIP: 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Carlos S. Briceño Salinas

Encargado de la ejecución de las actividades

CIP: 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Carlos S. Briceño Salinas

Encargado de la ejecución de las actividades

CIP: 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Carlos S. Briceño Salinas

Encargado de la ejecución de las actividades

CIP: 257671

000064

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO DIAMANTE

CONSORCIO DIAMANTE	CONTRATISTA:	FECHA:	Nombre Proyecto:
Versión: 1	UBICACIÓN:	08-05-25	CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO DE ACCESO A LA ZONA DE BARRIO CHA VIT-NOVA
Año: 2025			14 DE ENERO, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA VÍCTOR

EPP	HERRAMIENTAS/EQUIPOS		RELACION DE TRABAJADORES / V°B°	DNI	FIRMA
E SEGURIDAD	ESCALERAS	DESTORNILLADORES	01		
E SEGURIDAD	ANDAMIOS	PUNTAS	02		
DE SEGURIDAD	AMOLADORAS	CINCELES	03		
REFLECTIVO	MARTILLOS, COMBAS	SOPLETES	04		
TRABAJO	TALADRO	EQUIPOS DE SOLDADURA	05		
XORES	EXTENSIONES ELECTRICAS	SIERRA CIRCULAR	06		
	ALCATES	OTROS	07		
ORES DE ODO	ELEVADORES		08		
TEORAL	SERRUCHOS, SIERRAS		09		
	PICO		10		
EJO	PALA		11		
	LLAVES/LLAVES		12		

ACTIVIDADES O TAREAS DEL DÍA	PELIGROS (*)	RESGO ASOC. / CONSECUENCIA (*)	NRI	MEDIDAS DE CONTROL	NRR
------------------------------	--------------	--------------------------------	-----	--------------------	-----

No Presentaron Documentos

Físicos Ni Virtuales

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Carlos S. Briceño Salinas

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional

CIP 257679

A NO LIMITATIVA JUNTA	Responsable de la Ejecución del Trabajo de la Contratista.	Responsable Contratista.	V°B° Residente/ Supervisor/ Encargado de Obra	V°B° Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
DNI:	DNI:	DNI:	DNI:	DNI:

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Carlos S. Briceño Salinas

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional

CIP 257679

000062

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONSORCIO DIAMANTE

CONSORCIO DIAMANTE		Versión: 1		Año: 2025	
IO:	CONTRATISTA:	FECHA:	Nombre Proyecto:		
IO:	CONSORCIO DIAMANTE	08-05-23	Construcción de Obras de Arbolado		
UBICACIÓN:		Sistema de riego chorrochic y 2			
HERRAMIENTAS/EQUIPOS		RELACIÓN DE TRABAJADORES / V.B.			
EPP	DESCRIPCIÓN	DNI			
SEGURIDAD	ESCALERAS	FIRMA			
SEGURIDAD	ANDAMIOS	Hora de Inicio:			
REFLECTIVO	AMOLADORAS	Hora:			
TRABAJO	MARTILLOS, COMBAS	Hora de finalización de firmas:			
XORES	TALADRO	Hora:			
	EXTENSIONES ELÉCTRICAS	El incumplimiento de las medidas preventivas propuestas en este formato podrá originar la suspensión de los trabajos.			
	ALICATES				
ORES DE ODO	ELEVADORES				
TEGRAL	SERRUCHOS, SIERRAS				
	PIZO				
	PALA				
	LLAVES/LLAVES				

ACTIVIDADES O TAREAS DEL DÍA	RIESGO ASOC. / CONSECUENCIA (*)	NRI	MEDIDAS DE CONTROL	NRR
<p><i>No Presentaron Documentos Físicos</i></p> <p><i>Ni Virtuales</i></p> <p>CONSORCIO DIAMANTE</p> <p>Ing. Carlos S. Briceño Salinas</p> <p>Representante Común</p> <p>CIP: 237871</p>				

Responsable de la Ejecución del Trabajo de la contratista.		Responsable Contratista.		V.B. Residente Supervisor Encargado de Obra		V.B. Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional	
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
DNI:	DNI:	DNI:	DNI:	DNI:	DNI:	DNI:	DNI:
CONSORCIO DIAMANTE		CONSORCIO DIAMANTE		CONSORCIO DIAMANTE		CONSORCIO DIAMANTE	
Ing. Carlos S. Briceño Salinas		Ing. Carlos S. Briceño Salinas		Ing. Carlos S. Briceño Salinas		Ing. Carlos S. Briceño Salinas	
Representante Común		Representante Común		Representante Común		Representante Común	

000061



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000060

A. SCTR DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257071

CONSORCIO DIAMANTE
INGENIERO A. SCTR DE SUPERVISIÓN
CIP 34480

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar W. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN

CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIÓN Y SALUD

CONSORCIO DIAMANTE

RUC: 20613952714

VIGENCIA: 10/04/2025 12:24 al 09/05/2025

ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados líneas abajo, conforme al Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de salud de trabajo de riesgo y pensión del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo*.

Contrato SCTR - Salud N°: 849657

Póliza SCTR - Pensión N°: 9000257564

Sede : PRINCIPAL

Nro.	Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nro. Documento
1	CHRISTY STEEPHANE	BRICEÑO	SALINAS	DNI - 70503113
2	JOSE RAUL	CALDAS	LEON	DNI - 45090543
3	RONAL ROLANDO	CASTAÑEDA	NIEVES	DNI - 40360957
4	EDWIN ALDAIR	CERDA	NEIRA	DNI - 71729188
5	ANIBAL	CHUDAN	HEREDIA	DNI - 17531731
6	JOHNNY LORENZ	GALVEZ	CUBAS	DNI - 47146121
7	JOSEPH MARLON	GONZALES	BRAVO	DNI - 70433732
8	JUAN ANTONIO	JIMENEZ	CARRASCO	DNI - 16656753
9	GRACIELA LILIANA	OLASCOAGA	LLICAN	DNI - 42592428
10	ANGIE SHIRLEY	REBAZA	REYES	DNI - 72223706
11	CESAR NESTOR	RIVERA	DIAZ	DNI - 26637277
12	JOE DCONING	YEPEZ	CRUZADO	DNI - 70870758

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente CONSORCIO DIAMANTE para los fines que considere pertinentes.

Lima, 10 de Abril de 2025

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGUROS Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257671


CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Romero C.
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP: 54850



VALIDA AQUÍ ESTA CONSTANCIA

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar M. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

*La cobertura del SCTR pensión no comprende actividades y trabajos de metalúrgica, siderúrgica, explotación de minas y canteras, ni pesca. Tampoco se encuentran dentro de esta cobertura las actividades realizadas en yacimientos mineros (superficie o subterránea) que estén o no vinculadas a la extracción de minerales, a menos que dichas actividades y su ubicación de riesgo sean consignados explícitamente en las Condiciones Particulares de la Póliza SCTR pensión, o que las actividades específicas de cobertura se refieran únicamente a transporte de personal, (ii) maquinaria, (iii) equipos, (iv) insumos y/o (v) minerales, con ubicación de riesgo en yacimientos mineros de superficie (no aplica para socavones), y que estas actividades no incluyan ni se vinculen con alquiler, mantenimiento o reparación de maquinaria pesada.



Carlos Alfredo Chavarriaga Ceballos
Representante Legal
Sanitas Perú S.A. EPS



Luis Asmat Custodio
Gerente de Operaciones
Creceer Seguros SA



Juan Carlos Ordoñez Aguilar
Vicepresidente Comercial
Creceer Seguros SA

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
JEFE DE SUPERVISORIA
CIP 54850

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceno Salinas
ESPECIALISTA EN SEGUROS Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 247671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

*La cobertura del SCTR pensión no comprende actividades y trabajos de metalúrgica, siderúrgica, explotación de minas y canteras, ni pesca. Tampoco se encuentran dentro de esta cobertura las actividades realizadas en yacimientos mineros (superficie o socavón) que estén o no vinculadas a la extracción de minerales, a menos que dichas actividades y su ubicación de riesgo sean consignadas explícitamente en las Condiciones Particulares de la Póliza SCTR pensión, o que las actividades específicas de cobertura se refieran únicamente a transporte de (i) personal, (ii) maquinaria, (iii) equipos, (iv) insumos y/o (v) minerales, con ubicación de riesgo en yacimientos mineros de superficie (no aplica para socavones), y que estas actividades no incluyan ni se vinculen con alquiler, mantenimiento o reparación de maquinaria pesada.

CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIÓN Y SALUD

CONSORCIO DIAMANTE

RUC: 20613952714

VIGENCIA: 10/05/2025 00:00 al 09/06/2025

ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados líneas abajo, conforme al Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de salud de trabajo de riesgo y pensión del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo*.

Contrato SCTR - Salud N°: 849657

Póliza SCTR - Pensión N°: 9000257564

Sede : PRINCIPAL

Nro.	Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nro. Documento
1	CHRISTY STTEPHANE	BRICEÑO	SALINAS	DNI - 70503113
2	JOSE RAUL	CALDAS	LEON	DNI - 45090543
3	RONAL ROLANDO	CASTAÑEDA	NIEVES	DNI - 40360957
4	EDWIN ALDAIR	CERDA	NEIRA	DNI - 71729388
5	ANIBAL	CHUDAN	HEREDIA	DNI - 17531731
6	JOHNNY LORENZ	GALVEZ	CUBAS	DNI - 47146121
7	JOSEPH MARLON	GONZALES	BRAVO	DNI - 70433732
8	JUAN ANTONIO	JIMENEZ	CARRASCO	DNI - 16656753
9	GRACIELA LILIANA	OLASCOAGA	LLICAN	DNI - 42592428
10	ANGIE SHIRLEY	REBAZA	REYES	DNI - 72223706
11	CESAR NESTOR	RIVERA	DIAZ	DNI - 26637277
12	JOE DCONING	YEPEZ	CRUZADO	DNI - 70870758

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente CONSORCIO DIAMANTE para los fines que considere pertinentes.

Lima, 03 de Mayo de 2025

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
AUTOMATA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CUP 257671


CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Rivera Diaz
JEFE DE SUPERVISIÓN
CUP 24850



VALIDA AQUÍ ESTA CONSTANCIA

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar M. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

*La cobertura del SCTR pensión no comprende actividades y trabajos de metalúrgica, siderúrgica, explotación de minas y canteras, ni pesca. Tampoco se encuentran dentro de esta cobertura las actividades realizadas en yacimientos mineros (superficie o socavón) que estén o no vinculadas a la extracción de minerales, a menos que dichas actividades y su ubicación de riesgo sean consignadas explícitamente en las Condiciones Particulares de la Póliza SCTR pensión, o que las actividades específicas de cobertura se refieran únicamente a transporte de (i) personal, (ii) maquinaria, (iii) equipos, (iv) insumos y/o (v) minerales, con ubicación de riesgo en yacimientos mineros de superficie (no aplica para socavones), y que éstas actividades no incluyan ni se vinculen con alquiler, mantenimiento o reparación de maquinaria pesada.



Carlos Alfredo Chavarriaga Ceballos
Representante Legal
Sanitas Perú S.A. EPS



Luis Asmat Custodio
Gerente de Operaciones
Creceer Seguros SA



Juan Carlos Ordoñez Aguilar
Vicepresidente Comercial
Creceer Seguros SA



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan O. Jimenez Carrizosa
JEFE DE SUPERVISION
CIP 34828



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGUROS Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671



CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

*La cobertura del SCTR pensión no comprende actividades y trabajos de metalúrgica, siderúrgica, explotación de minas y canteras, ni pesca. Tampoco se encuentran dentro de esta cobertura las actividades realizadas en yacimientos mineros (superficie o socavón) que estén o no vinculadas a la extracción de minerales, a menos que dichas actividades y su ubicación de riesgo sean consignadas explícitamente en las Condiciones Particulares de la Póliza SCTR pensión, o que las actividades específicas de cobertura se refieran únicamente a transporte de (i) personal, (ii) maquinaria, (iii) equipos, (iv) insumos y/o (v) minerales, con ubicación de riesgo en yacimientos mineros de superficie (no aplica para socavones), y que estas actividades no incluyan ni se vinculen con alquiler, mantenimiento o reparación de maquinaria pesada.



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



000051

B. CHECK LIST (CAMIONETAS) DE SUPERVISION

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Rivera Díaz
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54838

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. César M. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



00005

B.1. MODELO: POER

SERIE:

LGWDBF19XNJ614123

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Carrasco
E.S. DE SUPERVISIÓN
CIP 54795

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 267671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 02/05/2025

000053

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD		CD-SST-CHECKLIST-001	
CHECK LIST CAMONETA		Versión	1
		Fecha:	13/04/2025
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE: EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"	
DATOS DE VERIFICACIÓN			
MARCA	Great Wall		PLACA
AÑO	2021		MODELO
MANTENIMIENTO			SERIE
MARCAR CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA		OBSERVACIONES	
GENERAL	ASIENTOS	X	
	LIMPIEZA	X	
	ESTADO DE PUESTOS	X	
	PARABRISAS	X	
	ESTADO DE CABINA	X	
	ESTADO DE DIRECCIÓN Y VOLANTE	X	
	PARACHOQUES	X	
	ESTADO DE COMANDOS	X	
	ACELERADOR	X	
	FRENOS	X	
NEUMÁTICOS	QATA	X	
	LLAVES DE RUEDA	X	
LUCES	PRIMER EJE	X	
	SEGUNDO EJE	X	
	LUCES ALTAS	X	
	LUCES BAJAS	X	
	LUCES DE TABLERO	X	
	LUZ INTERIOR	X	
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X	
	TERCERA LUZ DE FRENO	X	
	LUCES DE FRENO	X	
	INTERMITENTES DELANTEROS	X	
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X	
	ALARMA DE RETROCESO		X
	BOCINA	X	
	BOTIGUIN	X	
DOCUMENTACIÓN	ESPEJOS	X	
	CINTURON DE SEGURIDAD	X	
	EXTINTOR PQS	X	
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X	
	PERMISO DE CIRCULACION	X	
COMENTARIOS:	REVISIÓN TÉCNICA	X	
	SEGURO OBLIGATORIO	X	
MANTENIMIENTO		X	
COMENTARIOS:		CONSORCIO DIAMANTE	
		DOCUMENTOS DEL EQUIPO	
		SI	
		NO	
		CONSORCIO DIAMANTE	
		Ing. Juan A. Domínguez Carrasco	
		VIR SUPERVISOR RESIDENTE	
		CIP. 54650	
		VIR INGENIERO DE SEGURIDAD	

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP. 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Domínguez Carrasco
VIR SUPERVISOR RESIDENTE
CIP. 54650

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar R. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 03/05/2025

000052

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
CHECK LIST CAMIONETA		Versión						1	
Fecha:		13/04/2025							
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
DATOS DE VERIFICACIÓN									
MARCA	Great Wall						PLACA	TBC-816	
AÑO	2021						MODELO	Paoi	
MANTENIMIENTO							SERIE	L640DBF19207614123	
MARCAR CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA									
	SI	NO	NA	B	M	R	OBSERVACIONES		
GENERAL	ASIENTOS	X							
	LMPIEZA	X							
	ESTADO DE PUENTES	X							
	PARABRISAS	X							
	ESTADO DE CABINA	X							
	ESTADO DE DIRECCIÓN Y VOLANTE	X							
	PARACHOQUES	X							
	ESTADO DE COMANDOS	X							
	ACELERADOR	X							
	FRENOS	X							
NEUMÁTICOS	GATA	X							
	LLAVES DE RUEDA	X							
LUCES	PRIMER EJE	X							
	SEGUNDO EJE	X							
	LUCES ALTAS	X							
	LUCES BAJAS	X							
	LUCES DE TABLERO	X							
	LUZ INTERIOR	X							
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X							
	TERCERA LUZ DE FRENO	X							
	LUCES DE FRENO	X							
	INTERMITENTES DELANTEROS	X							
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X							
	ALARMA DE RETROCESO		X						
	BOCINA	X							
	BOTIQUIN	X							
	ESPEJOS	X							
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X							
	EXTINTOR PQS	X							
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X							
	PERMISO DE CIRCULACIÓN	X							
	REVISIÓN TÉCNICA	X							
COMENTARIOS	SEGURO OBLIGATORIO	X							
	MANTENIMIENTO	X							
DOCUMENTOS DEL EQUIPO						SI		NO	
Ing. Cesar N. Rivera Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP: 257671						Ing. Juan A. Jimenez Carrasco OFI DE SUPERVISIÓN CIP: 08850			
VB* INGENIERO DE SEGURIDAD						VB* SUPERVISOR RESIDENTE			

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
OFI DE SUPERVISIÓN
CIP: 08850

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 05/05/2025

000051

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-887-CHECKLIST-601	
		CHECK LIST CAMIONETA						Version	1
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
		DATOS DE VERIFICACIÓN						PLACA	12C-376
MARCA	Great Wall							MODELO	1000
AÑO	2021							SERIE	16WDBF9XN3614189
MANTENIMIENTO								OBSERVACIONES	
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA									
GENERAL	ASIENTOS	SI	NO	N/A	B	M	R		
	LIMPIEZA	X			X				
	ESTADO DE PUENTES	X			X				
	PARABRISAS	X			X				
	ESTADO DE CABINA	X			X				
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X			X				
	PARACHOQUES	X			X				
	ESTADO DE COMANDOS	X			X				
	ACELERADOR	X			X				
	FRENOS	X			X				
NEUMÁTICOS	GATA	X			X				
	LLAVES DE RUEDA	X			X				
	PRIMER EJE	X			X				
LUCES	SEGUNDO EJE	X			X				
	LUCES ALTAS	X			X				
	LUCES BAJAS	X			X				
	LUCES DE TABLERO	X			X				
	LUZ INTERIOR	X			X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X				
	LUCES DE FRENO	X			X				
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X				
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X			X				
	ALARMA DE RETROCESO	X			X				
	BOCINA	X		X	X				
	BOTIQUIN	X			X				
	ESPEJOS	X			X				
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X				
	EXTINTOR PQS	X			X				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X				
	PERMISO DE CIRCULACION	X			X				
COMENTARIOS:	REVISIÓN TÉCNICA	X			X				
	SEGURO OBLIGATORIO	X			X				
	MANTENIMIENTO	X			X				
COMENTARIOS:		<p>CONSORCIO DIAMANTE</p> <p>Ing. Christy S. Briceno Salinas</p> <p>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</p> <p>CIP: 257671</p>						DOCUMENTOS DEL EQUIPO	
VB° INGENIERO DE SEGURIDAD								<p>CONSORCIO DIAMANTE</p> <p>Ing. Juan A. Jimenez Carrasco</p> <p>VB° SUPERVISOR RESIDENTE</p>	

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceno Salinas

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CIP: 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jimenez Carrasco

VB° SUPERVISOR RESIDENTE

CIP: 24850


CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz

REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 06/05/2025

000050

		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
		CHECK LIST CAMIONETA						Version	1
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE, EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
DATOS DE VERIFICACIÓN									
MARCA	Great Wall						PLACA	TBC-876	
AÑO	2021						MODELO	H50	
MANTENIMIENTO							SERIE	46430519	
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA									
GENERAL	ASIENTOS	SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES	
	LIMPIEZA	X			X				
	ESTADO DE PUENTES	X			X				
	PARABRISAS	X			X				
	ESTADO DE CABINA	X			X				
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X			X				
	PARACHOQUES	X			X				
	ESTADO DE COMANDOS	X			X				
	ACELERADOR	X			X				
	FRENOS	X			X				
NEUMÁTICOS	GATA	X			X				
	LLAVES DE RUEDA	X			X				
LUCES	PRIMER EJE	X			X				
	SEGUNDO EJE	X			X				
	LUCES ALTAS	X			X				
	LUCES BAJAS	X			X				
	LUCES DE TABLERO	X			X				
	LUZ INTERIOR	X			X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X				
	LUCES DE FRENO	X			X				
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X				
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X			X				
	ALARMA DE RETROCESO		X						
	BOCINA	X			X				
	BOTIQUIN	X			X				
	ESPEJOS	X			X				
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X				
	EXTINTOR POS	X			X				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X				
	PERMISO DE CIRCULACION	X			X				
	REVISIÓN TÉCNICA	X			X				
COMENTARIOS:	SEGURO OBLIGATORIO	X			X				
	MANTENIMIENTO	X			X				
COMENTARIOS:		CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DEL EQUIPO	CONSORCIO DIAMANTE
		Ing. Cesar S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP: 257871						Ing. Juan A. Jimenez Carrasco JEFE DE SUPERVISION CIP: 54050	
		VB* INGENIERO DE SEGURIDAD						VB* SUPERVISOR RESIDENTE	

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257871

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP: 54050

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 07/05/2025

000049

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-88T-CHECKLIST-901	
CHECK LIST CAMIONETA		Versión						1	
Fecha:		13/04/2025							
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
DATOS DE VERIFICACIÓN									
MARCA		Great Wall						PLACA	
AÑO		2021						MODELO	
MANTENIMIENTO								SÉRIE	
MARCAR CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA								OBSERVACIONES	
GENERAL		SI	NO	N/A	B	M	R		
ASIENTOS		X			X				
LIMPIEZA		X			X				
ESTADO DE PUENTES		X			X				
PARABRISAS		X			X				
ESTADO DE CABINA		X			X				
ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE		X			X				
PARACHOQUES		X			X				
ESTADO DE COMANDOS		X			X				
ACELERADOR		X			X				
FRENSOS		X			X				
GATA		X			X				
LLAVES DE RUEDA		X			X				
NEUMÁTICOS		X			X				
PRIMER EJE		X			X				
SEGUNDO EJE		X			X				
LUCES		X			X				
LUCES ALTAS		X			X				
LUCES BAJAS		X			X				
LUCES DE TABLERO		X			X				
LUZ INTERIOR		X			X				
LUCES DE ESTACIONAMIENTO		X			X				
TERCERA LUZ DE FRENO		X			X				
LUCES DE FRENO		X			X				
INTERMITENTES DELANTEROS		X			X				
LUCES DE RETROCESO		X			X				
ALARMA DE RETROCESO			X		X				
ACCESORIOS		X			X				
BOCINA		X			X				
BOTIQUIN		X			X				
ESPEJOS		X			X				
CINTURON DE SEGURIDAD		X			X				
EXTINTOR POS		X			X				
DOCUMENTACIÓN		X			X				
LICENCIA DE CONDUCTOR		X			X				
PERMISO DE CIRCULACION		X			X				
REVISIÓN TÉCNICA		X			X				
SEGURO OBLIGATORIO		X			X				
MANTENIMIENTO		X			X				
COMENTARIOS:		CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DEL EQUIPO	
		Ing. Christy S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP: 257671						SI NO	
VB INGENIERO DE SEGURIDAD								VB SUPERVISOR RESIDENTE	
								Ing. Juan A. Amador Carrasco JEFE DE SUPERVISIÓN CIP: 54950	

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Amador Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP: 54950

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 08/05/2025

CONSorcio DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
CHECK LIST CAMIONETA		Versión						1	
Fecha:		13/04/2025							
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
DATOS DE VERIFICACIÓN									
MARCA		Coast Wall						PLACA	
AÑO		2021						MODELO	
MANTENIMIENTO								SÉRIE 26W28F19	
MARCAR CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES	
GENERAL	ASIENTOS	X			X				
	LIMPIEZA	X			X				
	ESTADO DE PUENTES	X			X				
	PARABRISAS	X			X				
	ESTADO DE CABINA	X			X				
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X			X				
	PARACHOQUES	X			X				
	ESTADO DE COMANDOS	X			X				
	ACELERADOR	X			X				
	FRENOS	X			X				
GATA	X			X					
	LLAVES DE RUEDA	X			X				
NEUMÁTICOS	PRIMER EJE	X			X				
	SEGUNDO EJE	X			X				
LUCES	LUCES ALTAS	X			X				
	LUCES BAJAS	X			X				
	LUCES DE TABLERO	X			X				
	LUZ INTERIOR	X			X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X				
	LUCES DE FRENO	X			X				
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X				
	LUCES DE RETROCESO	X			X				
	ALARMA DE RETROCESO	X			X				
ACCESORIOS	BOCINA	X			X				
	BOTIQUIN	X			X				
	ESPEJOS	X			X				
	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X				
	EXTINTOR PQS	X			X				
DOCUMENTACIÓN	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X				
	PERMISO DE CIRCULACIÓN	X			X				
	REVISIÓN TÉCNICA	X			X				
	SEGURO OBLIGATORIO	X			X				
	MANTENIMIENTO	X			X				
COMENTARIOS:	CONSorcio DIAMANTE						DOCUMENTOS DEL EQUIPO		NO
Ing. Christy S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIPR 257671						Ing. Juan A. Jiménez Carrasco JEFE DE SUPERVISIÓN CIPR 54850			
VB* INGENIERO DE SEGURIDAD						VB* SUPERVISOR RESIDENTE			

CONSorcio DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIPR 257671

CONSorcio DIAMANTE

Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIPR 54850

CONSorcio DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 09/05/2025

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD						CD-88Y-CHECKLIST-001	
CHECK LIST CAMIONETA		Versión						1	
Fecha:		13/04/2025							
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
DATOS DE VERIFICACIÓN									
MARCA		Great Wall						PLACA	
AÑO		2021						10C-826	
MANTENIMIENTO								MODELO	
								P001	
								SERIE	
								2GWDBF19XN3614723	
OBSERVACIONES									
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA									
		SI	NO	N/A	B	M	R		
GENERAL	ASIENTOS	X			X				
	LIMPIEZA	X			X				
	ESTADO DE PUENTES	X			X				
	PARABRISAS	X			X				
	ESTADO DE CABINA	X			X				
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X			X				
	PARACHOQUES	X			X				
	ESTADO DE COMANDOS	X			X				
	ACELERADOR	X			X				
	FRENOS	X			X				
NEUMÁTICOS	GATA	X			X				
	LLAVES DE RUEDA	X			X				
LUCES	PRIMER EJE	X			X				
	SEGUNDO EJE	X			X				
	LUCES ALTAS	X			X				
	LUCES BAJAS	X			X				
	LUCES DE TABLERO	X			X				
	LUZ INTERIOR	X			X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X				
	LUCES DE FRENO	X			X				
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X				
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X			X				
	ALARMA DE RETROCESO		X						
	BOCINA	X			X				
	BOTIQUIN	X			X				
	ESPEJOS	X			X				
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X				
	EXTINTOR Pqs	X			X				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X				
	PERMISO DE CIRCULACION	X			X				
	REVISION TECNICA	X			X				
COMENTARIOS:	SEGURO OBLIGATORIO	X			X				
	MANTENIMIENTO	X			X				
COMENTARIOS:		CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DEL CONSORCIO DIAMANTE	
		Ing. Christo S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP 257671						Ing. Juan A. Amador Carrasco JEFE DE SUPERVISION CIP 24850	
		VB* INGENIERO DE SEGURIDAD						VB* SUPERVISOR RESIDENTE	

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christo S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Amador Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 24850

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 10/05/2025

000046

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
		CHECK LIST CAMIONETA						Versión	1
								Fecha:	13/04/2025
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
DATOS DE VERIFICACION									
MARCA	Great Wall							PLACA	10x-876
AÑO	2021							MODELO	10x
MANTENIMIENTO								SERIE	16W3BF19XN361423
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA									
		SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES	
GENERAL	ASIENTOS	X							
	LIMPIEZA	X							
	ESTADO DE PUENTES	X							
	PARABRISAS	X							
	ESTADO DE CABINA	X							
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X							
	PARACHOQUES	X							
	ESTADO DE COMANDOS	X							
	ACELERADOR	X							
	FRENOS	X							
NEUMÁTICOS	GATA	X							
	LLAVES DE RUEDA	X							
LUCES	PRIMER EJE	X							
	SEGUNDO EJE	X							
	LUCES ALTAS	X							
	LUCES BAJAS	X							
	LUCES DE TABLERO	X							
	LUZ INTERIOR	X							
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X							
	TERCERA LUZ DE FRENO	X							
	LUCES DE FRENO	X							
	INTERMITENTES DELANTEROS	X							
ACCESORIOS	LUCES DE RETRÓCESO	X							
	ALARMA DE RETRÓCESO		X						
	BOCINA	X							
	BOTIQUIN	X							
	ESPEJOS	X							
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X							
	EXTINTOR PQS	X							
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X							
	PERMISO DE CIRCULACION	X							
	REVISION TECNICA	X							
COMENTARIOS:	SEGURO OBLIGATORIO	X							
	MANTENIMIENTO	X							
COMENTARIOS:		CONSORCIO DIAMANTE				DOCUMENTOS DEL EQUIPO		SI	NO
		Ing. Christy S. Briceño Salinas CONSORCIO DIAMANTE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP 257671				CONSORCIO DIAMANTE			
VB INGENIERO DE SEGURIDAD						Ing. Juan A. Llanos Carrasco VB SUPERVISOR RESIDENTE CIP 34850			

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceño Salinas
CONSORCIO DIAMANTE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Llanos Carrasco
VB SUPERVISOR RESIDENTE
CIP 34850

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar M. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 12/05/2025

000045

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001		
		CHECK LIST CAMIONETA						Version	1	
								Fecha:	13/04/2025	
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHE I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"								
MARCA		GREAT WALL						PLACA	18C-876	
AÑO		2024						MODELO	Poco	
MANTENIMIENTO								SERIE	26W30579 / 26J614123	
DATOS DE VERIFICACIÓN										
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES		
GENERAL	ASIENTOS	X								
	LIMPIEZA	X								
	ESTADO DE PUENTES	X								
	PARABRISAS	X								
	ESTADO DE CABINA	X								
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X								
	PARACHOCQUES	X								
	ESTADO DE COMANDOS	X								
	ACELERADOR	X								
	FRENOS	X								
NEUMÁTICOS	GATA	X								
	LLAVES DE RUEDA	X								
	PRIMER EJE	X								
LUCES	SEGUNDO EJE	X								
	LUCES ALTAS	X								
	LUCES BAJAS	X								
	LUCES DE TABLERO	X								
	LUZ INTERIOR	X								
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X								
	TERCERA LUZ DE FRENO	X								
	LUCES DE FRENO	X								
	INTERMITENTES DELANTEROS	X								
	LUCES DE RETROCESO	X								
ACCESORIOS	ALARMA DE RETROCESO		X							
	BOCINA	X								
	BOTIQUIN	X								
	ESPEJOS	X								
	CINTURON DE SEGURIDAD	X								
DOCUMENTACIÓN	EXTINTOR PQS	X								
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X								
	PERMISO DE CIRCULACION	X								
	REVISIÓN TÉCNICA	X								
	SEGURO OBLIGATORIO	X								
COMENTARIOS:	CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DEL CONSORCIO DIAMANTE		NO	
		Ing. Christy S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP 257673						Ing. Juan A. Jimenez Carrasco JEFE DE SUPERVISION CIP 54850		
		VB INGENIERO DE SEGURIDAD						VB SUPERVISOR RESIDENTE		

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257673

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54850

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 13/05/2025

000044

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-S8T-CHECKLIST-001	
		CHECK LIST CAMIONETA						Version	1
								Fecha:	13/04/2025
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
DATOS DE VERIFICACIÓN									
MARCA	Great Wall						PLACA	7BC86	
AÑO	2024						MODELO	H50	
MANTENIMIENTO							SERIE	L6WDBFM XWJ64128	
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA									
	SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES		
GENERAL	ASIENTOS	X			X				
	LIMPIEZA	X			X				
	ESTADO DE PUENTES	X			X				
	PARABRISAS	X			X				
	ESTADO DE CABINA	X			X				
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X			X				
	PARACHOQUES	X			X				
	ESTADO DE COMANDOS	X			X				
	ACELERADOR	X			X				
	FRENOS	X			X				
NEUMÁTICOS	GATA	X			X				
	LLAVES DE RUEDA	X			X				
LUCES	PRIMER EJE	X			X				
	SEGUNDO EJE	X			X				
	LUCES ALTAS	X			X				
	LUCES BAJAS	X			X				
	LUCES DE TABLERO	X			X				
	LUZ INTERIOR	X			X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X				
	LUCES DE FRENO	X			X				
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X				
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X			X				
	ALARMA DE RETROCESO		X						
	BOCINA	X			X				
	BOTIQUIN	X			X				
	ESPEJOS	X			X				
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X				
	EXTINTOR PQS	X			X				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X				
	PERMISO DE CIRCULACION	X			X				
	REVISIÓN TÉCNICA	X			X				
COMENTARIOS	SEGURO OBLIGATORIO	X			X				
	MANTENIMIENTO	X			X				
CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DEL EQUIPO		CONSORCIO DIAMANTE	
Ing. Christy S. Briceño Salinas INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP: 257671						Ing. Juan A. Jiménez Carrasco JEFE DE SUPERVISIÓN CIP: 34050		NO	
VB* INGENIERO DE SEGURIDAD						VB* SUPERVISOR RESIDENTE			

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP: 34050

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar A. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 14/05/2025

000043

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
CHECK LIST CAMONETA		Versión						1	
Fecha:		13/04/2025							
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
DATOS DE VERIFICACIÓN									
MARCA	Grant Wall						PLACA	12C-578	
AÑO	2021						MODELO	12C	
MANTENIMIENTO							SERIE	66WDD019 203614123	
MARCAR CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES	
GENERAL	ASIENTOS	X							
	LIMPIEZA	X							
	ESTADO DE PUENTES	X							
	PARABRISAS	X							
	ESTADO DE CABINA	X							
	ESTADO DE DIRECCIÓN Y VOLANTE	X							
	PARACHOQUES	X							
	ESTADO DE COMANDOS	X							
	ACELERADOR	X							
	FRENOS	X							
GATA	X								
	LLAVES DE RUEDA	X							
NEUMÁTICOS	PRIMER EJE	X							
	SEGUNDO EJE	X							
LUCES	LUCES ALTAS	X							
	LUCES BAJAS	X							
	LUCES DE TABLERO	X							
	LUZ INTERIOR	X							
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X							
	TERCERA LUZ DE FRENO	X							
	LUCES DE FRENO	X							
	INTERMITENTES DELANTEROS	X							
	LUCES DE RETROCESO	X							
	ALARMA DE RETROCESO	X							
ACCESORIOS	BOCINA	X		X					
	BOTIQUIN	X							
	ESPEJOS	X							
	CINTURON DE SEGURIDAD	X							
	EXTINTOR PQS	X							
DOCUMENTACIÓN	LICENCIA DE CONDUCTOR	X							
	PERMISO DE CIRCULACIÓN	X							
	REVISIÓN TÉCNICA	X							
	SEGURO OBLIGATORIO	X							
	MANTENIMIENTO	X							
COMENTARIOS	CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DEL EQUIPO		SI
Ing. Christy S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL - ALTO OCUPACIONAL CIP: 257671						Ing. Juan A. Carrasco JEFE DE SUPERVISIÓN CIP: 54850		NO	
VB* INGENIERO DE SEGURIDAD						VB* SUPERVISOR RESIDENTE			

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL - ALTO OCUPACIONAL
CIP: 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP: 54850

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 15/05/2025

000042

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
		CHECK LIST CAMIONETA						Version	1
								Fecha:	13/04/2025
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
DATOS DE VERIFICACIÓN									
MARCA	Great Wall						PLACA	18C-526	
AÑO	2021						MODELO	F60	
MANTENIMIENTO							SERIE	26WDBF19 KA1761423	
MARCAR CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA									
		SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES	
GENERAL	ASIENTOS	X							
	LIMPIEZA	X							
	ESTADO DE PUENTES	X							
	PARABRISAS	X							
	ESTADO DE CABINA	X							
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X							
	PARACHOQUES	X							
	ESTADO DE COMANDOS	X							
	ACELERADOR	X							
	FRENOS	X							
NEUMÁTICOS	GATA	X							
	LLAVES DE RUEDA	X							
LUCES	PRIMER EJE	X							
	SEGUNDO EJE	X							
	LUCES ALTAS	X							
	LUCES BAJAS	X							
	LUCES DE TABLERO	X							
	LUZ INTERIOR	X							
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X							
	TERCERA LUZ DE FRENO	X							
	LUCES DE FRENO	X							
	INTERMITENTES DELANTEROS	X							
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X							
	ALARMA DE RETROCESO		X						
	BOCINA	X							
	BOTIQUIN	X							
	ESPEJOS	X							
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X							
	EXTINTOR PQS	X							
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X							
	PERMISO DE CIRCULACION	X							
	REVISIÓN TÉCNICA	X							
COMENTARIOS:	SEGURO OBLIGATORIO	X							
	MANTENIMIENTO	X							
CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DEL EQUIPO			
Ing. Christo S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP: 257671						Ing. Juan A. Jiménez Carrasco JEFE DE SUPERVISIÓN CIP: 54050			
VB INGENIERO DE SEGURIDAD						VB SUPERVISOR RESIDENTE			

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christo S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP: 54050

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 16/05/2025

000041

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
		CHECK LIST CAMIONETA						Versión	1
								Fecha:	13/04/2025
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
DATOS DE VERIFICACIÓN									
MARCA	Great Wall							PLACA	YBC-526
AÑO	2021							MODELO	Phe
MANTENIMIENTO								SERIE	26W38F19 XNJC1412
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA									
		SI	NO	NA	B	M	R	OBSERVACIONES	
GENERAL	ASIENTOS	X							
	LIMPIEZA	X							
	ESTADO DE PUENTES	X							
	PARABRISAS	X							
	ESTADO DE CABINA	X							
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X							
	PARACHOCQUES	X							
	ESTADO DE COMANDOS	X							
	ACELERADOR	X							
	FRENOS	X							
NEUMÁTICOS	GATA	X							
	LLAVES DE RUEDA	X							
LUCES	PRIMER EJE	X							
	SEGUNDO EJE	X							
	LUCES ALTAS	X							
	LUCES BAJAS	X							
	LUCES DE TABLERO	X							
	LUZ INTERIOR	X							
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X							
	TERCERA LUZ DE FRENO	X							
	LUCES DE FRENO	X							
	INTERMITENTES DELANTEROS	X							
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X							
	ALARMA DE RETROCESO		X						
	BOCINA	X							
	BOTIQUIN	X							
	ESPEJOS	X							
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X							
	EXTINTOR PQS	X							
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X							
	PERMISO DE CIRCULACION	X							
	REVISIÓN TÉCNICA	X							
COMENTARIOS	SEGURO OBLIGATORIO	X							
	MANTENIMIENTO	X							
COMENTARIOS		CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DEL EQUIPO	
		Ing. Christy S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP 257671						Ing. Juan P. Jiménez Carrasco JEFE DE SUPERVISIÓN CIP 54950	
		VB* INGENIERO DE SEGURIDAD						VB* SUPERVISOR RESIDENTE	

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan P. Jiménez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54950

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 17/05/2025

000040

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
		CHECK LIST CAMIONETA						Versión	1
								Fecha:	13/04/2025
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
DATOS DE VERIFICACIÓN									
MARCA	Grand Wall						PLACA	13C-876	
AÑO	2021						MODELO	200	
MANTENIMIENTO							SERIE	26WDA19XN3614123	
MARCAR CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES	
GENERAL	ASIENTOS	X			X				
	LIMPIEZA	X			X				
	ESTADO DE PUENTES	X			X				
	PARABRISAS	X			X				
	ESTADO DE CABINA	X			X				
	ESTADO DE DIRECCIÓN Y VOLANTE	X			X				
	PARACHOCQUES	X			X				
	ESTADO DE COMANDOS	X			X				
	ACELERADOR	X			X				
	FRENOS	X			X				
GATA	X			X					
	LLAVES DE RUEDA	X			X				
NEUMÁTICOS	PRIMER EJE	X			X				
	SEGUNDO EJE	X			X				
LUCES	LUCES ALTAS	X			X				
	LUCES BAJAS	X			X				
	LUCES DE TABLERO	X			X				
	LUZ INTERIOR	X			X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X				
	LUCES DE FRENO	X			X				
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X				
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X			X				
	ALARMA DE RETROCESO		X						
	BOCINA	X			X				
	BOTIQUÍN	X			X				
	ESPEJOS	X			X				
DOCUMENTACIÓN	CINTURÓN DE SEGURIDAD	X			X				
	EXTINTOR PQS	X			X				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X				
	PERMISO DE CIRCULACIÓN	X			X				
	REVISIÓN TÉCNICA	X			X				
COMENTARIOS:	SEGURO OBLIGATORIO	X			X				
	MANTENIMIENTO	X			X				
CONSORCIO DIAMANTE		CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DEL EQUIPO	SI
Ing. Cesar S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP: 257671		Ing. Juan P. Jimenez Carrasco JEFE DE SUPERVISIÓN CIP: 54050						NO	
VB* INGENIERO DE SEGURIDAD					VB* SUPERVISOR RESIDENTE				

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan P. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP: 54050

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMÚN

Fecha: 14/05/2025

000039

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-887-CHECKLIST-001	
CHECK LIST CAMIONETA		Versión						1	
NOMBRE DEL PROYECTO		Fecha:						13/04/2025	
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"									
MARCAS		DATOS DE VERIFICACION							
AÑO								PLACA	
MANTENIMIENTO								MODELO	
								SERIE	
								OBSERVACIONES	
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	B	M	R		
GENERAL	ASIENTOS	X							
	LIMPIEZA	X							
	ESTADO DE PUESTOS	X							
	PARABRISAS	X							
	ESTADO DE CABINA	X							
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X							
	PARACHOQUES	X							
	ESTADO DE COMANDOS	X							
	ACELERADOR	X							
	FRENOS	X							
NEUMÁTICOS	GATA	X							
	LLAVES DE RUEDA	X							
	PRIMER EJE	X							
LUCES	SEGUNDO EJE	X							
	LUCES ALTAS	X							
	LUCES BAJAS	X							
	LUCES DE TABLERO	X							
	LUZ INTERIOR	X							
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X							
	TERCERA LUZ DE FRENO	X							
	LUCES DE FRENO	X							
	INTERMITENTES DELANTEROS	X							
	LUCES DE RETROCESO	X							
ACCESORIOS	ALARMA DE RETROCESO		X						
	BOCINA	X							
	BOTUQUIN	X							
	ESPEJOS	X							
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X							
	EXTINTOR PÓS	X							
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X							
	PERMISO DE CIRCULACIÓN	X							
	REVISIÓN TÉCNICA	X							
COMENTARIOS:	SEGURO OBLIGATORIO	X							
	MANTENIMIENTO	X							
CONSORCIO DIAMANTE		DOCUMENTOS DEL EQUIPO						NO	
Ing. Christy S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL VB INGENIERO DE SEGURIDAD		Ing. Juan A. Martínez Carrillo JEFE DE SUPERVISIÓN						VB SUPERVISOR RESIDENTE	

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP. 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Martínez Carrillo
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP. 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 7/01/2025

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD							CD-887-CHECKLIST-001	
NOMBRE DEL PROYECTO		CHECK LIST CAMIONETA							Version	1
		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM #1: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							Fecha:	13/04/2025
MARCA		DATOS DE VERIFICACIÓN							PLACA	196-576
AÑO									MODELO	2021
MANTENIMIENTO									SERIE	26WDA19XAJ2614123
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	S	M	R	OBSERVACIONES		
GENERAL	ASIENTOS	X								
	LIMPIEZA	X								
	ESTADO DE Puentes	X								
	PARABRISAS	X								
	ESTADO DE CABINA	X								
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X								
	PARACHOQUES	X								
	ESTADO DE COMANDOS	X								
	ACELERADOR	X								
	FRENOS	X								
NEUMÁTICOS	GATA	X								
	LLAVES DE RUEDA	X								
	PRIMER EJE	X								
LUCES	SEGUNDO EJE	X								
	LUCES ALTAS	X								
	LUCES BAJAS	X								
	LUCES DE TABLERO	X								
	LUZ INTERIOR	X								
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X								
	TERCERA LUZ DE FRENO	X								
	LUCES DE FRENO	X								
	INTERMITENTES DELANTEROS	X								
	LUCES DE RETROCESO	X								
ACCESORIOS	ALARMA DE RETROCESO	X								
	BOCINA		X							
	BOTIQUIN	X								
	ESPEJOS	X								
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X								
	EXTINTOR PQS	X								
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X								
	PERMISO DE CIRCULACION	X								
COMENTARIOS:	REVISIÓN TÉCNICA	X								
	SEGURO OBLIGATORIO	X								
MANTENIMIENTO		X								
COMENTARIOS:		CONSORCIO DIAMANTE							DOCUMENTOS DEL EQUIPO	SI
		Ing. Cesar S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP 257671							CONSORCIO DIAMANTE	NO
VB INGENIERO DE SEGURIDAD									Ing. Juan A. Jimenez Carrasco VERIFICADOR DE EQUIPO	
									VB SUPERVISOR RESIDENTE	

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
VERIFICADOR DE EQUIPO
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 21/05/2025

000037

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
NOMBRE DEL PROYECTO		CHECK LIST CAMIONETA						Versión	1
		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"						Fecha:	13/04/2025
MARCA		DATOS DE VERIFICACIÓN						PLACA	108-576
AÑO								MODELO	2021
MANTENIMIENTO								SERIE	26WDB319
								OBSERVACIONES	2614123
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA		SI	NO	NA	B	M	R		
GENERAL	ASIENTOS	X							
	LIMPIEZA	X							
	ESTADO DE PUENTES	X							
	PARABRISAS	X							
	ESTADO DE CABINA	X							
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X							
	PARACHQUES	X							
	ESTADO DE COMANDOS	X							
	ACELERADOR	X							
	FRENOS	X							
NEUMÁTICOS	GATA	X							
	LLAVES DE RUEDA	X							
LUCES	PRIMER EJE	X							
	SEGUNDO EJE	X							
	LUCES ALTAS	X							
	LUCES BAJAS	X							
	LUCES DE TABLERO	X							
	LUZ INTERIOR	X							
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X							
	TERCERA LUZ DE FRENO	X							
	LUCES DE FRENO	X							
	INTERMITENTES DELANTEROS	X							
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X							
	ALARMA DE RETROCESO	X							
	BOCINA		X						
	BOTOLIN	X							
DOCUMENTACIÓN	ESPEJOS	X							
	CINTURÓN DE SEGURIDAD	X							
	EXTINTOR PGS	X							
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X							
COMENTARIOS:	PERMISO DE CIRCULACION	X							
	REVISION TECNICA	X							
SEGURO OBLIGATORIO		X							
MANTENIMIENTO		X							
CONSORCIO DIAMANTE								DOCUMENTOS DEL EQUIPO	SI
Ing. Cristy S. Briceño Salinas								CONSORCIO DIAMANTE	NO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL								Ing. Juan A. Jarama Carrasco	
CIP. 257671								VB* SUPERVISOR RESIDENTE	

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cristy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP. 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jarama Carrasco
VB* SUPERVISOR RESIDENTE
CIP. 54850

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar V. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 22/05/2023

000036

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
NOMBRE DEL PROYECTO		CHECK LIST CAMIONETA						Versión	1
		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE, EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMÓCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"						Fecha:	13/04/2025
MARCA		DATOS DE VERIFICACIÓN						PLACA	136-876
AÑO								MODELO	1998
MANTENIMIENTO								SERIE	16WJ08F1712W-362412
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES	
GENERAL	ASIENTOS	X							
	LIMPIEZA	X							
	ESTADO DE PUENTES	X							
	PARABRISAS	X							
	ESTADO DE CABINA	X							
	ESTADO DE DIRECCIÓN Y VOLANTE	X							
	PARACHOQUES	X							
	ESTADO DE COMANDOS	X							
	ACELERADOR	X							
	FRENOS	X							
NEUMÁTICOS	GATA	X							
	LLAVES DE RUEDA	X							
LUCES	PRIMER EJE	X							
	SEGUNDO EJE	X							
	LUCES ALTAS	X							
	LUCES BAJAS	X							
	LUCES DE TABLERO	X							
	LUZ INTERIOR	X							
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X							
	TERCERA LUZ DE FRENO	X							
	LUCES DE FRENO	X							
	INTERMITENTES DELANTEROS	X							
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X							
	ALARMA DE RETROCESO	X							
	BOCINA		X						
	BOTIQUIN	X							
DOCUMENTACIÓN	ESPEJOS	X							
	CINTURON DE SEGURIDAD	X							
	EXTINTOR PQS	X							
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X							
	PERMISO DE CIRCULACIÓN	X							
COMENTARIOS:	REVISIÓN TÉCNICA	X							
	SEGURO OBLIGATORIO	X							
	MANTENIMIENTO	X							
CONSORCIO DIAMANTE		DOCUMENTOS DEL EQUIPO						X	NO
Ing. Christy S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP 257671		Ing. Juan A. Jaraméz Carrasco JEFE DE SUPERVISIÓN CIP 34850							
VB* INGENIERO DE SEGURIDAD		VB* SUPERVISOR RESIDENTE							

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Jaraméz Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 34850

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar A. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 23/05/2025

000035

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD		CD-SST-CHECKLIST-001					
CHECK LIST CAMIONETA		Versión	1				
NOMBRE DEL PROYECTO		Fecha:	13/04/2025				
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
MARCA		DATOS DE VERIFICACIÓN					
AÑO		PLACA	105-526				
MANTENIMIENTO		MODELO	2021				
		SERIE	2647DAF19XUJ61413				
		OBSERVACIONES					
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA							
GENERAL	ASIENTOS	SI	NO	N/A	B	M	R
	LIMPIEZA	X			X		
	ESTADO DE PUENTES	X			X		
	PARABRISAS	X			X		
	ESTADO DE CABINA	X			X		
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X			X		
	PARACHOQUES	X			X		
	ESTADO DE COMANDOS	X			X		
	ACELERADOR	X			X		
	FRENOS	X			X		
NEUMÁTICOS	GATA	X			X		
	LLAVES DE RUEDA	X			X		
LUCES	PRIMER EJE	X			X		
	SEGUNDO EJE	X			X		
	LUCES ALTAS	X			X		
	LUCES BAJAS	X			X		
	LUCES DE TABLERO	X			X		
	LUZ INTERIOR	X			X		
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X		
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X		
	LUCES DE FRENO	X			X		
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X		
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X			X		
	ALARMA DE RETROCESO	X			X		
	BOCINA	X	X				
	BOTIQUIN	X			X		
DOCUMENTACIÓN	ESPEJOS	X			X		
	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X		
	EXTINTOR PDS	X			X		
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X		
COMENTARIOS:	PERMISO DE CIRCULACION	X			X		
	REVISIÓN TÉCNICA	X			X		
	SEGURO OBLIGATORIO	X			X		
MANTENIMIENTO							
CONSORCIO DIAMANTE							
Ing. Cesar M. Rivera Salinas		Ing. Juan A. Jarama Carrasco					
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP 257671		JEFE DE SUPERVISION CIP 34350					
VB INGENIERO DE SEGURIDAD		VB SUPERVISOR RESIDENTE					

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar M. Rivera Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jarama Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 34350

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar M. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 24/05/2025

000034

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD		CD-SST-CHECKLIST-001					
CHECK LIST CAMIONETA		Versión	1				
NOMBRE DEL PROYECTO		Fecha:	13/04/2025				
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
MARCA		DATOS DE VERIFICACIÓN					
AÑO		PLACA	100-576				
MANTENIMIENTO		MODELO	120				
		SERIE	26008149				
		OBSERVACIONES	26008149				
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA							
GENERAL	ASIENTOS	SI	NO	N/A	B	M	R
	LIMPIEZA	X			X		
	ESTADO DE PUENTES	X			X		
	PARABRISAS	X			X		
	ESTADO DE CABINA	X			X		
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X			X		
	PARACHOQUES	X			X		
	ESTADO DE COMANDOS	X			X		
	ACELERADOR	X			X		
	FRENOS	X			X		
NEUMÁTICOS	GATA	X			X		
	LLAVES DE RUEDA	X			X		
	PRIMER EJE	X			X		
LUCES	SEGUNDO EJE	X			X		
	LUCES ALTAS	X			X		
	LUCES BAJAS	X			X		
	LUCES DE TABLERO	X			X		
	LUZ INTERIOR	X			X		
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X		
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X		
	LUCES DE FRENO	X			X		
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X		
	LUCES DE RETROCESO	X			X		
ACCESORIOS	ALARMA DE RETROCESO	X			X		
	BOCINA	X			X		
	BOTIQUIN	X			X		
	ESPEJOS	X			X		
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X		
	EXTINTOR PQS	X			X		
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X		
	PERMISO DE CIRCULACION	X			X		
	REVISION TECNICA	X			X		
COMENTARIOS:	SEGURO OBLIGATORIO	X			X		
	MANTENIMIENTO	X			X		
DOCUMENTOS DEL EQUIPO		SI	NO				
CONSORCIO DIAMANTE							
Ing. Cesar S. Briceno Salinas		Ing. Juan A. Domínguez Cárdenas					
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP 257671		JEFE DE SUPERVISIÓN CIP 54800					
VB INGENIERO DE SEGURIDAD		VB SUPERVISOR RESIDENTE					

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar S. Briceno Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Domínguez Cárdenas
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54800

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar S. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 26/05/2025

000033

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
NOMBRE DEL PROYECTO		CHECK LIST CAMONETA						Versión	1
		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"						Fecha:	13/04/2025
MARCA		DATOS DE VERIFICACIÓN						PLACA	108-526
AÑO								MODELO	140
MANTENIMIENTO								SERIE	26W00140 XA12614123
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES	
GENERAL	ASIENTOS	X							
	LIMPIEZA	X							
	ESTADO DE PUENTES	X							
	PARABRISAS	X							
	ESTADO DE CABINA	X							
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X							
	PARACHOQUES	X							
	ESTADO DE COMANDOS	X							
	ACELERADOR	X							
	FRENOS	X							
NEUMÁTICOS	GATA	X							
	LLAVES DE RUEDA	X							
	PRIMER EJE	X							
LUCES	SEGUNDO EJE	X							
	LUCES ALTAS	X							
	LUCES BAJAS	X							
	LUCES DE TABLERO	X							
	LUZ INTERIOR	X							
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X							
	TERCERA LUZ DE FRENO	X							
	LUCES DE FRENO	X							
	INTERMITENTES DELANTEROS	X							
	LUCES DE RETROCESO	X							
ACCESORIOS	ALARMA DE RETROCESO	X							
	BOCINA	X							
	BOTONIN	X							
	ESPEJOS	X							
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X							
	EXTINTOR POS	X							
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X							
	PERMISO DE CIRCULACIÓN	X							
	REVISION TECNICA	X							
COMENTARIOS:	SEGUR OBLIGATORIO	X							
	MANTENIMIENTO	X							
CONSORCIO DIAMANTE		DOCUMENTOS DEL EMPLEADO						CONSORCIO DIAMANTE	
Ing. Christy S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP 257671		Ing. Cesar N. Rivera Diaz JEFE DE SUPERVISION CIP 2671						NO	
VB* INGENIERO DE SEGURIDAD		VB* SUPERVISOR RESIDENTE							

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 27/05/2025

000032

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
NOMBRE DEL PROYECTO		CHECK LIST CAMIONETA						Versión	1
		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"						Fecha:	13/04/2025
MARCA		DATOS DE VERIFICACIÓN						PLACA	108-226
AÑO								MODELO	1200
MANTENIMIENTO								SERIE	26WJ534
								OBSERVACIONES	9202614128
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	B	M	R		
GENERAL	ASIENTOS	X							
	LIMPIEZA	X							
	ESTADO DE Puentes	X							
	PARABRISAS	X							
	ESTADO DE CABINA	X							
	ESTADO DE DIRECCIÓN Y VOLANTE	X							
	PARACHOQUES	X							
	ESTADO DE COMANDOS	X							
	ACELERADOR	X							
	FRENOS	X							
NEUMÁTICOS	GATA	X							
	LLAVES DE RUEDA	X							
LUCES	PRIMER EJE	X							
	SEGUNDO EJE	X							
	LUCES ALTAS	X							
	LUCES BAJAS	X							
	LUCES DE TABLERO	X							
	LUZ INTERIOR	X							
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X							
	TERCERA LUZ DE FRENO	X							
	LUCES DE FRENO	X							
	INTERMITENTES DELANTEROS	X							
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X							
	ALARMA DE RETROCESO	X							
	BOCINA	X							
	BOTIQUIN	X							
	ESPEJOS	X							
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X							
	EXTINTOR PQS	X							
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X							
	PERMISO DE CIRCULACION	X							
	REVISION TECNICA	X							
COMENTARIOS:	SEGURO OBLIGATORIO	X							
	MANTENIMIENTO	X							
CONSORCIO DIAMANTE								DOCUMENTOS DE SEGURO DIAMANTE	NO
Ing. Christy S. Briceno Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP 257671								Ing. Cesar N. Rivera Diaz JEFE DE SUPERVISIÓN CIP 257671	
VB INGENIERO DE SEGURIDAD								VB SUPERVISOR RESIDENTE	

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 28/05/2023

000031

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
		CHECK LIST CAMIONETA						Version	1
								Fecha:	13/04/2023
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ÍTEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
DATOS DE VERIFICACIÓN									
MARCA	GREAT WALL						PLACA	736-876	
AÑO	2021						MODELO	Hicor	
MANTENIMIENTO							SERIE	LEW303172N-361413	
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA									
	SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES		
GENERAL	ASIENTOS	X			X				
	LIMPIEZA	X			X				
	ESTADO DE PUENTES	X			X				
	PARABRISAS	X			X				
	ESTADO DE CABINA	X			X				
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X			X				
	PARACHOQUES	X			X				
	ESTADO DE COMANDOS	X			X				
	ACELERADOR	X			X				
	FRENOS	X			X				
NEUMÁTICOS	GATA	X			X				
	LLAVES DE RUEDA	X			X				
	PRIMER EJE	X			X				
LUCES	SEGUNDO EJE	X			X				
	LUCES ALTAS	X			X				
	LUCES BAJAS	X			X				
	LUCES DE TABLERO	X			X				
	LUZ INTERIOR	X			X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X				
	LUCES DE FRENO	X			X				
ACCESORIOS	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X				
	LUCES DE RETROCESO	X			X				
	ALARMA DE RETROCESO		X						
	BOCINA	X			X				
	BOTIQUIN	X			X				
DOCUMENTACIÓN	ESPEJOS	X			X				
	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X				
	EXTINTOR POS	X			X				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X				
	PERMISO DE CIRCULACION	X			X				
	REVISION TECNICA	X			X				
	SEGURO OBLIGATORIO	X			X				
	MANTENIMIENTO	X			X				
COMENTARIOS:	CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DEL EQUIPO		NO
<p>Ing. Christy S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP: 257671</p> <p>Ing. Cesar N. Rivera Diaz REPRESENTANTE COMUN</p>									
VB* INGENIERO DE SEGURIDAD						VB* SUPERVISOR RESIDENTE			

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 29/05/2025

000030

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
		CHECK LIST CAMIONETA						Versión	1
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
		DATOS DE VERIFICACIÓN						PLACA	708-828
MARCA	Great Wall							MODELO	Pow
AÑO	2021							SERIE	26WDB819
MANTENIMIENTO								OBSERVACIONES	KA 3624423
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA									
GENERAL	ASIENTOS	SI	NO	N/A	B	M	R		
	LIMPIEZA	X			X				
	ESTADO DE PUENTES	X			X				
	PARABRISAS	X			X				
	ESTADO DE CABINA	X			X				
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X			X				
	PARACHOQUES	X			X				
	ESTADO DE COMANDOS	X			X				
	ACELERADOR	X			X				
	FRENOS	X			X				
NEUMÁTICOS	GATA	X			X				
	LLAVES DE RUEDA	X			X				
	PRIMER EJE	X			X				
LUCES	SEGUNDO EJE	X			X				
	LUCES ALTAS	X			X				
	LUCES BAJAS	X			X				
	LUCES DE TABLERO	X			X				
	LUZ INTERIOR	X			X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X				
	LUCES DE FRENO	X			X				
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X				
	LUCES DE RETRÓCESO	X			X				
ACCESORIOS	ALARMA DE RETRÓCESO	X			X				
	BOCINA	X			X				
	BOTICUIN	X			X				
	ESPEJOS	X			X				
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X				
	EXTINTOR PCS	X			X				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X				
	PERMISO DE CIRCULACION	X			X				
	REVISION TECNICA	X			X				
COMENTARIOS:	SEGURO OBLIGATORIO	X			X				
	MANTENIMIENTO	X			X				
COMENTARIOS:		CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DEL EQUIPO	NO
		Ing. Christy S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CNP 257671						Ing. Juan A. Páez Carrasco VB SUPERVISOR RESIDENTE	

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 30/05/2025

000029

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD		CD-89T-CHECKLIST-001			
NOMBRE DEL PROYECTO		CHECK LIST CAMIONETA		Version	1		
				Fecha:	13/04/2025		
		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"					
MARCA		DATOS DE VERIFICACIÓN					
AÑO							
MANTENIMIENTO		PLACA					
		MODELO					
		SERIE					
		OBSERVACIONES					
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA							
GENERAL	ASIENTOS	SI	NO	N/A	B	M	R
	LIMPIEZA	X			X		
	ESTADO DE PUENTES	X					
	PARABRISAS	X			X		
	ESTADO DE CABINA	X			X		
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X			X		
	PARACHOQUES	X			X		
	ESTADO DE COMANDOS	X			X		
	ACELERADOR	X			X		
	FRENOS	X			X		
NEUMÁTICOS	GATA	X			X		
	LLAVES DE RUEDA	X			X		
LUCES	PRIMER EJE	X			X		
	SEGUNDO EJE	X			X		
	LUCES ALTAS	X			X		
	LUCES BAJAS	X			X		
	LUCES DE TABLERO	X			X		
	LUZ INTERIOR	X			X		
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X		
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X		
	LUCES DE FRENO	X			X		
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X		
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X			X		
	ALARMA DE RETROCESO	X			X		
	BOCINA		X				
	BOTIQUIN	X			X		
	ESPEJOS	X			X		
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X		
	EXTINTOR POS	X			X		
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X		
	PERMISO DE CIRCULACION	X			X		
	REVISION TECNICA	X			X		
COMENTARIOS	SEGURO OBLIGATORIO	X			X		
	MARCA CONSORCIO DIAMANTE	X			X		
COMENTARIOS		DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO				SI	NO
Ing. Carlos S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP: 257677		Ing. Juan A. Arce Cortés JEFE DE SUPERVISIÓN CIP: 257677					
VB* INGENIERO DE SEGURIDAD		VB* SUPERVISOR RESIDENTE					

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar M. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 31/05/2025

000028

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
NOMBRE DEL PROYECTO		CHECK LIST CAMIONETA						Versión	1
		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE, EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"						Fecha:	13/04/2025
MARCA		DATOS DE VERIFICACIÓN						PLACA	105-58
AÑO								MODELO	1991
MANTENIMIENTO								SERIE	26408472414123
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES	
GENERAL	ASIENTOS	X			X				
	LIMPIEZA	X			X				
	ESTADO DE PUENTES	X			X				
	PARABRISAS	X			X				
	ESTADO DE CABINA	X			X				
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X			X				
	PARACHOQUES	X			X				
	ESTADO DE COMANDOS	X			X				
	ACELERADOR	X			X				
	FRENOS	X			X				
NEUMÁTICOS	GATA	X			X				
	LLAVES DE RUEDA	X			X				
	PRIMER EJE	X			X				
LUCES	SEGUNDO EJE	X			X				
	LUCES ALTAS	X			X				
	LUCES BAJAS	X			X				
	LUCES DE TABLERO	X			X				
	LUZ INTERIOR	X			X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X				
	LUCES DE FRENO	X			X				
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X				
	LUCES DE RETROCESO	X			X				
ACCESORIOS	ALARMA DE RETROCESO		X						
	BOCINA	X			X				
	BOTIQUIN	X			X				
	ESPEJOS	X			X				
	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X				
DOCUMENTACIÓN	EXTINTOR PQS	X			X				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X				
	PERMISO DE CIRCULACIÓN	X			X				
	REVISIÓN TÉCNICA	X			X				
	SEGURO OBLIGATORIO	X			X				
COMENTARIOS:	CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DE SEGURIDAD	X SI	NO
		Ing. César S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP: 257671						Ing. Cesar A. Rivera Díaz REPRESENTANTE COMUN	
VB INGENIERO DE SEGURIDAD								VB SUPERVISOR RESIDENTE	

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar A. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN



ING. CHRISTY STTEPHANE BRICEÑO SALINAS

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



00002

B.2. MODELO: POER

SERIE:

LGWDCF197RJ613773

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy Sttephane Briceño Salinas
Jefe de Supervisión
CIP: 267671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy Sttephane Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 267671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 02/05/2025

000026

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-587-CHECKLIST-001	
		CHECK LIST CAMIONETA						Version	1
								Fecha:	13/04/2025
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
DATOS DE VERIFICACION									
MARCA	Great Wall						PLACA	TDS-943	
AÑO	2024						MODELO	Parr	
MANTENIMIENTO							SERIE	16410CEH 723013773	
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA									
GENERAL	ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	LIMPIEZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESTADO DE Puentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESTADO DE CABINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PARACHOQUES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESTADO DE COMANDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ACELERADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NEUMÁTICOS	GATA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	LLAVES DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES	PRIMER EJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SEGUNDO EJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	LUCES ALTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	LUCES BAJAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	LUCES DE TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TERCERA LUZ DE FRENO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	LUCES DE FRENO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	INTERMITENTES DELANTEROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ALARMA DE RETROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BOCINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BOTQUIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESPEJOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EXTINTOR PQS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	LICENCIA DE CONDUCTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PERMISO DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	REVISION TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMENTARIOS	SEGURO OBLIGATORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MANTENIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DEL EQUIPO		SI	NO
Ing. Christy S. Briceño Salinas Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional CIP: 257873						CONSORCIO DIAMANTE		Ing. Juan A. Gutierrez Córdova CIP: 54850	
VB INGENIERO DE SEGURIDAD						VB SUPERVISOR RESIDENTE			

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional
CIP: 257873

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Gutierrez Córdova
CIP: 54850

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

fecha: 03/05/2025

000025

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD						CD-887-CHECKLIST-001	
NOMBRE DEL PROYECTO		CHECK LIST CAMIONETA						Versión	1
		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"						Fecha:	13/04/2025
MARCA		DATOS DE VERIFICACIÓN						PLACA	703-843
AÑO								MODELO	Poco
MANTENIMIENTO								SERIE	70361372
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES	
GENERAL	ASIENTOS	X							
	LIMPIEZA	X							
	ESTADO DE PUENTES	X							
	PARABRISAS	X							
	ESTADO DE CABINA	X							
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X							
	PARACHOQUES	X							
	ESTADO DE COMANDOS	X							
	ACELERADOR	X							
	FRENOS	X							
NEUMÁTICOS	GATA	X							
	LLAVES DE RUEDA	X							
LUCES	PRIMER EJE	X							
	SEGUNDO EJE	X							
	LUCES ALTAS	X							
	LUCES BAJAS	X							
	LUCES DE TABLERO	X							
	LUZ INTERIOR	X							
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X							
	TERCERA LUZ DE FRENO	X							
	LUCES DE FRENO	X							
	INTERMITENTES DELANTEROS	X							
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X							
	ALARMA DE RETROCESO	X							
	BOCINA	X							
	BOTIQUIN	X							
	ESPEJOS	X							
DOCUMENTACIÓN	CINTURÓN DE SEGURIDAD	X							
	EXTINTOR POS	X							
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X							
	PERMISO DE CIRCULACION	X							
	REVISIÓN TÉCNICA	X							
COMENTARIOS	SEGURO OBLIGATORIO	X							
	MANTENIMIENTO	X							
CONSORCIO DIAMANTE		DOCUMENTOS DEL EQUIPO						X	NO
Ing. Cesar S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP: 257671		CONSORCIO DIAMANTE						Ing. Juan A. Romero Carasco JEFE DE SUPERVISIÓN CIP: 54351	
VB* INGENIERO DE SEGURIDAD		VB* SUPERVISOR RESIDENTE							

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Romero Carasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP: 54351

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar S. Briceño Salinas
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 05/05/2025

00002

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
NOMBRE DEL PROYECTO		CHECK LIST CAMONETA						Version	1
		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"						Fecha:	13/04/2025
MARCA		DATOS DE VERIFICACION						PLACA	103-843
AÑO								MODELO	100
MANTENIMIENTO								SERIE	2640001938361378
								OBSERVACIONES	
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	B	M	R		
GENERAL	ASIENTOS	X			X				
	LIMPIEZA	X			X				
	ESTADO DE PUENTES	X			X				
	PARABRISAS	X			X				
	ESTADO DE CABINA	X			X				
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X			X				
	PARACHOQUES	X			X				
	ESTADO DE COMANDOS	X			X				
	ACELERADOR	X			X				
	FRENOS	X			X				
NEUMÁTICOS	GATA	X			X				
	LLAVES DE RUEDA	X			X				
	PRIMER EJE	X			X				
LUCES	SEGUNDO EJE	X			X				
	LUCES ALTAS	X			X				
	LUCES BAJAS	X			X				
	LUCES DE TABLERO	X			X				
	LUZ INTERIOR	X			X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X				
	LUCES DE FRENO	X			X				
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X				
	LUCES DE RETROCESO	X			X				
ACCESORIOS	ALARMA DE RETROCESO	X			X				
	BOCINA	X			X				
	BOTIQUIN	X			X				
	ESPEJOS	X			X				
	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X				
DOCUMENTACIÓN	EXTINTOR POS	X			X				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X				
	PERMISO DE CIRCULACION	X			X				
	REVISION TECNICA	X			X				
	SEGURO OBLIGATORIO	X			X				
COMENTARIOS:	CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DEL EQUIPO	NO	
Ing. Christy S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP 257671						CONSORCIO DIAMANTE			
VB* INGENIERO DE SEGURIDAD						Ing. Juan A. Jimenez Carrasco VB* SUPERVISOR RESIDENTE			

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54851

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 06/05/2025

000023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD		CD-SST-CHECKLIST-001				
CHECK LIST CAMIONETA		Versión	1			
NOMBRE DEL PROYECTO		Fecha:	13/04/2025			
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES						
MANTENIMIENTO		DATOS DE VERIFICACIÓN				
MARCA	AÑO	PLACA	MODELO			
	2024	703-843	200			
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA		SERIE	OBSERVACIONES			
		LGWDCFH 703843				
GENERAL	SI	NO	N/A	B	M	R
ASIENTOS	X					
LIMPIEZA	X					
ESTADO DE PUENTES	X					
PARABRISAS	X					
ESTADO DE CABINA	X					
ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X					
PARACHOQUES	X					
ESTADO DE COMANDOS	X					
ACELERADOR	X					
FRENOS	X					
GATA	X					
LLAVES DE RUEDA	X					
NEUMÁTICOS						
PRIMER EJE	X					
SEGUNDO EJE	X					
LUCES						
LUCES ALTAS	X					
LUCES BAJAS	X					
LUCES DE TABLERO	X					
LUZ INTERIOR	X					
LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X					
TERCERA LUZ DE FRENO	X					
LUCES DE FRENO	X					
INTERMITENTES DELANTEROS	X					
LUCES DE RETROCESO	X					
ALARMA DE RETROCESO	X					
ACCESORIOS						
BOCINA	X					
BOTIQUIN	X					
ESPEJOS	X					
CINTURON DE SEGURIDAD	X					
EXTINTOR PQS	X					
DOCUMENTACIÓN						
LICENCIA DE CONDUCTOR	X					
PERMISO DE CIRCULACION	X					
REVISIÓN TÉCNICA	X					
SEGURO OBLIGATORIO	X					
MANTENIMIENTO	X					
COMENTARIOS:	CONSORCIO DIAMANTE					
	Ing. Christy S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP 257679					
	DOCUMENTOS DEL EQUIPO					
	SI NO					

VF INGENIERO DE SEGURIDAD

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257679

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 07/05/2025

000022

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
NOMBRE DEL PROYECTO		CHECK LIST CAMIONETA						Version	1
		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"						Fecha:	13/04/2025
MARCA		DATOS DE VERIFICACION						PLACA	157-343
ANO								MODELO	P001
MANTENIMIENTO								SERIE	LGWDCFP9 TR3618223
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES	
GENERAL	ASIENTOS	X			X				
	LIMPIEZA	X			X				
	ESTADO DE PUENTES	X			X				
	PARABRISAS	X			X				
	ESTADO DE CABINA	X			X				
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X			X				
	PARACHOQUES	X			X				
	ESTADO DE COMANDOS	X			X				
	ACELERADOR	X			X				
	FRENOS	X			X				
NEUMATICOS	GATA	X			X				
	LLAVES DE RUEDA	X			X				
	PRIMER EJE	X			X				
LUCES	SEGUNDO EJE	X			X				
	LUCES ALTAS	X			X				
	LUCES BAJAS	X			X				
	LUCES DE TABLERO	X			X				
	LUZ INTERIOR	X			X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X				
	LUCES DE FRENO	X			X				
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X				
	LUCES DE RETROCESO	X			X				
ACCESORIOS	ALARMA DE RETROCESO	X			X				
	BOCINA	X			X				
	BOTUQUIN	X			X				
	ESPEJOS	X			X				
	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X				
DOCUMENTACIÓN	EXTINTOR POS	X			X				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X				
	PERMISO DE CIRCULACIÓN	X			X				
	REVISIÓN TÉCNICA	X			X				
	SEGURO OBLIGATORIO	X			X				
COMENTARIOS:	MANTENIMIENTO	X			X				
	CONSORCIO DIAMANTE								
DOCUMENTOS DEL EQUIPO								SI	NO

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar S. Briceño Salazar
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Sánchez Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54950

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar S. Briceño Salazar
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 08/05/2025

000021

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD		CD-58T-CHECKLIST-001						
CHECK LIST CAMIONETA		Versión	1					
NOMBRE DEL PROYECTO		Fecha:	13/04/2025					
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"								
DATOS DE VERIFICACIÓN								
MARCA	Great Wall		PLACA					
AÑO	2024		MODELO					
MANTENIMIENTO			SERIE					
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA		OBSERVACIONES						
GENERAL	ASIENTOS	SI	NO	N/A	B	M	R	
	LIMPIEZA	X			X			
	ESTADO DE PUENTES	X						
	PARABRISAS	X						
	ESTADO DE CABINA	X						
	ESTADO DE DIRECCIÓN Y VOLANTE	X						
	PARACHOQUES	X						
	ESTADO DE COMANDOS	X						
	ACELERADOR	X						
	FRENOS	X						
NEUMÁTICOS	GATA	X						
	LLAVES DE RUEDA	X						
	PRIMER EJE	X						
LUCES	SEGUNDO EJE	X						
	LUCES ALTAS	X						
	LUCES BAJAS	X						
	LUCES DE TABLERO	X						
	LUZ INTERIOR	X						
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X						
	TERCERA LUZ DE FRENO	X						
	LUCES DE FRENO	X						
	INTERMITENTES DELANTEROS	X						
	LUCES DE RETROCESO	X						
ACCESORIOS	ALARMA DE RETROCESO	X						
	BOCINA	X						
	BOTIQUIN	X						
	ESPEJOS	X						
	CINTURON DE SEGURIDAD	X						
DOCUMENTACIÓN	EXTINTOR PQS	X						
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X						
	PERMISO DE CIRCULACION	X						
	REVISION TECNICA	X						
	SEGURO OBLIGATORIO	X						
COMENTARIOS:	MANTENIMIENTO							
CONSORCIO DIAMANTE		DOCUMENTOS DEL EQUIPO				NO		
Ing. Cesar S. Briceño Salinas Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional COP. 257671		CONSORCIO DIAMANTE						
VB* INGENIERO DE SEGURIDAD		Ing. Cesar N. Rivera Diaz REPRESENTANTE COMUN						

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 09/05/2025

000020

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
		CHECK LIST CAMIONETA						Versión	1
								Fecha:	13/04/2025
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
MARCA		Great Wall						PLACA	103-243
AÑO		2024						MODELO	2024
MANTENIMIENTO								SERIE	LGWDCFI926361373
DATOS DE VERIFICACION									
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES	
GENERAL	ASIENTOS	X			X				
	LIMPIEZA	X			X				
	ESTADO DE PUENTES	X			X				
	PARABRISAS	X			X				
	ESTADO DE CABINA	X			X				
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X			X				
	PARACHOQUES	X			X				
	ESTADO DE COMANDOS	X			X				
	ACELERADOR	X			X				
	FRENOS	X			X				
NEUMÁTICOS	GATA	X			X				
	LLAVES DE RUEDA	X			X				
LUCES	PRIMER EJE	X			X				
	SEGUNDO EJE	X			X				
	LUCES ALTAS	X			X				
	LUCES BAJAS	X			X				
	LUCES DE TABLERO	X			X				
	LUZ INTERIOR	X			X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X				
	LUCES DE FRENO	X			X				
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X				
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X			X				
	ALARMA DE RETROCESO		X						
	BOCINA	X			X				
	BOTIQUIN	X			X				
	ESPEJOS	X			X				
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X				
	EXTINTOR PQS	X			X				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X				
	PERMISO DE CIRCULACION	X			X				
	REVISION TECNICA	X			X				
COMENTARIOS:	SEGURO OBLIGATORIO	X			X				
	MANTENIMIENTO	X			X				
COMENTARIOS:		CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DEL EQUIPO	SI
									NO
Ing. Christo S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP 257671		CONSORCIO DIAMANTE							
VB* INGENIERO DE SEGURIDAD		Ing. Juan A. Jaramila Carrasco JEFE DE SUPERVISIÓN CIP 54850							

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christo S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jaramila Carrasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54850

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 10/05/2025

000019

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-88T-CHECKLIST-001	
CHECK LIST CAMIONETA		Versión						1	
NOMBRE DEL PROYECTO		Fecha:						13/04/2025	
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"									
DATOS DE VERIFICACIÓN									
MARCA		Año						PLACA	
MANTENIMIENTO		2024						701-343	
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA		MODELO						2005	
		SÉRIE						2600051 828261323	
		OBSERVACIONES							
GENERAL	ASIENTOS	SI	NO	N/A	B	M	R		
	LIMPIEZA	SI			SI				
	ESTADO DE PUESTOS	SI			SI				
	PARABRISAS	SI			SI				
	ESTADO DE CABINA	SI			SI				
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	SI			SI				
	PARACHOQUES	SI			SI				
	ESTADO DE COMANDOS	SI			SI				
	ACELERADOR	SI			SI				
	FRENOS	SI			SI				
NEUMÁTICOS	GATA	SI			SI				
	LLAVES DE RUEDA	SI			SI				
	PRIMER EJE	SI			SI				
LUCES	SEGUNDO EJE	SI			SI				
	LUCES ALTAS	SI			SI				
	LUCES BAJAS	SI			SI				
	LUCES DE TABLERO	SI			SI				
	LUZ INTERIOR	SI			SI				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	SI			SI				
	TERCERA LUZ DE FRENO	SI			SI				
	LUCES DE FRENO	SI			SI				
	INTERMITENTES DELANTEROS	SI			SI				
	LUCES DE RETROCESO	SI			SI				
ACCESORIOS	ALARMA DE RETROCESO	SI			SI				
	BOCINA	SI			SI				
	BOTUQUE	SI			SI				
	ESPEJOS	SI			SI				
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	SI			SI				
	EXTINTOR PBS	SI			SI				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	SI			SI				
	PERMISO DE CIRCULACION	SI			SI				
COMENTARIOS:	REVISION TECNICA	SI			SI				
	SEGURO OBLIGATORIO	SI			SI				
MANTENIMIENTO		SI			SI				
DOCUMENTOS DEL EQUIPO								NO	

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Salinas
ESPECIALISTA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP. 257679

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Salinas
ESPECIALISTA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP. 257679

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Salinas
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 12/05/2025

000018

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD		CD-SST-CHECKLIST-001		
CHECK LIST CAMIONETA		Versión		1		
NOMBRE DEL PROYECTO		Fecha:		13/04/2025		
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"						
DATOS DE VERIFICACIÓN						
MARCA		PLACA		101-343		
AÑO		MODELO		Per		
MANTENIMIENTO		SERIE		264DC1978JG1373		
OBSERVACIONES						
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA						
	SI	NO	N/A	B	M	R
GENERAL	ASIENTOS	X				
	LIMPIEZA	X				
	ESTADO DE PUENTES	X				
	PARABRISAS	X				
	ESTADO DE CABINA	X				
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X				
	PARACHOQUES	X				
	ESTADO DE COMANDOS	X				
	ACELERADOR	X				
	FRENOS	X				
NEUMÁTICOS	GATA	X				
	LLAVES DE RUEDA	X				
	PRIMER EJE	X				
LUCES	SEGUNDO EJE	X				
	LUCES ALTAS	X				
	LUCES BAJAS	X				
	LUCES DE TABLERO	X				
	LUZ INTERIOR	X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X				
	LUCES DE FRENO	X				
	INTERMITENTES DELANTEROS	X				
	LUCES DE RETROCESO	X				
ACCESORIOS	ALARMA DE RETROCESO	X				
	BOCINA	X				
	BOTQUIN	X				
	ESPEJOS	X				
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X				
	EXTINTOR PQS	X				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X				
	PERMISO DE CIRCULACION	X				
	REVISION TECNICA	X				
COMENTARIOS:	SEGURO OBLIGATORIO	X				
	MANTENIMIENTO	X				
CONSORCIO DIAMANTE		DOCUMENTOS DEL EQUIPO				
Ing. Christy S. Briceño Salinas		CONSORCIO DIAMANTE				
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		Ing. Juan A. Jimenez Carrasco				
CIP 257671		VBT SUPERVISOR RESIDENTE				
VBT INGENIERO DE SEGURIDAD						

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54850

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

fecha: 13/05/2025

000017

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
		CHECK LIST CAMIONETA						Version	1
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE, EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
		DATOS DE VERIFICACIÓN						PLACA	723-843
MARCA	Great Wall							MODELO	Pow
AÑO	2024							SERIE	2600CF19 723613723
MANTENIMIENTO								OBSERVACIONES	
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	B	M	R		
GENERAL	ASIENTOS	X			X				
	LIMPIEZA	X			X				
	ESTADO DE PUENTES	X			X				
	PARABRISAS	X			X				
	ESTADO DE CABINA	X			X				
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X			X				
	PARACHOQUES	X			X				
	ESTADO DE COMANDOS	X			X				
	ACELERADOR	X			X				
	FRENOS	X			X				
NEUMÁTICOS	GATA	X			X				
	LLAVES DE RUEDA	X			X				
LUCES	PRIMER EJE	X			X				
	SEGUNDO EJE	X			X				
	LUCES ALTAS	X			X				
	LUCES BAJAS	X			X				
	LUCES DE TABLERO	X			X				
	LUZ INTERIOR	X			X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X				
	LUCES DE FRENO	X			X				
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X				
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X			X				
	ALARMA DE RETROCESO		X						
	BOCINA	X			X				
	BOTIQUIN	X			X				
	ESPEJOS	X			X				
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X				
	EXTINTOR PGS	X			X				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X				
	PERMISO DE CIRCULACION	X			X				
	REVISION TECNICA	X			X				
COMENTARIOS:	SEGURO OBLIGATORIO	X			X				
	MANTENIMIENTO	X			X				
COMENTARIOS:		CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DEL EQUIPO	NO
		Ing. Christy S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP 257671						CONSORCIO DIAMANTE	
		VB* INGENIERO DE SEGURIDAD						Ing. Juan A. Jiménez Cartasco JEFE DE SUPERVISIÓN VB* SUPERVISOR RESIDENTE	

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jiménez Cartasco
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54050

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar M. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 14/05/2025

000016

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
NOMBRE DEL PROYECTO		CHECK LIST CAMIONETA						Version	1
								Fecha	13/04/2025
MARCA		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE: EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES						DATOS DE VERIFICACION	
AÑO		2024						PLACA	TD3 843
MANTENIMIENTO								MODELO	2024
								SERIE	2600 CFM 725613723
								OBSERVACIONES	
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	B	M	R		
GENERAL	ASIENTOS	X							
	LIMPIEZA	X							
	ESTADO DE PUENTES	X							
	PARABRISAS	X							
	ESTADO DE CABINA	X							
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X							
	PARACHOQUES	X							
	ESTADO DE COMANDOS	X							
	ACELERADOR	X							
	FRENOS	X							
NEUMÁTICOS	GATA	X							
	LLAVES DE RUEDA	X							
	PRIMER EJE	X							
LUCES	SEGUNDO EJE	X							
	LUCES ALTAS	X							
	LUCES BAJAS	X							
	LUCES DE TABLERO	X							
	LUZ INTERIOR	X							
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X							
	TERCERA LUZ DE FRENO	X							
	LUCES DE FRENO	X							
	INTERMITENTES DELANTEROS	X							
	LUCES DE RETROCESO	X							
ACCESORIOS	ALARMA DE RETROCESO	X							
	BOCINA		X						
	BOTIQUIN	X							
	ESPEJOS	X							
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X							
	EXTINTOR PGB	X							
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X							
	PERMISO DE CIRCULACION	X							
	REVISION TECNICA	X							
COMENTARIOS	SEGURO OBLIGATORIO	X							
	MANTENIMIENTO	X							
COMENTARIOS:		CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DE EQUIPO	NO
		Ing. Cesar N. Rivera Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP: 257671						Ing. Juan A. Jimenez Carrasco SUPERVISOR RESIDENTE CIP: 257671	
VB* INGENIERO DE SEGURIDAD								VB* SUPERVISOR RESIDENTE	

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257671

CONSORCIO DIAMANTE


Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
SUPERVISOR RESIDENTE
CIP: 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 15/05/2025

000015

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD						CD-SBT-CHECKLIST-001	
CONSORCIO DIAMANTE		CHECK LIST CAMONETA						Versión	1
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"						Fecha:	13/04/2025
DATOS DE VERIFICACIÓN									
MARCA								PLACA	TDJ-243
AÑO								MODELO	250r
MANTENIMIENTO								SERIE	78361372
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA									
		SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES	
GENERAL	ASIENTOS	X			X				
	LIMPIEZA	X			X				
	ESTADO DE PUENTES	X			X				
	PARABRISAS	X			X				
	ESTADO DE CABINA	X			X				
	ESTADO DE DIRECCIÓN Y VOLANTE	X			X				
	PARACHOCQUES	X			X				
	ESTADO DE COMANDOS	X			X				
	ACELERADOR	X			X				
	FRENOS	X			X				
NEUMÁTICOS	GATA	X			X				
	LLAVES DE RUEDA	X			X				
LUCES	PRIMER EJE	X			X				
	SEGUNDO EJE	X			X				
	LUCES ALTAS	X			X				
	LUCES BAJAS	X			X				
	LUCES DE TABLERO	X			X				
	LUZ INTERIOR	X			X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X				
	LUCES DE FRENO	X			X				
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X				
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X			X				
	ALARMA DE RETROCESO		X						
	BOCINA	X			X				
	BOTIQUIN	X			X				
	ESPEJOS	X			X				
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X				
	EXTINTOR PQS	X			X				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X				
	PERMISO DE CIRCULACIÓN	X			X				
	REVISIÓN TÉCNICA	X			X				
COMENTARIOS:	SEGURO OBLIGATORIO	X			X				
	MANTENIMIENTO	X			X				
		DOCUMENTOS DEL EQUIPO						NO	

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257671

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP: 54855

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 16/05/2025

000014

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
CHECK LIST CAMIONETA		Versión						1	
NOMBRE DEL PROYECTO		Fecha:						13/04/2025	
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"									
DATOS DE VERIFICACIÓN									
MARCA	Great Wall						PLACA	107-843	
AÑO	2024						MODELO	Pier	
MANTENIMIENTO							SERIE	166DC49 305613723	
MARCAR CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA									
	SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES		
GENERAL	ASIENTOS	X			X				
	LIMPIEZA	X			X				
	ESTADO DE PUENTES	X			X				
	PARABRISAS	X			X				
	ESTADO DE CABINA	X			X				
	ESTADO DE DIRECCIÓN Y VOLANTE	X			X				
	PARACHOQUES	X			X				
	ESTADO DE COMANDOS	X			X				
	ACELERADOR	X			X				
	FRENOS	X			X				
NEUMÁTICOS	GATA	X			X				
	LLAVES DE RUEDA	X			X				
LUCES	PRIMER EJE	X			X				
	SEGUNDO EJE	X			X				
	LUCES ALTAS	X			X				
	LUCES BAJAS	X			X				
	LUCES DE TABLERO	X			X				
	LUZ INTERIOR	X			X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X				
	LUCES DE FRENO	X			X				
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X				
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X			X				
	ALARMA DE RETROCESO		X						
	BOCINA	X			X				
	BOTIQUIN	X			X				
	ESPEJOS	X			X				
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X				
	EXTINTOR PQS	X			X				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X				
	PERMISO DE CIRCULACION	X			X				
	REVISIÓN TÉCNICA	X			X				
COMENTARIOS:	SEGURO OBLIGATORIO	X			X				
	MANTENIMIENTO	X			X				
Ing. Christy S. Briceño Salinas LICENCIADA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP: 257671						DOCUMENTOS DEL EQUIPO		NO	
VB* INGENIERO DE SEGURIDAD						Ing. Juan A. Antezana Carrasco JEFE DE EQUIPO VERIFICADOR VB* SUPERVISOR RESIDENTE			

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Christy S. Briceño Salinas
LICENCIADA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP: 257671

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Antezana Carrasco
JEFE DE EQUIPO VERIFICADOR
VB* SUPERVISOR RESIDENTE

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMÚN

Fecha: 17/05/2025

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
CHECK LIST CAMIONETA		Versión						1	
Fecha:		13/04/2025							
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
DATOS DE VERIFICACIÓN									
MARCA	AÑO	PLACA						T-1-843	
MANTENIMIENTO		MODELO						R-1	
		SERIE						26WDC49783613728	
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES	
GENERAL	ASIENTOS	X							
	LIMPIEZA	X							
	ESTADO DE Puentes	X							
	PARABRISAS	X							
	ESTADO DE CABINA	X							
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X							
	PARACHOQUES	X							
	ESTADO DE COMANDOS	X							
	ACELERADOR	X							
	FRENOS	X							
NEUMÁTICOS	GATA	X							
	LLAVES DE RUEDA	X							
LUCES	PRIMER EJE	X							
	SEGUNDO EJE	X							
	LUCES ALTAS	X							
	LUCES BAJAS	X							
	LUCES DE TABLERO	X							
	LUZ INTERIOR	X							
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X							
	TERCERA LUZ DE FRENO	X							
	LUCES DE FRENO	X							
	INTERMITENTES DELANTEROS	X							
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X							
	ALARMA DE RETROCESO	X							
	BOCINA	X							
	BOTIQUIN	X							
	ESPEJOS	X							
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X							
	EXTINTOR PQR	X							
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X							
	PERMISO DE CIRCULACION	X							
	REVISION TECNICA	X							
COMENTARIOS:	SEGURO OBLIGATORIO	X							
	MANTENIMIENTO	X							
CONSORCIO DIAMANTE		DOCUMENTOS DEL EQUIPO						NO	
Ing. Christy S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP 257871		Ing. Juan A. Jimenez Carrasco JEFE DE SUPERVISION CIP 54841							
VB INGENIERO DE SEGURIDAD		VB SUPERVISOR RESIDENTE							

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Christy S. Briceño Salinas
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIP 257871

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jimenez Carrasco
JEFE DE SUPERVISION
CIP 54841

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar M. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 20/05/2025

000011

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
NOMBRE DEL PROYECTO		CHECK LIST CAMONETA						Versión	1
		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"						Fecha:	13/04/2025
MARCA		DATOS DE VERIFICACIÓN						PLACA	103-543
AÑO								MODELO	2024
MANTENIMIENTO								SERIE	202413223
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA									
GENERAL	ASIENTOS	SI	NO	N/A	B	M	R		
	LIMPIEZA	X							
	ESTADO DE PUENTES	X							
	PARABRISAS	X							
	ESTADO DE CABINA	X							
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X							
	PARACHOQUES	X							
	ESTADO DE COMANDOS	X							
	ACELERADOR	X							
	FRENOS	X							
NEUMÁTICOS	GATA	X							
	LLAVES DE RUEDA	X							
	PRIMER EJE	X							
LUCES	SEGUNDO EJE	X							
	LUCES ALTAS	X							
	LUCES BAJAS	X							
	LUCES DE TABLERO	X							
	LUZ INTERIOR	X							
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X							
	TERCERA LUZ DE FRENO	X							
	LUCES DE FRENO	X							
	INTERMITENTES DELANTEROS	X							
	LUCES DE RETROCESO	X							
ACCESORIOS	ALARMA DE RETROCESO	X							
	BOCINA	X							
	BOTIQUIN	X							
	ESPEJOS	X							
DOCUMENTACIÓN	CINTURÓN DE SEGURIDAD	X							
	EXTINTOR PQS	X							
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X							
	PERMISO DE CIRCULACIÓN	X							
	REVISIÓN TÉCNICA	X							
	SEGURO OBLIGATORIO	X							
MANTENIMIENTO		X							
COMENTARIOS:		CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DEL EQUIPO	SI
		Ing. Christy S. Briceño Salinas ASPECTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL VB INGENIERO DE SEGURIDAD						NO	
								VB SUPERVISOR RESIDENTE	

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Juan A. Llanos
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 54250

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 21/05/2025

00001

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
NOMBRE DEL PROYECTO		CHECK LIST CAMIONETA						Version	1
		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"						Fecha:	13/04/2025
MARCA		DATOS DE VERIFICACIÓN						PLACA	101-543
AÑO								MODELO	2014
MANTENIMIENTO								SERIE	LEW 1014923613733
								OBSERVACIONES	
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	B	M	R		
GENERAL	ASIENTOS	X			X				
	LIMPIEZA	X			X				
	ESTADO DE PUENTES	X			X				
	PARABRISAS	X			X				
	ESTADO DE CABINA	X			X				
	ESTADO DE DIRECCIÓN Y VOLANTE	X			X				
	PARACHOQUES	X			X				
	ESTADO DE COMANDOS	X			X				
	ACELERADOR	X			X				
	FRENOS	X			X				
NEUMÁTICOS	GATA	X			X				
	LLAVES DE RUEDA	X			X				
	PRIMER EJE	X			X				
LUCES	SEGUNDO EJE	X			X				
	LUCES ALTAS	X			X				
	LUCES BAJAS	X			X				
	LUCES DE TABLERO	X			X				
	LUZ INTERIOR	X			X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X				
	LUCES DE FRENO	X			X				
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X				
	LUCES DE RETROCESO	X			X				
ACCESORIOS	ALARMA DE RETROCESO	X			X				
	BOCINA	X			X				
	BOTIQUIN	X			X				
	ESPEJOS	X			X				
	CINTURÓN DE SEGURIDAD	X			X				
DOCUMENTACIÓN	EXTINTOR PQS	X			X				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X				
	PERMISO DE CIRCULACIÓN	X			X				
	REVISIÓN TÉCNICA	X			X				
	SEGURO OBLIGATORIO	X			X				
COMENTARIOS:		CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DEL EQUIPO	NO
		Ing. Andrés S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP 257671							
		VB* INGENIERO DE SEGURIDAD						VB* SUPERVISOR RESIDENTE	

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Montero C.
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 34850

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 22/05/2025

000009

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
NOMBRE DEL PROYECTO		CHECK LIST CAMONETA						Version	1
		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"						Fecha:	13/04/2025
MARCA		DATOS DE VERIFICACIÓN						PLACA	123-543
AÑO								MODELO	P001
MANTENIMIENTO								SERIE	26400549 785613223
								OBSERVACIONES	
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA									
GENERAL	ASIENTOS	SI	NO	N/A	B	M	R		
	LIMPIEZA	X			X				
	ESTADO DE PUENTES	X			X				
	PARABRISAS	X			X				
	ESTADO DE CABINA	X			X				
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X			X				
	PARACHOQUES	X			X				
	ESTADO DE COMANDOS	X			X				
	ACELERADOR	X			X				
	FRENOS	X			X				
NEUMÁTICOS	GATA	X			X				
	LLAVES DE RUEDA	X			X				
	PRIMER EJE	X			X				
LUCES	SEGUNDO EJE	X			X				
	LUCES ALTAS	X			X				
	LUCES BAJAS	X			X				
	LUCES DE TABLERO	X			X				
	LUZ INTERIOR	X			X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X				
	LUCES DE FRENO	X			X				
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X				
	LUCES DE RETROCESO	X			X				
ACCESORIOS	ALARMA DE RETROCESO	X			X				
	BOCINA		X						
	BOTIQUIN	X			X				
	ESPEJOS	X			X				
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X				
	EXTINTOR PQS	X			X				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X				
	PERMISO DE CIRCULACION	X			X				
	REVISION TECNICA	X			X				
COMENTARIOS:	SEGURO OBLIGATORIO	X			X				
	MANTENIMIENTO	X			X				
CONSORCIO DIAMANTE								DOCUMENTOS DEL EQUIPO	X
Ing. Christy S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP: 257671									NO
VB* INGENIERO DE SEGURIDAD					VB* SUPERVISOR RESIDENTE				

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Jaramilla
24 FF. DE SUPERVISORIA
CIP: 24850

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 23/05/2025

000008

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-88T-CHECKLIST-001	
NOMBRE DEL PROYECTO		CHECK LIST CAMIONETA						Version	1
		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"						Fecha:	13/04/2025
MARCA		DATOS DE VERIFICACIÓN						PLACA	103-943
AÑO								MÓDELO	Deer
MANTENIMIENTO								SERIE	26W DCF4 20361373
								OBSERVACIONES	
MARCAR CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA									
GENERAL	ASIENTOS	SI	NO	N/A	B	M	R		
	LIMPIEZA	X			X				
	ESTADO DE PUENTES	X			X				
	PARABRISAS	X			X				
	ESTADO DE CABINA	X			X				
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X			X				
	PARACHOCQUES	X			X				
	ESTADO DE COMANDOS	X			X				
	ACELERADOR	X			X				
	FRENOS	X			X				
NEUMÁTICOS	GATA	X			X				
	LLAVES DE RUEDA	X			X				
	PRIMER EJE	X			X				
LUCES	SEGUNDO EJE	X			X				
	LUCES ALTAS	X			X				
	LUCES BAJAS	X			X				
	LUCES DE TABLERO	X			X				
	LUZ INTERIOR	X			X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X				
	LUCES DE FRENO	X			X				
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X				
	LUCES DE RETROCESO	X			X				
ACCESORIOS	ALARMA DE RETROCESO	X			X				
	BOCINA	X			X				
	BOTIQUIN	X			X				
	ESPEJOS	X			X				
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X				
	EXTINTOR PQS	X			X				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X				
	PERMISO DE CIRCULACIÓN	X			X				
	REVISIÓN TÉCNICA	X			X				
COMENTARIOS:		CONSORCIO DIAMANTE							
		Ing. Christy S. Briceño Salinas						DOCUMENTOS DEL EQUIPO	
		13762514 UN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL						NO	
		CUP: 257671							
VB* INGENIERO DE SEGURIDAD					VB* SUPERVISOR RESIDENTE				

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Juan A. Sánchez C.
JEFE DE SUPERVISIÓN
CUP 54550

CONSORCIO DIAMANTE
Ing. Cesar V. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 24/05/2025

000007

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD							CD-88T-CHECKLIST-001	
NOMBRE DEL PROYECTO		CHECK LIST CAMIONETA							Version	1
MARCA		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE: EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM #1: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							Fecha:	13/04/2025
AÑO		DATOS DE VERIFICACION							PLACA	103-843
MANTENIMIENTO									MODELO	2014
									SERIE	1645CE19725613773
									OBSERVACIONES	
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA										
GENERAL	ASIENTOS	SI	NO	N/A	B	M	R			
	LIMPIEZA	X			X					
	ESTADO DE PUENTES	X			X					
	PARABRISAS	X			X					
	ESTADO DE CABINA	X			X					
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X			X					
	PARACHOQUES	X			X					
	ESTADO DE COMANDOS	X			X					
	ACELERADOR	X			X					
	FRENOS	X			X					
NEUMÁTICOS	GATA	X			X					
	LLAVES DE RUEDA	X			X					
	PRIMER EJE	X			X					
	SEGUNDO EJE	X			X					
LUCES	LUCES ALTAS	X			X					
	LUCES BAJAS	X			X					
	LUCES DE TABLERO	X			X					
	LUZ INTERIOR	X			X					
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X					
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X					
	LUCES DE FRENO	X			X					
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X					
	LUCES DE RETROCESO	X			X					
	ALARMA DE RETROCESO	X			X					
ACCESORIOS	BOCINA		X							
	BOTIQUIN	X			X					
	ESPEJOS	X			X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X					
DOCUMENTACIÓN	EXTINTOR PDS	X			X					
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X					
	PERMISO DE CIRCULACION	X			X					
	REVISION TECNICA	X			X					
	SEGURO OBLIGATORIO	X			X					
COMENTARIOS:		CONSORCIO DIAMANTE							DOCUMENTOS DEL EQUIPO	NO
		Ing. Christy S. Briceño Salinas CAPTULO DE INGENIEROS Y SALUD OCUPACIONAL CIP: 257671								
		VB* INGENIERO DE SEGURIDAD							VB* SUPERVISOR RESIDENTE	

CONSORCIO DIAMANTE


Ing. Juan A. Sánchez G.
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP: 54850

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar M. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 26/05/2025

000006

 CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-88T-CHECKLIST-001	
		CHECK LIST CAMIONETA						Version	1
								Fecha:	13/04/2025
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
DATOS DE VERIFICACION									
MARCA	Great Wall						PLACA	103-843	
AÑO	2024						MODELO	420	
MANTENIMIENTO							SERIE	16 WDXEP 7123613722	
MARCAR CON UNA X SEGUN CORRESPONDA									
	SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES		
GENERAL	ASIENTOS	X							
	LIMPIEZA	X							
	ESTADO DE PUENTES	X							
	PARABRISAS	X							
	ESTADO DE CABINA	X							
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X							
	PARACHOQUES	X							
	ESTADO DE COMANDOS	X							
	ACELERADOR	X							
	FRENOS	X							
NEUMÁTICOS	GATA	X							
	LLAVES DE RUEDA	X							
LUCES	PRIMER EJE	X							
	SEGUNDO EJE	X							
	LUCES ALTAS	X							
	LUCES BAJAS	X							
	LUCES DE TABLERO	X							
	LUZ INTERIOR	X							
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X							
	TERCERA LUZ DE FRENO	X							
	LUCES DE FRENO	X							
	INTERMITENTES DELANTEROS	X							
ACCESORIOS	LUCES DE RETROCESO	X							
	ALARMA DE RETROCESO	X		X					
	BOCINA	X							
	BOTIQUIN	X							
	ESPEJOS	X							
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X							
	EXTINTOR PQS	X							
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X							
	PERMISO DE CIRCULACION	X							
	REVISION TECNICA	X							
COMENTARIOS:	SEGURO OBLIGATORIO	X							
	MANTENIMIENTO	X							
COMENTARIOS:		CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DEL EQUIPO	
		Ing. Christy S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP: 257671						CONSORCIO DIAMANTE	
VB: INGENIERO DE SEGURIDAD								Ing. Juan A. Rivera Díaz 2025-05-26 VB: SUPERVISOR RESIDENTE	

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 27/05/2025

00000

CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
NOMBRE DEL PROYECTO		CHECK LIST CAMIONETA						Versión	1
		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"						Fecha:	13/04/2025
MARCA		DATOS DE VERIFICACIÓN						PLACA	100-543
AÑO								MODELO	Per
MANTENIMIENTO								SERIE	86WDC19 723613723
MARCAR CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES	
GENERAL	ASIENTOS	X							
	LIMPIEZA	X							
	ESTADO DE PUENTES	X							
	PARABRISAS	X							
	ESTADO DE CABINA	X							
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X							
	PARACHOQUES	X							
	ESTADO DE COMANDOS	X							
	ACELERADOR	X							
	FRENOS	X							
NEUMÁTICOS	GATA	X							
	LLAVES DE RUEDA	X							
	PRIMER EJE	X							
LUCES	SEGUNDO EJE	X							
	LUCES ALTAS	X							
	LUCES BAJAS	X							
	LUCES DE TABLERO	X							
	LUZ INTERIOR	X							
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X							
	TERCERA LUZ DE FRENO	X							
	LUCES DE FRENO	X							
	INTERMITENTES DELANTEROS	X							
	LUCES DE RETROCESO	X							
ACCESORIOS	ALARMA DE RETROCESO		X						
	BOCINA	X							
	BOTUQUIN	X							
	ESPEJOS	X							
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X							
	EXTINTOR POS	X							
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X							
	PERMISO DE CIRCULACION	X							
	REVISIÓN TECNICA	X							
COMENTARIOS	SEGURO OBLIGATORIO	X							
	MANTENIMIENTO DIAMANTE	X							
COMENTARIOS		Ing. Cesar N. Rivera Salinas Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional CIP 257671						DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN	NO
VB* INGENIERO DE SEGURIDAD								VB* SUPERVISOR RESIDENTE	

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 28/05/2025

000004




CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
CHECK LIST CAMONETA		Versión						1	
Fecha:		13/04/2025							
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
DATOS DE VERIFICACIÓN									
MARCA		Great Wall						PLACA	
AÑO		2024						TDT-543	
MANTENIMIENTO								MODELO	
								SERIE	
								26WDCFA97R368229	
MARCAR CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA									
		SÍ	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES	
GENERAL	ASIENTOS	X			X				
	LIMPIEZA	X			X				
	ESTADO DE PUENTES	X			X				
	PARABRISAS	X			X				
	ESTADO DE CABINA	X			X				
	ESTADO DE DIRECCIÓN Y VOLANTE	X			X				
	PARACHOQUES	X			X				
	ESTADO DE COMANDOS	X			X				
	ACELERADOR	X			X				
	FRENOS	X			X				
GATA									
	LLAVES DE RUEDA	X			X				
NEUMÁTICOS	PRIMER EJE	X			X				
	SEGUNDO EJE	X			X				
LUCES	LUCES ALTAS	X			X				
	LUCES BAJAS	X			X				
	LUCES DE TABLERO	X			X				
	LUZ INTERIOR	X			X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X				
	LUCES DE FRENO	X			X				
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X				
	LUCES DE RETROCESO	X			X				
	ALARMA DE RETROCESO		X						
ACCESORIOS	BOCINA	X			X				
	BOTIQUIN	X			X				
	ESPEJOS	X			X				
	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X				
DOCUMENTACIÓN	EXTINTOR PQS	X			X				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X				
	PERMISO DE CIRCULACIÓN	X			X				
	REVISIÓN TÉCNICA	X			X				
	SEGURO OBLIGATORIO	X			X				
MANTENIMIENTO	X			X					
COMENTARIOS	CONSORCIO DIAMANTE						DOCUMENTOS DEL EQUIPO		
Ing. Cesar N. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP: 257671						CONSORCIO DIAMANTE			
Ing. Cesar N. Briceño Salinas						Ing. Juan A. Sánchez Carrasco			
VII° INGENIERO DE SEGURIDAD						VIII° SUPERVISOR RESIDENTE			

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 29/05/2025

000003


 CONSORCIO DIAMANTE		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
		CHECK LIST CAMIONETA						Versión	1
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"							
		DATOS DE VERIFICACIÓN							
MARCA							PLACA	707-843	
AÑO							MODELO	128	
MANTENIMIENTO							SERIE	16WD CF 19 7123613723	
MARCAR CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES	
GENERAL	ASIENTOS	X							
	LIMPIEZA	X							
	ESTADO DE PUENTES	X							
	PARABRISAS	X							
	ESTADO DE CABINA	X							
	ESTADO DE DIRECCIÓN Y VOLANTE	X							
	PARACHOQUES	X							
	ESTADO DE COMANDOS	X							
	ACELERADOR	X							
	FRENOS	X							
NEUMÁTICOS	GATA	X							
	LLAVES DE RUEDA	X							
	PRIMER EJE	X							
LUCES	SEGUNDO EJE	X							
	LUCES ALTAS	X							
	LUCES BAJAS	X							
	LUCES DE TABLERO	X							
	LUZ INTERIOR	X							
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X							
	TERCERA LUZ DE FRENO	X							
	LUCES DE FRENO	X							
	INTERMITENTES DELANTEROS	X							
	LUCES DE RETROCESO	X							
ACCESORIOS	ALARMA DE RETROCESO		X						
	BOCINA	X							
	BOTIQUIN	X							
	ESPEJOS	X							
	CINTURON DE SEGURIDAD	X							
DOCUMENTACIÓN	EXTINTOR PQ8	X							
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X							
	PERMISO DE CIRCULACIÓN	X							
	REVISIÓN TÉCNICA	X							
	SEGURO OBLIGATORIO	X							
COMENTARIOS	CONSORCIO DIAMANTE  Ing. Dany S. Briceño Salinas INSP. CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP: 257674						DOCUMENTOS DEL EQUIPO CONSORCIO DIAMANTE  Ing. Juan A. Rivera Díaz JEFE DE SUPERVISIÓN VBI SUPERVISOR RESIDENTE		
VB* INGENIERO DE SEGURIDAD									

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 29/05/2025

000003


		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD							CD-88T-CHECKLIST-001	
CONSORCIO DIAMANTE		CHECK LIST CAMIONETA							Versión	1
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"								
		FECHA: 13/04/2025								
DATOS DE VERIFICACIÓN										
MARCA								PLACA	703-843	
AÑO								MODELO	PBA	
MANTENIMIENTO								SERIE	26WD CFH 712343723	
MARCAR CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA										
		SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES		
GENERAL	ASIENTOS	X								
	LIMPIEZA	X								
	ESTADO DE PUENTES	X								
	PARABRISAS	X								
	ESTADO DE CABINA	X								
	ESTADO DE DIRECCIÓN Y VOLANTE	X								
	PARACHOQUES	X								
	ESTADO DE COMANDOS	X								
	ACELERADOR	X								
	FRENOS	X								
NEUMÁTICOS	GATA	X								
	LLAVES DE RUEDA	X								
	PRIMER EJE	X								
LUCES	SEGUNDO EJE	X								
	LUCES ALTAS	X								
	LUCES BAJAS	X								
	LUCES DE TABLERO	X								
	LUZ INTERIOR	X								
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X								
	TERCERA LUZ DE FRENO	X								
	LUCES DE FRENO	X								
	INTERMITENTES DELANTEROS	X								
	LUCES DE RETRÓCESO	X								
ACCESORIOS	ALARMA DE RETRÓCESO		X							
	BOCINA	X								
	BÓTIQUIN	X								
	ESPEJOS	X								
	CINTURÓN DE SEGURIDAD	X								
DOCUMENTACIÓN	EXTINTOR PQB	X								
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X								
	PERMISO DE CIRCULACIÓN	X								
	REVISIÓN TÉCNICA	X								
	SEGURO OBLIGATORIO	X								
COMENTARIOS:	CONSORCIO DIAMANTE							DOCUMENTOS DEL EQUIPO	NO	
<p>Ing. Christy S. Briceño Salinas ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIP: 257671</p> <p>Ing. Juan A. Pérez Carrasco E.S. DE SUPERVISIÓN</p>										
VB* INGENIERO DE SEGURIDAD					VB* SUPERVISOR RESIDENTE					

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Diaz
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 31/05/2025

000001

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD						CD-SST-CHECKLIST-001	
CONSORCIO DIAMANTE		CHECK LIST CAMIONETA						Versión	1
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CHAVIMOCHIC I Y II ETAPA DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. ITEM 01: COMPONENTE OBRAS CIVILES"						Fecha:	13/04/2025
DATOS DE VERIFICACIÓN									
MARCA	Great Wall						PLACA	T13-843	
AÑO	2024						MODELO	Per	
MANTENIMIENTO							SERIE	LGW DC1A23613733	
MARCAR CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA		SI	NO	N/A	B	M	R	OBSERVACIONES	
GENERAL	ASIENTOS	X			X				
	LIMPIEZA	X			X				
	ESTADO DE PUENTES	X			X				
	PARABRISAS	X			X				
	ESTADO DE CABINA	X			X				
	ESTADO DE DIRECCION Y VOLANTE	X			X				
	PARACHOQUES	X			X				
	ESTADO DE COMANDOS	X			X				
	ACELERADOR	X			X				
	FRENOS	X			X				
GATA	X			X					
	LLAVES DE RUEDA	X			X				
NEUMÁTICOS	PRIMER EJE	X			X				
	SEGUNDO EJE	X			X				
LUCES	LUCES ALTAS	X			X				
	LUCES BAJAS	X			X				
	LUCES DE TABLERO	X			X				
	LUZ INTERIOR	X			X				
	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			X				
	TERCERA LUZ DE FRENO	X			X				
	LUCES DE FRENO	X			X				
	INTERMITENTES DELANTEROS	X			X				
LUCES DE RETROCESO	X			X					
ACCESORIOS	ALARMA DE RETROCESO		X						
	BOCINA	X			X				
	BOTIQUIN	X			X				
	ESPEJOS	X			X				
DOCUMENTACIÓN	CINTURON DE SEGURIDAD	X			X				
	EXTINTOR PQS	X			X				
	LICENCIA DE CONDUCTOR	X			X				
	PERMISO DE CIRCULACION	X			X				
REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN TÉCNICA	X			X				
	SEGURO OBLIGATORIO	X			X				
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	X			X				
	CONSORCIO DIAMANTE								
COMENTARIOS	Ing. Cesar N. Rivera Salinas Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional CIP 257673						DOCUMENTOS DE SEGURIDAD DIAMANTE		NO
VB INGENIERO DE SEGURIDAD					VB SUPERVISOR RESIDENTE				

CONSORCIO DIAMANTE

Ing. Cesar N. Rivera Díaz
REPRESENTANTE COMÚN
